

# 水道部庁舎再整備について

## 水道部総務課



令和2年9月2日  
柏市水道事業運営審議会資料

1

## 報告事項

- 事業スケジュールについて
- 工事の進捗について
- 今後の予定ほかについて



令和2年9月2日  
柏市水道事業運営審議会資料

2



# 工事の進捗について

- R元年10月～R2年2月：1期解体工事
  - － 敷地内既存施設のうち、事務所棟※を除き解体撤去完了
    - ※ 4号配水池（1階部分）を含む。2期解体工事で撤去
- R2年3月～：新庁舎建築工事
  - （電気設備・機械設備工事を含む）
  - － 3～4月：杭打設工事
  - － 4～7月：基礎工事
  - － 7月～：躯体工事
  - － 現在のところ予定どおり進捗（進捗率≒36%）



令和2年9月2日  
柏市水道事業運営審議会資料

5

# 今後の予定ほか

- 移転計画策定
  - － OA機器・電源・電話等の配線工事・移設の準備など
  - － 什器・備品計画（既存備品の転用計画，新規購入什器の検討・発注・搬入計画の策定など）
  - － 引越準備（図面・工程表等の検討・作成など）ほか
- 今後発注予定のもの
  - － 第二期工事（令和3年度発注予定）
    - 土木工事：事務所棟の解体，駐車場・外構等の場内整備工事
    - 管工事：耐震性貯水槽の設置工事等
  - － 什器・備品購入（令和3年度発注予定）




令和2年9月2日  
柏市水道事業運営審議会資料

6

工事前



写真

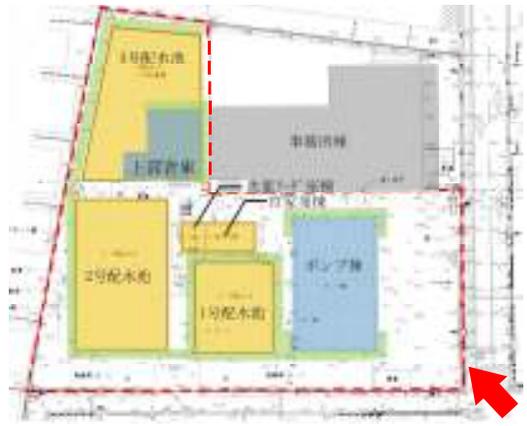

現在



令和2年9月2日  
柏市水道事業運営審議会資料

7

工事前



現在



令和2年9月2日  
柏市水道事業運営審議会資料

8



令和2年9月2日  
柏市水道事業運営審議会資料



令和2年9月2日  
柏市水道事業運営審議会資料
