


放射線量マップ【富勢中学校】

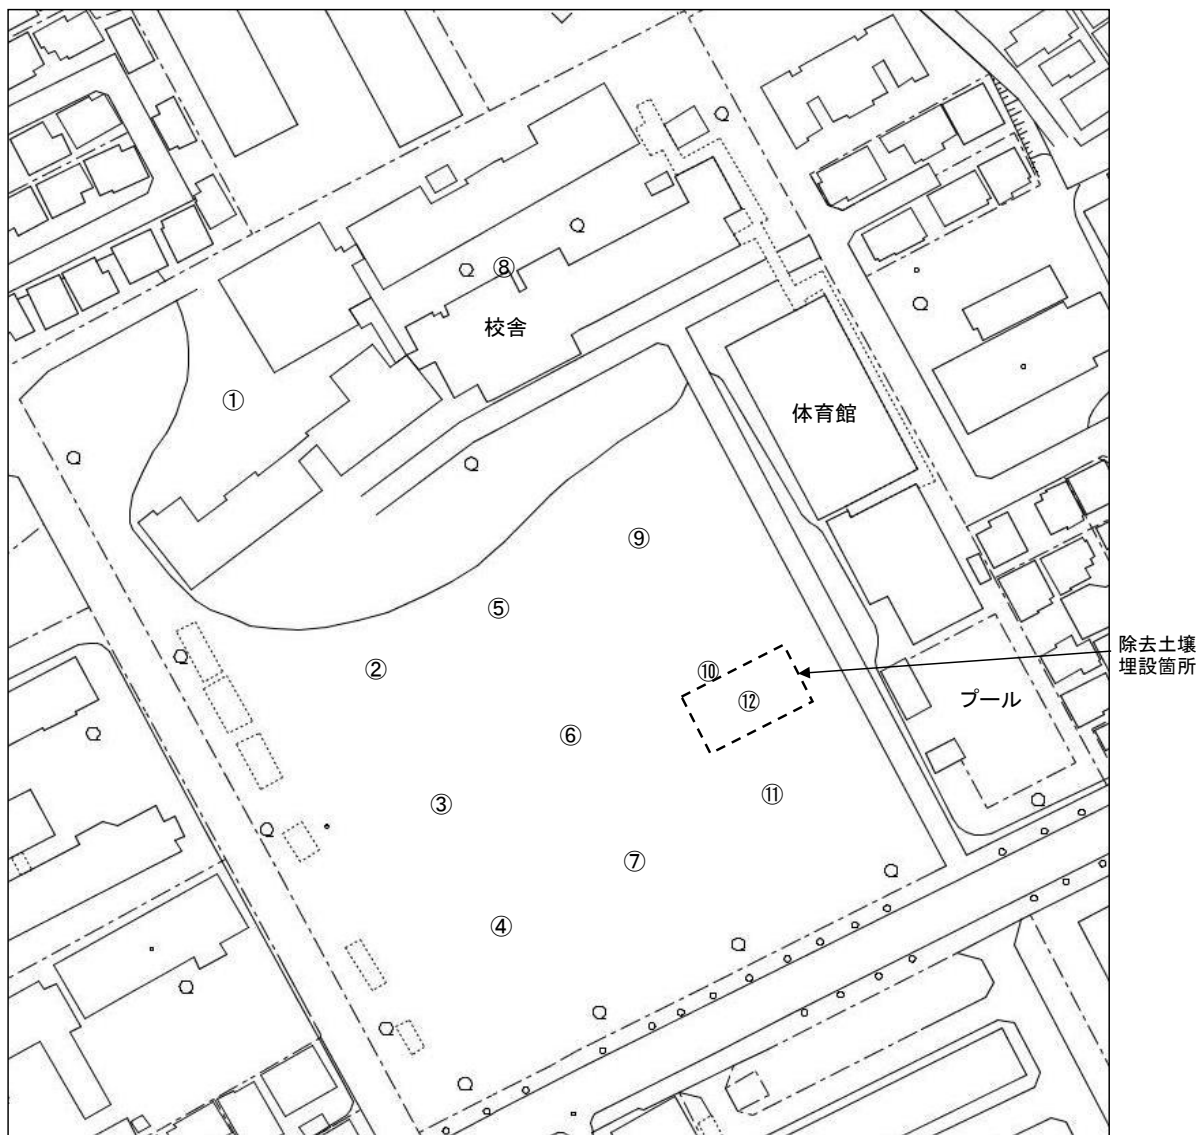

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成30年11月29日(前回:平成30年5月23日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	テニスコート	土	0.046	0.046	0.054	0.048	0.062	0.048
②	グラウンド	土	0.084	0.102	0.085	0.113	0.094	0.136
③	グラウンド	土	0.082	0.082	0.077	0.084	0.079	0.081
④	グラウンド	土	0.076	0.074	0.087	0.081	0.094	0.075
⑤	グラウンド	土	0.097	0.091	0.107	0.094	0.073	0.081
⑥	グラウンド	土	0.080	0.078	0.090	0.096	0.099	0.095
⑦	グラウンド	土	0.079	0.080	0.068	0.075	0.072	0.081
⑧	校舎裏	舗装	0.073	0.085	0.080	0.067	0.077	0.077
⑨	グラウンド	土	0.087	0.108	0.065	0.086	0.095	0.089
⑩	グラウンド	土	0.071	0.087	0.096	0.085	0.070	0.074
⑪	グラウンド	土	0.076	0.065	0.084	0.077	0.081	0.078
⑫	グラウンド	土	0.050	0.073	0.056	0.095	0.070	0.071
平均			0.075	0.081	0.079	0.083	0.081	0.082

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
