


放射線量マップ【中原中学校】

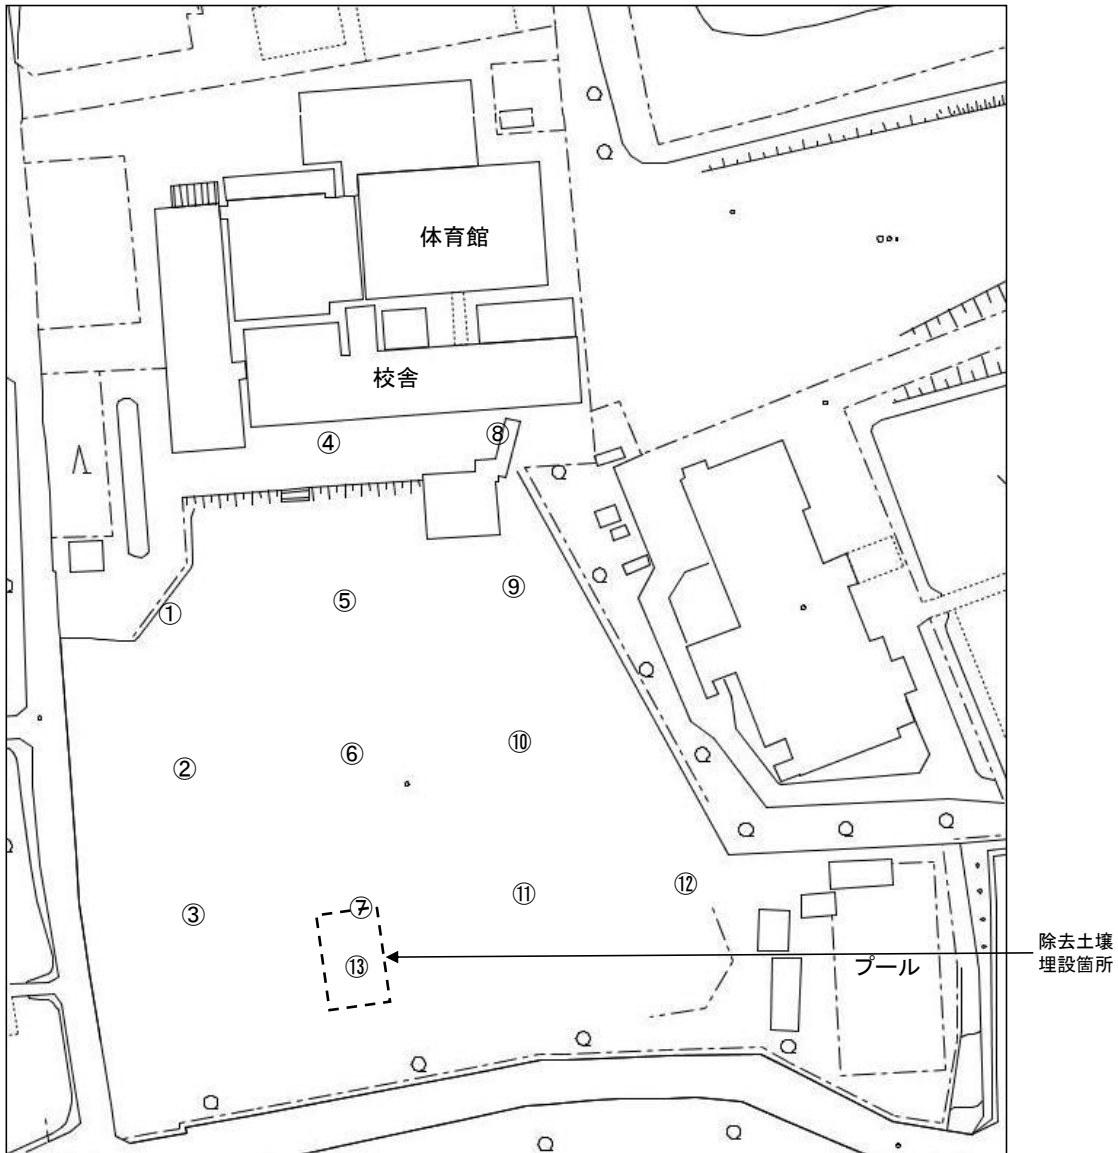

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成30年11月21日(前回:平成30年5月21日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.092	0.086	0.099	0.099	0.110	0.095
②	グラウンド	土	0.102	0.088	0.093	0.075	0.105	0.073
③	グラウンド	土	0.066	0.059	0.074	0.064	0.057	0.069
④	校舎前	土	0.068	0.062	0.051	0.076	0.063	0.061
⑤	グラウンド	土	0.095	0.108	0.082	0.101	0.098	0.118
⑥	グラウンド	土	0.089	0.090	0.109	0.098	0.109	0.101
⑦	グラウンド	土	0.056	0.098	0.042	0.089	0.071	0.104
⑧	校舎前	土	0.047	0.071	0.059	0.070	0.108	0.090
⑨	グラウンド	土	0.097	0.107	0.101	0.103	0.123	0.100
⑩	グラウンド	土	0.088	0.094	0.096	0.103	0.097	0.110
⑪	グラウンド	土	0.090	0.100	0.100	0.111	0.083	0.099
⑫	グラウンド	土	0.090	0.106	0.097	0.094	0.092	0.099
⑬	グラウンド	土	0.093	0.110	0.095	0.090	0.088	0.111
平均			0.083	0.091	0.084	0.090	0.093	0.095

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
