


放射線量マップ【松葉第二小学校】

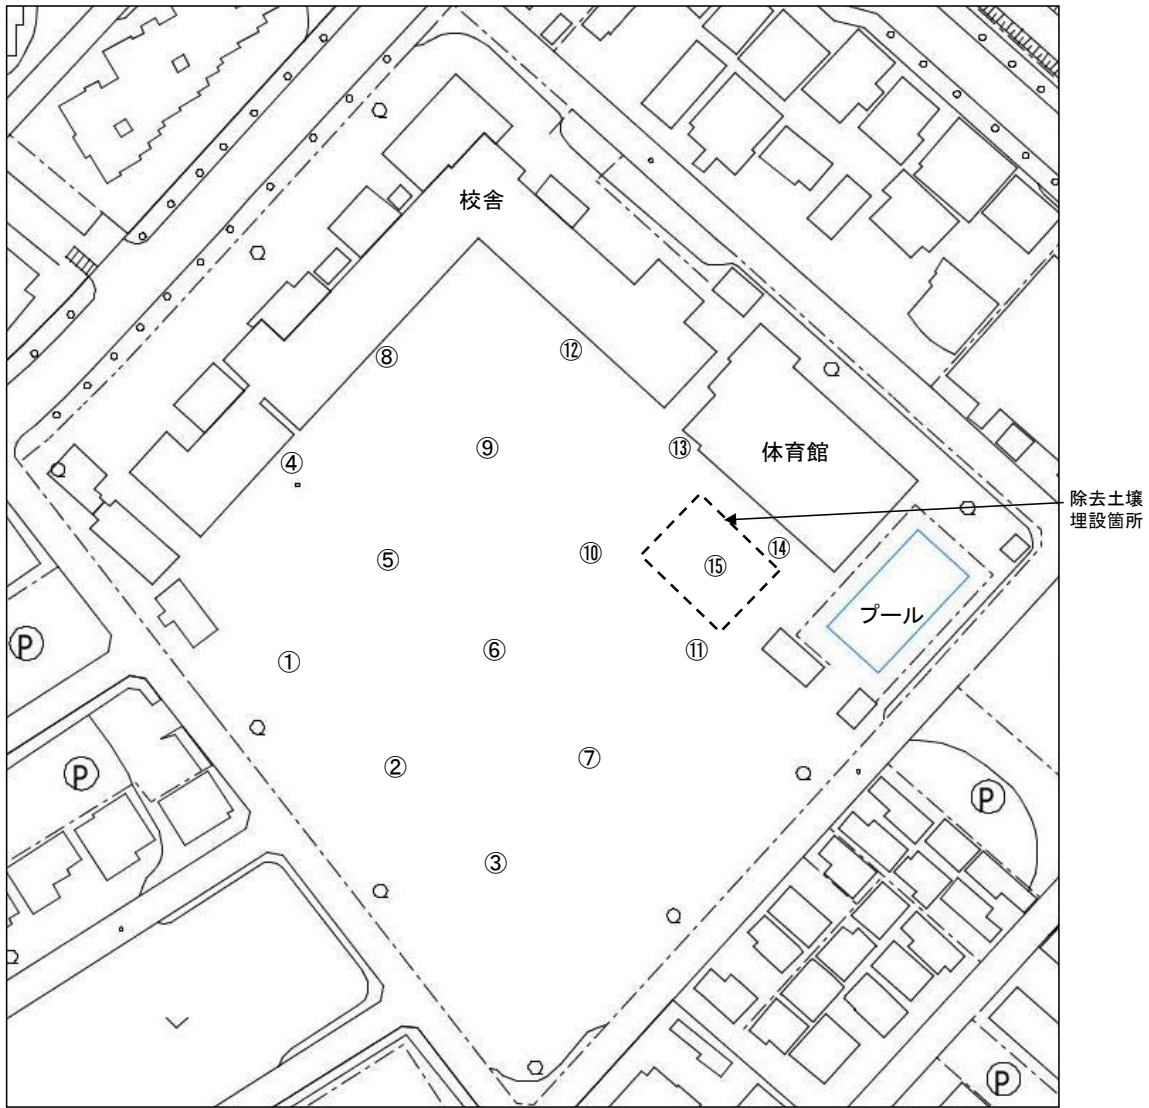

○除染完了日：平成24年8月30日

○測定日：平成30年11月29日（前回：平成30年5月24日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	舗装	0.049	0.044	0.032	0.039	0.040	0.046
②	グラウンド	土	0.057	0.043	0.055	0.053	0.053	0.054
③	グラウンド	土	0.052	0.052	0.064	0.034	0.052	0.047
④	グラウンド	土	0.061	0.062	0.060	0.058	0.070	0.058
⑤	グラウンド	土	0.084	0.057	0.062	0.073	0.069	0.056
⑥	グラウンド	土	0.039	0.056	0.044	0.044	0.059	0.046
⑦	グラウンド	土	0.037	0.046	0.039	0.045	0.042	0.056
⑧	グラウンド	土	0.069	0.050	0.057	0.071	0.072	0.071
⑨	グラウンド	土	0.055	0.052	0.061	0.055	0.047	0.060
⑩	グラウンド	土	0.038	0.053	0.066	0.073	0.045	0.071
⑪	グラウンド	土	0.063	0.068	0.065	0.081	0.055	0.086
⑫	グラウンド	土	0.074	0.068	0.076	0.083	0.061	0.087
⑬	グラウンド	土	0.054	0.074	0.053	0.050	0.059	0.060
⑭	グラウンド	土	0.057	0.056	0.077	0.053	0.059	0.058
⑮	グラウンド	土	0.057	0.069	0.057	0.058	0.068	0.061
平均			0.056	0.057	0.058	0.058	0.057	0.061

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
