


放射線量マップ【土小学校】

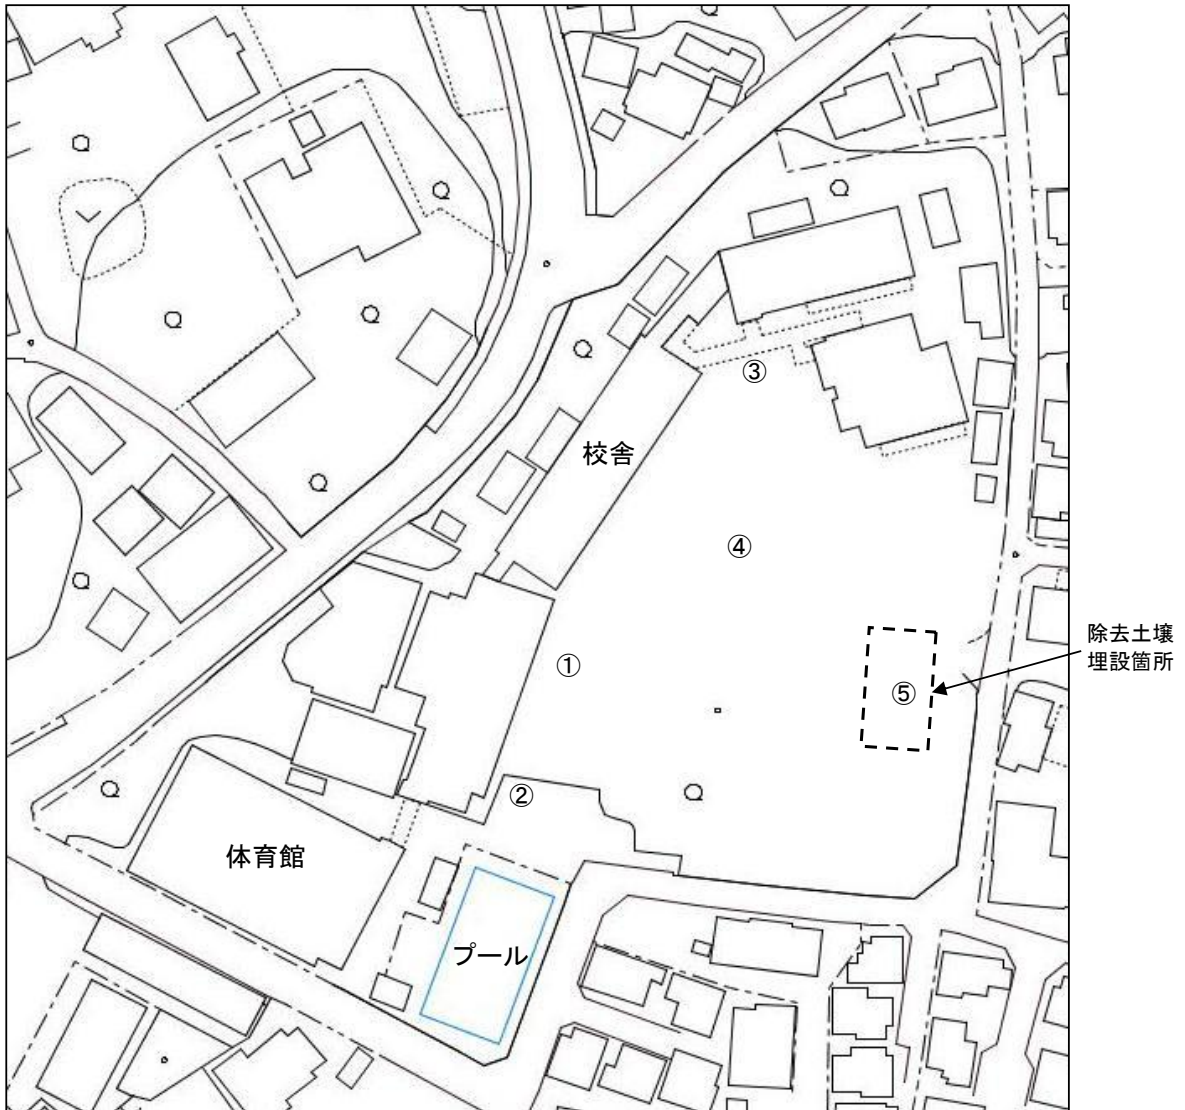

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:令和3年11月12日(前回:令和2年11月5日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.051	0.028	0.057	0.031	0.042	0.044
②	グラウンド	池横の芝	0.057	0.047	0.050	0.041	0.063	0.060
③	校舎前	土	0.037	-	0.030	-	0.041	-
④	グラウンド	土	0.054	0.023	0.034	0.036	0.034	0.029
⑤	グラウンド	土	0.033	0.039	0.037	0.039	0.047	0.041
平均			0.046	0.034	0.042	0.037	0.045	0.044

前回工事中

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
