


放射線量マップ【花野井小学校】

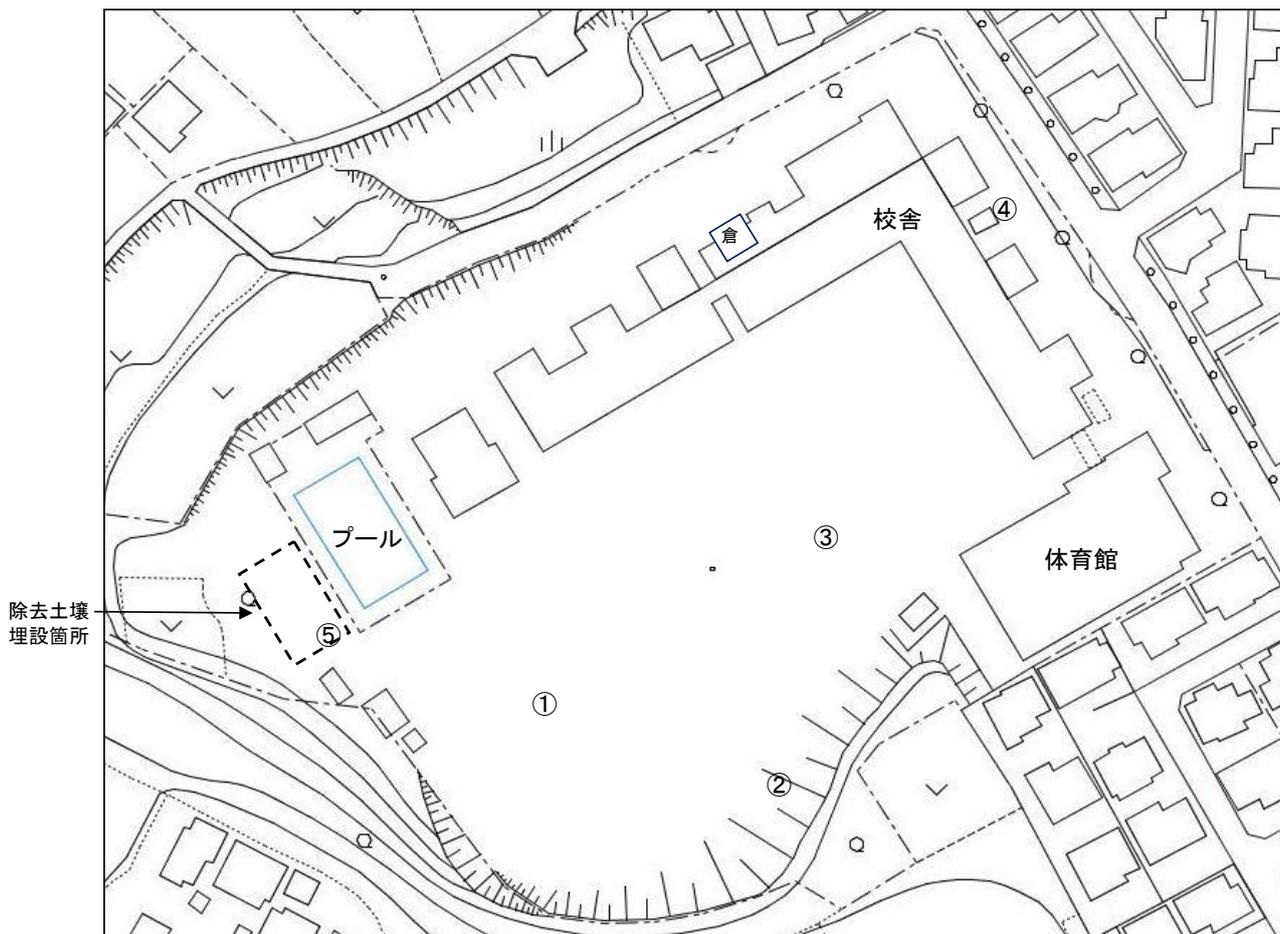

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:令和3年11月2日(前回:令和2年11月9日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.062	0.040	0.047	0.046	0.046	0.064
②	グラウンド	土	0.066	0.068	0.043	0.082	0.065	0.077
③	グラウンド	土	0.057	0.050	0.060	0.035	0.045	0.049
④	校舎裏	アスファルト	0.045	0.052	0.052	0.058	0.044	0.060
⑤	プール裏	土	0.057	0.046	0.058	0.061	0.052	0.068
平均			0.057	0.051	0.052	0.056	0.050	0.064

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
