


放射線量マップ【南部中学校】

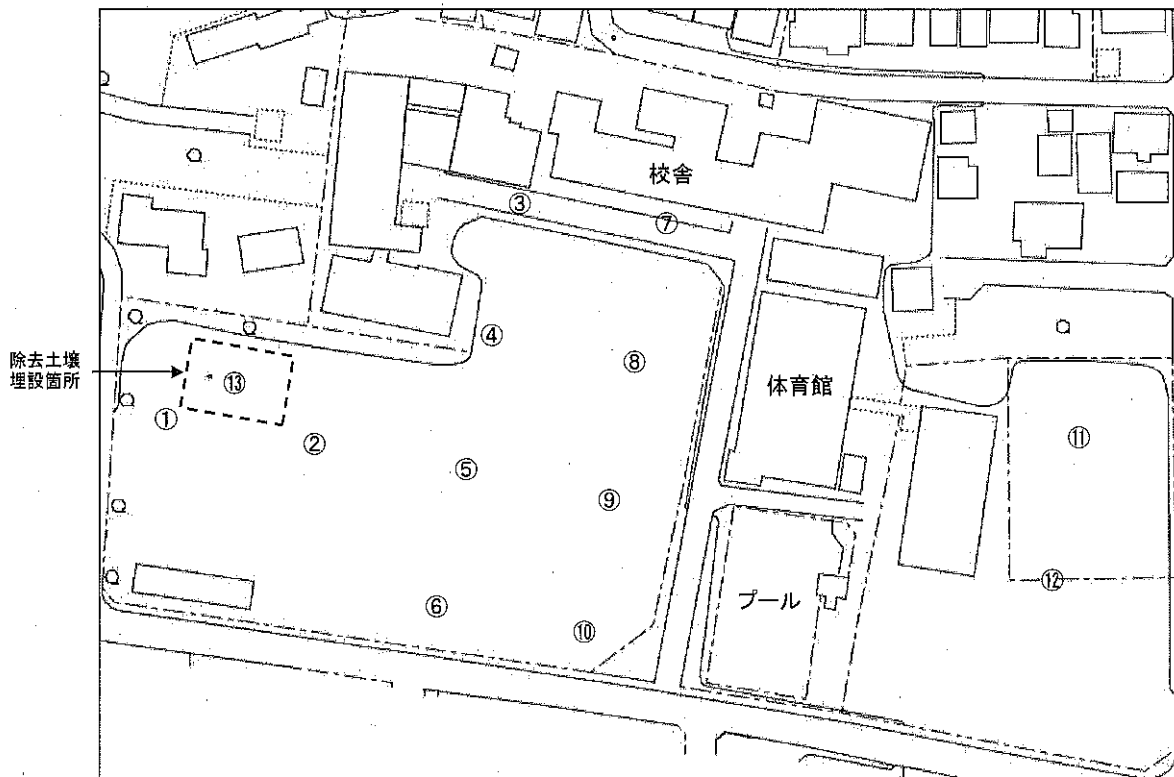

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成27年11月11日(前回:平成27年5月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.059	0.083	0.091	0.084	0.083	0.073
②	グラウンド	土	0.058	0.099	0.084	0.082	0.089	0.077
③	校舎前	舗装	0.038	0.065	0.067	0.076	0.067	0.075
④	グラウンド	土	0.067	0.091	0.099	0.102	0.080	0.071
⑤	グラウンド	土	0.066	0.085	0.091	0.093	0.075	0.079
⑥	グラウンド	土	0.080	0.104	0.087	0.103	0.109	0.106
⑦	校舎前	舗装	0.052	0.048	0.055	0.054	0.047	0.035
⑧	グラウンド	土	0.072	0.085	0.078	0.103	0.086	0.084
⑨	グラウンド	土	0.076	0.079	0.097	0.084	0.097	0.087
⑩	グラウンド	土	0.063	0.081	0.081	0.087	0.098	0.075
⑪	テニスコート	土	0.023	0.041	0.033	0.032	0.048	0.027
⑫	テニスコート	土	0.031	0.052	0.050	0.038	0.037	0.042
⑬	グラウンド	土	0.077	-	0.092	-	0.082	-
平均			0.059	0.076	0.077	0.078	0.077	0.069

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
