


### 放射線量マップ【柏第二小学校】

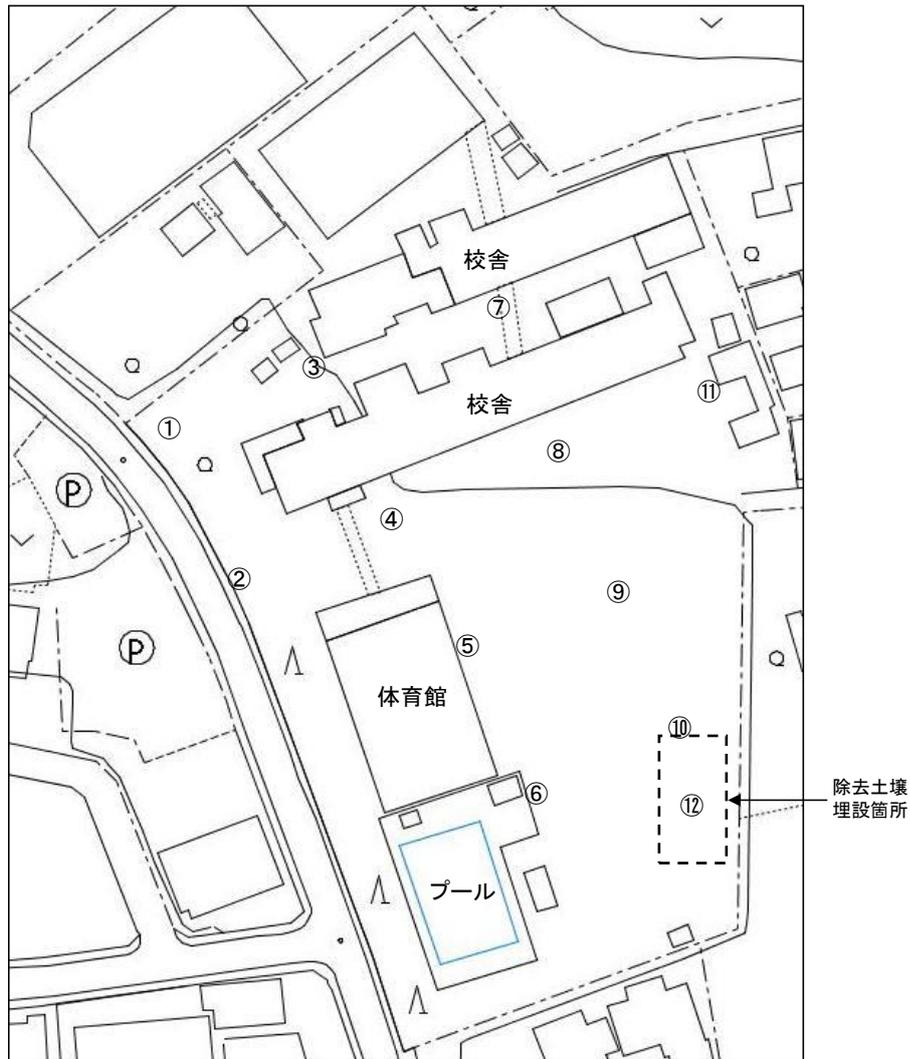

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成28年5月26日(前回:平成27年11月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎前	舗装	0.077	0.057	0.080	0.044	0.069	0.050
②	校門	舗装	0.066	0.065	0.071	0.062	0.050	0.071
③	校舎前	舗装	0.069	0.047	0.073	0.063	0.057	0.066
④	グラウンド	土	0.068	工事中	0.056	工事中	0.072	工事中
⑤	グラウンド	土	0.047	0.033	0.046	0.041	0.043	0.036
⑥	グラウンド	土	0.040	0.032	0.048	0.047	0.058	0.037
⑦	校舎前	舗装	0.068	0.064	0.069	0.075	0.061	0.063
⑧	グラウンド	土	0.051	工事中	0.059	工事中	0.056	工事中
⑨	グラウンド	土	0.038	0.038	0.034	0.050	0.045	0.049
⑩	グラウンド	土	0.039	0.028	0.040	0.038	0.049	0.040
⑪	グラウンド	土	0.047	0.058	0.069	0.060	0.053	0.045
⑫	グラウンド	土	0.048	0.040	0.055	0.041	0.051	0.039
平均			0.055	0.046	0.058	0.052	0.055	0.050

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
