


放射線量マップ【富勢小学校】

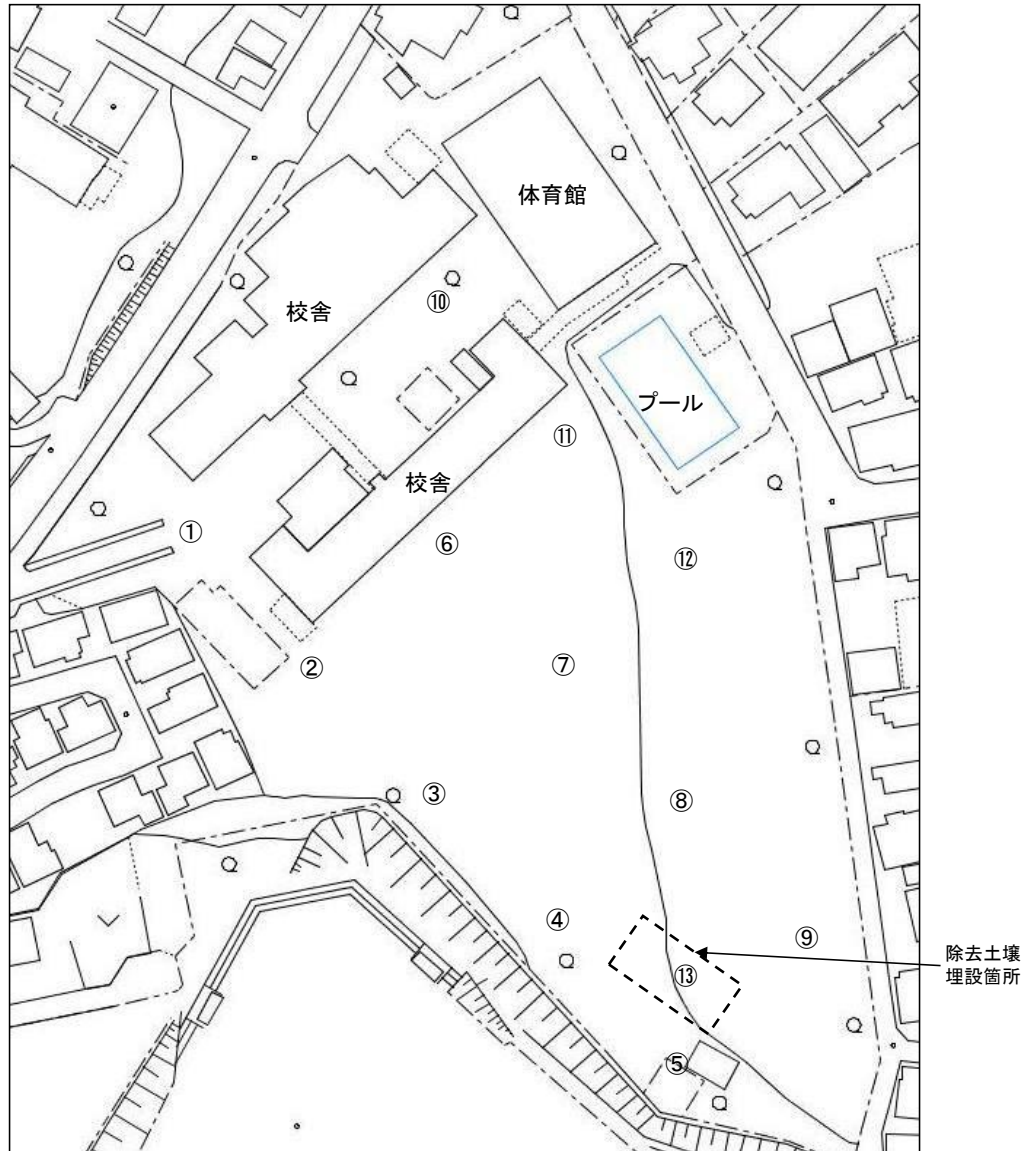

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成28年5月18日(前回:平成27年11月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.058	0.058	0.060	0.047	0.038	0.043
②	グラウンド	土	0.042	0.046	0.040	0.027	0.057	0.023
③	グラウンド	土	0.044	0.048	0.038	0.039	0.039	0.035
④	グラウンド	土	0.034	0.037	0.043	0.028	0.050	0.047
⑤	グラウンド	土	0.065	0.040	0.057	0.046	0.073	0.047
⑥	グラウンド	土	0.044	0.047	0.052	0.052	0.048	0.036
⑦	グラウンド	土	0.049	0.051	0.044	0.055	0.043	0.043
⑧	グラウンド	土	0.033	0.027	0.043	0.050	0.036	0.025
⑨	グラウンド	土	0.053	0.041	0.060	0.035	0.044	0.045
⑩	校舎裏	舗装	0.064	0.063	0.075	0.067	0.061	0.043
⑪	グラウンド	土	0.055	0.058	0.043	0.060	0.063	0.066
⑫	グラウンド	土	0.039	0.048	0.040	0.067	0.031	0.048
⑬	グラウンド	土	0.048	0.031	0.039	0.037	0.035	0.024
平均			0.048	0.046	0.049	0.047	0.048	0.040

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
