


放射線量マップ【田中中学校】

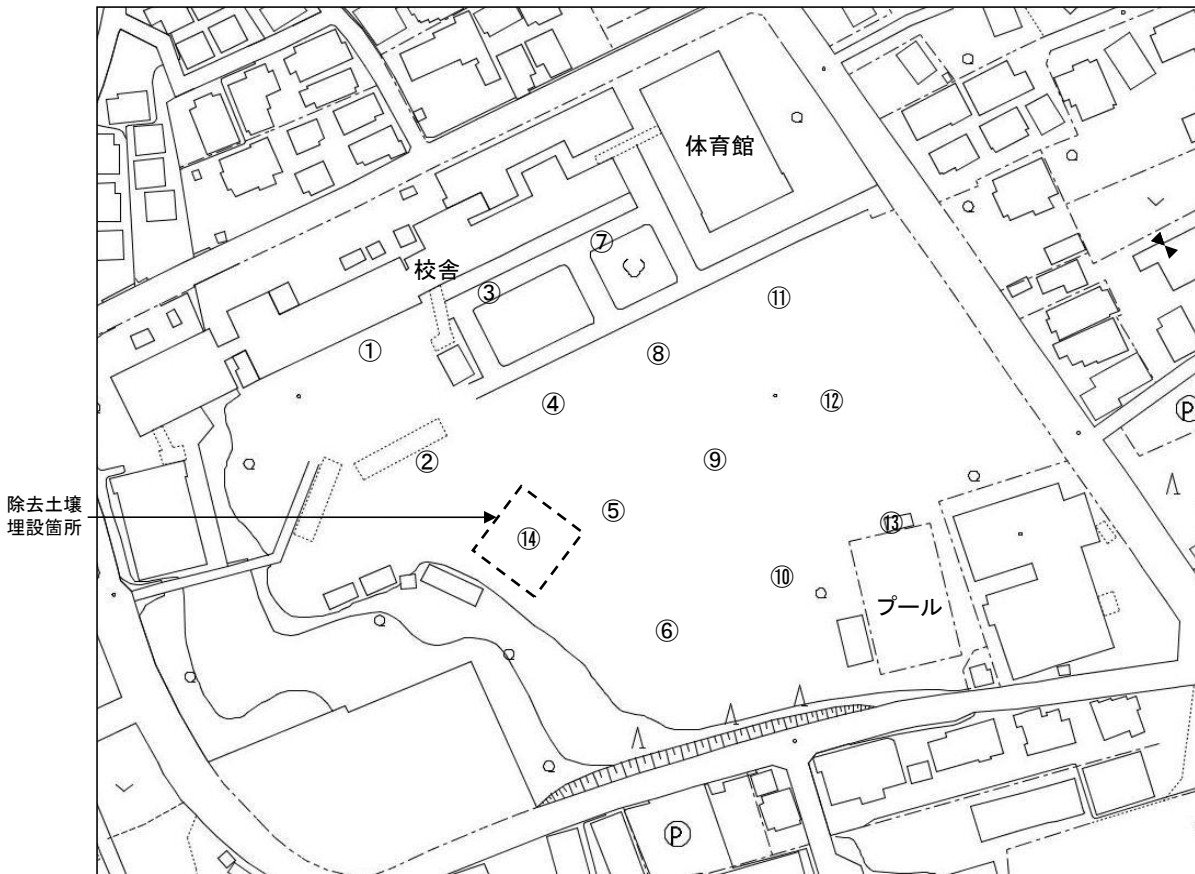

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成28年5月23日(前回:平成27年11月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎前	舗装	0.059	0.056	0.057	0.057	0.059	0.075
②	グラウンド	土	0.109	0.083	0.091	0.062	0.102	0.075
③	校舎前	舗装	0.068	0.054	0.067	0.043	0.059	0.048
④	グラウンド	土	0.111	0.072	0.082	0.063	0.093	0.073
⑤	グラウンド	土	0.071	0.064	0.085	0.072	0.084	0.068
⑥	グラウンド	土	0.075	0.078	0.088	0.069	0.096	0.068
⑦	校舎前	舗装	0.078	0.069	0.099	0.056	0.075	0.058
⑧	グラウンド	土	0.089	0.076	0.092	0.078	0.083	0.086
⑨	グラウンド	土	0.086	0.080	0.084	0.068	0.083	0.093
⑩	グラウンド	土	0.099	0.079	0.101	0.073	0.097	0.073
⑪	グラウンド	土	0.083	0.071	0.087	0.071	0.108	0.089
⑫	グラウンド	土	0.080	0.076	0.080	0.070	0.076	0.095
⑬	グラウンド	土	0.082	0.068	0.080	0.067	0.106	0.077
⑭	グラウンド	土	0.082	0.079	0.086	0.071	0.099	0.086
平均			0.084	0.072	0.084	0.066	0.087	0.076

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
