


放射線量マップ【田中中学校】

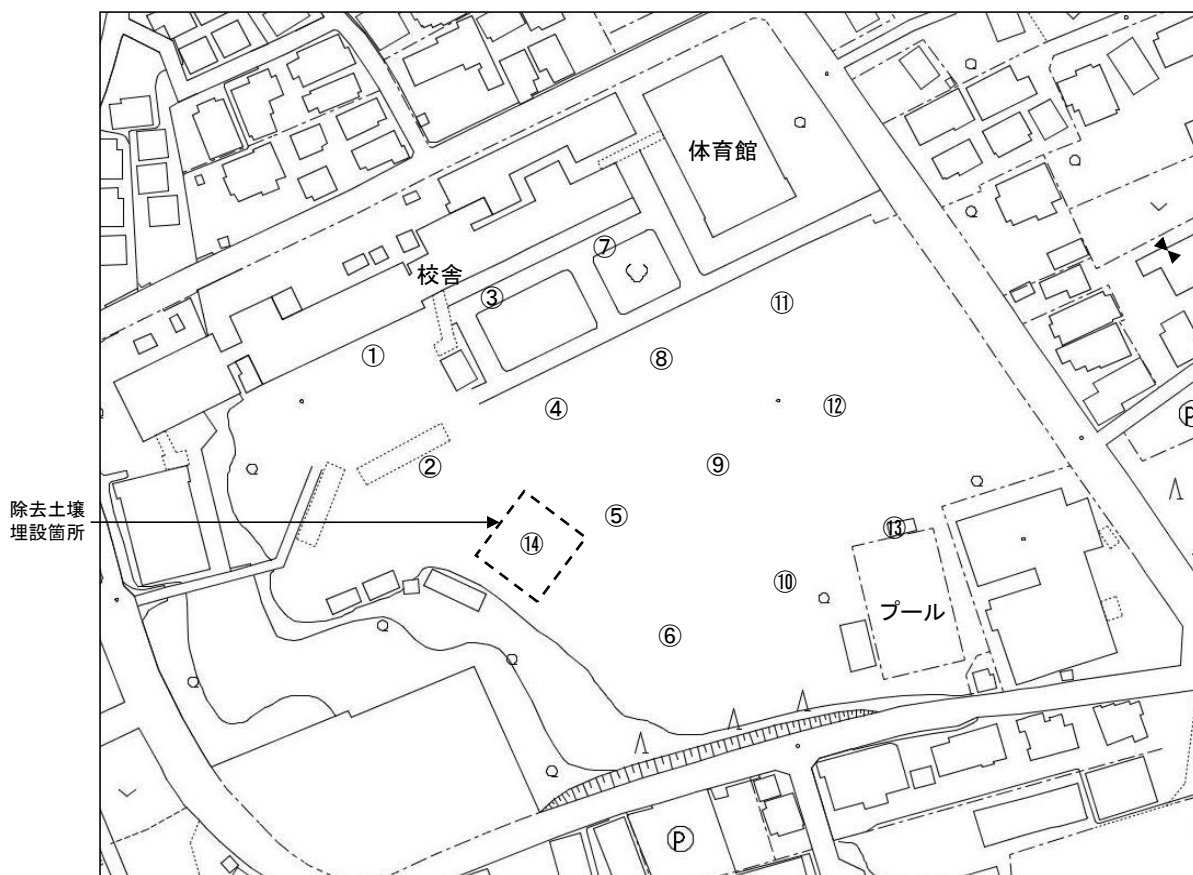

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成28年11月8日(前回:平成28年5月23日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎前	舗装	0.055	0.059	0.045	0.057	0.051	0.059
②	グラウンド	土	0.082	0.109	0.086	0.091	0.084	0.102
③	校舎前	舗装	0.072	0.068	0.058	0.067	0.048	0.059
④	グラウンド	土	0.079	0.111	0.084	0.082	0.086	0.093
⑤	グラウンド	土	0.065	0.071	0.079	0.085	0.072	0.084
⑥	グラウンド	土	0.086	0.075	0.079	0.088	0.086	0.096
⑦	校舎前	舗装	0.071	0.078	0.066	0.099	0.058	0.075
⑧	グラウンド	土	0.060	0.089	0.077	0.092	0.071	0.083
⑨	グラウンド	土	0.087	0.086	0.087	0.084	0.094	0.083
⑩	グラウンド	土	0.075	0.099	0.093	0.101	0.072	0.097
⑪	グラウンド	土	0.070	0.083	0.079	0.087	0.081	0.108
⑫	グラウンド	土	0.074	0.080	0.103	0.080	0.104	0.076
⑬	グラウンド	土	0.082	0.082	0.081	0.080	0.076	0.106
⑭	グラウンド	土	0.080	0.082	0.085	0.086	0.085	0.099
平均			0.074	0.084	0.079	0.084	0.076	0.087

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
