


放射線量マップ【土中学校】

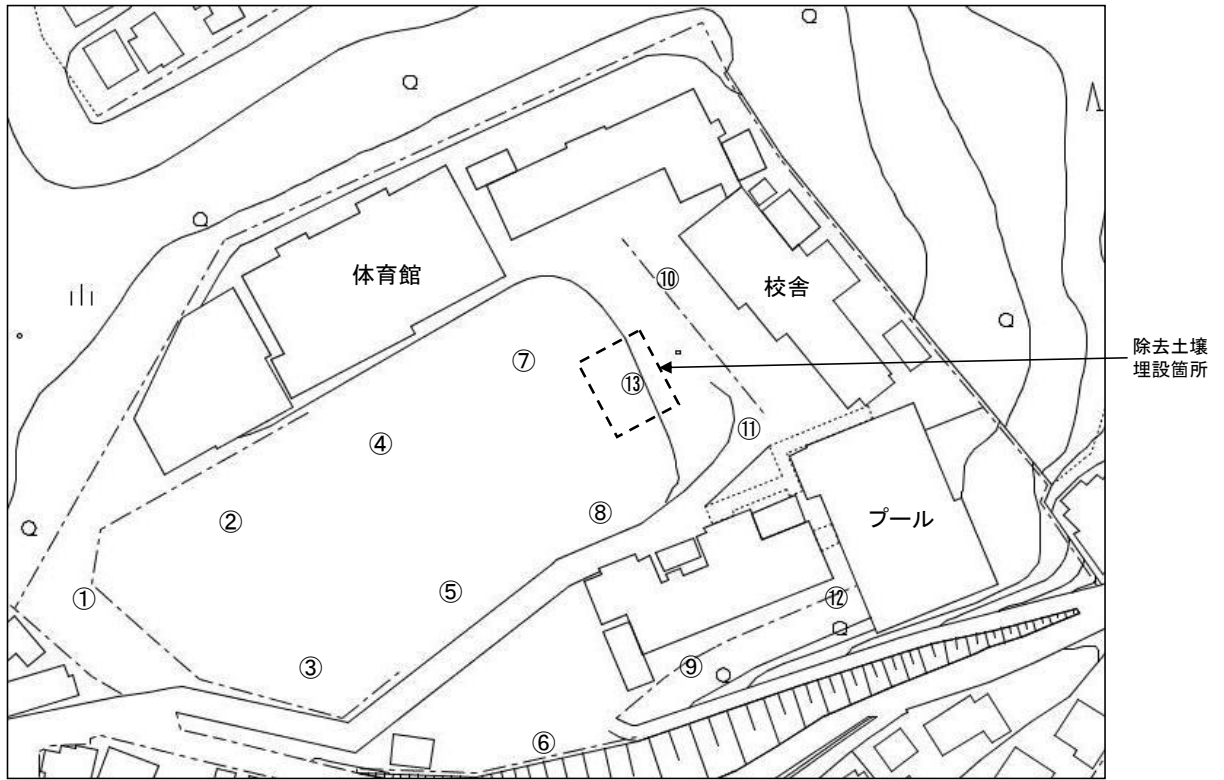

○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:平成29年5月23日(前回:平成28年11月16日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標		5cm	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	舗装	0.068	0.080	0.087	0.092	0.101	0.081
②	グラウンド	土	0.060	0.071	0.090	0.075	0.088	0.077
③	グラウンド	土	0.075	0.078	0.087	0.077	0.073	0.096
④	グラウンド	土	0.073	0.081	0.079	0.070	0.101	0.078
⑤	グラウンド	土	0.072	0.067	0.082	0.071	0.088	0.075
⑥	グラウンド	土	0.078	0.062	0.062	0.064	0.091	0.080
⑦	グラウンド	土	0.077	0.077	0.066	0.066	0.082	0.080
⑧	グラウンド	土	0.080	0.083	0.073	0.085	0.101	0.085
⑨	校舎裏	土	0.063	0.089	0.069	0.057	0.066	0.078
⑩	グラウンド	土	0.072	0.075	0.079	0.077	0.080	0.073
⑪	グラウンド	土	0.082	0.073	0.079	0.072	0.115	0.079
⑫	校舎裏	土	0.081	0.081	0.077	0.090	0.091	0.088
⑬	グラウンド	土	0.056	0.073	0.062	0.068	0.053	0.084
平均			0.072	0.076	0.076	0.074	0.087	0.081

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
