


### 放射線量マップ【風早中学校】

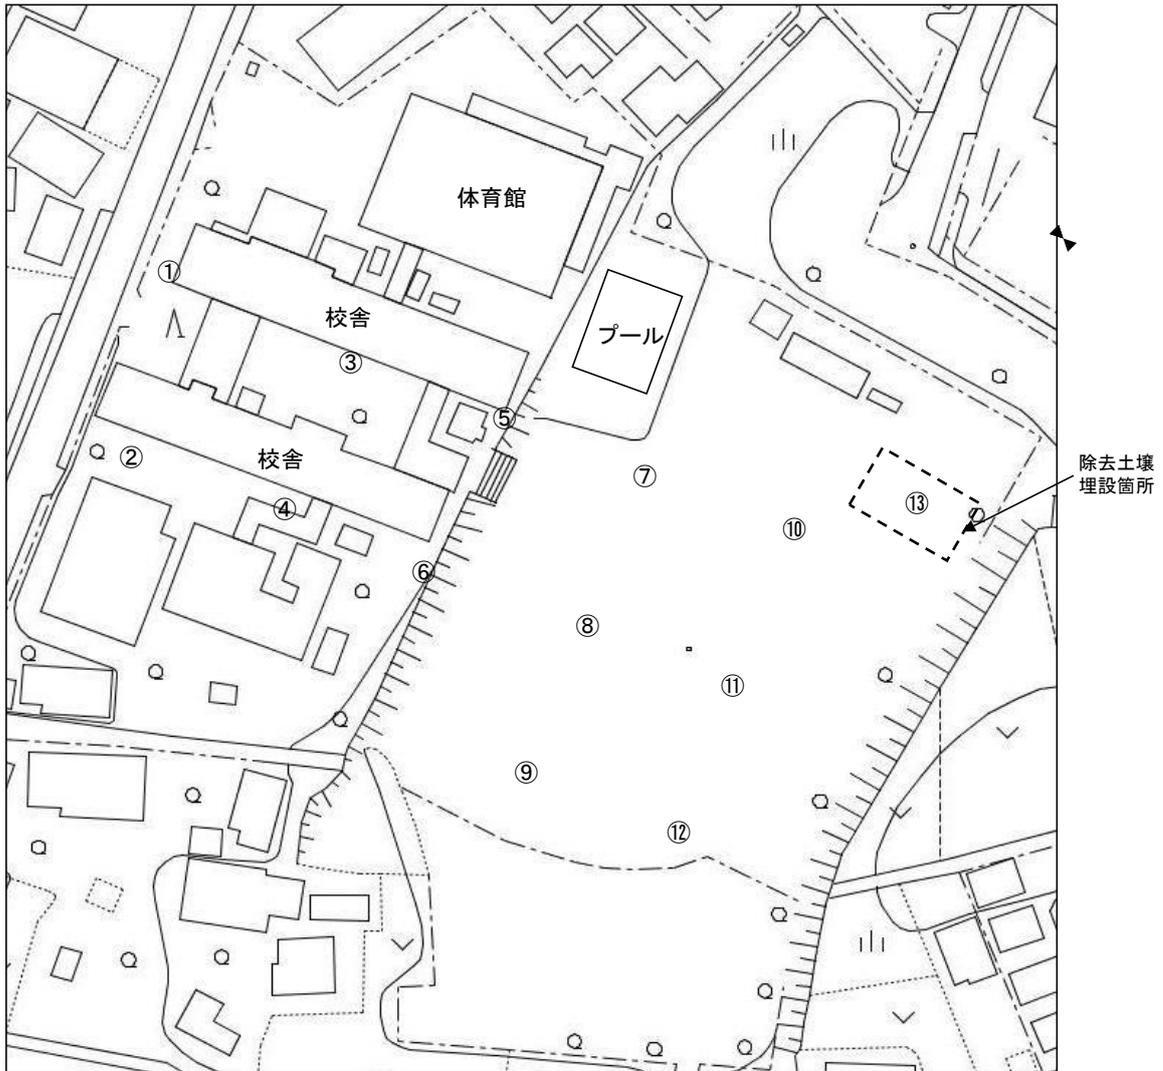

○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:平成29年5月12日(前回:平成28年11月2日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎横	土	0.075	0.079	0.098	0.090	0.104	0.094
②	校舎前	土	0.087	0.062	0.085	0.082	0.097	0.092
③	校舎前	土	0.078	0.076	0.082	0.090	0.083	0.082
④	校舎前	土	0.085	0.059	0.091	0.069	0.062	0.089
⑤	校舎横	土	0.077	0.068	0.076	0.076	0.086	0.065
⑥	校舎横	舗装	0.070	0.074	0.072	0.081	0.080	0.065
⑦	グラウンド	土	0.112	0.081	0.100	0.084	0.096	0.099
⑧	グラウンド	土	0.079	0.069	0.079	0.075	0.077	0.062
⑨	グラウンド	土	0.087	0.080	0.100	0.072	0.082	0.088
⑩	グラウンド	土	0.083	0.087	0.105	0.092	0.090	0.085
⑪	グラウンド	土	0.109	0.086	0.118	0.093	0.128	0.101
⑫	グラウンド	土	0.077	0.082	0.098	0.078	0.092	0.090
⑬	グラウンド	土	0.072	0.085	0.081	0.099	0.080	0.081
平均			0.084	0.076	0.091	0.083	0.089	0.084

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
