


放射線量マップ【富勢小学校】

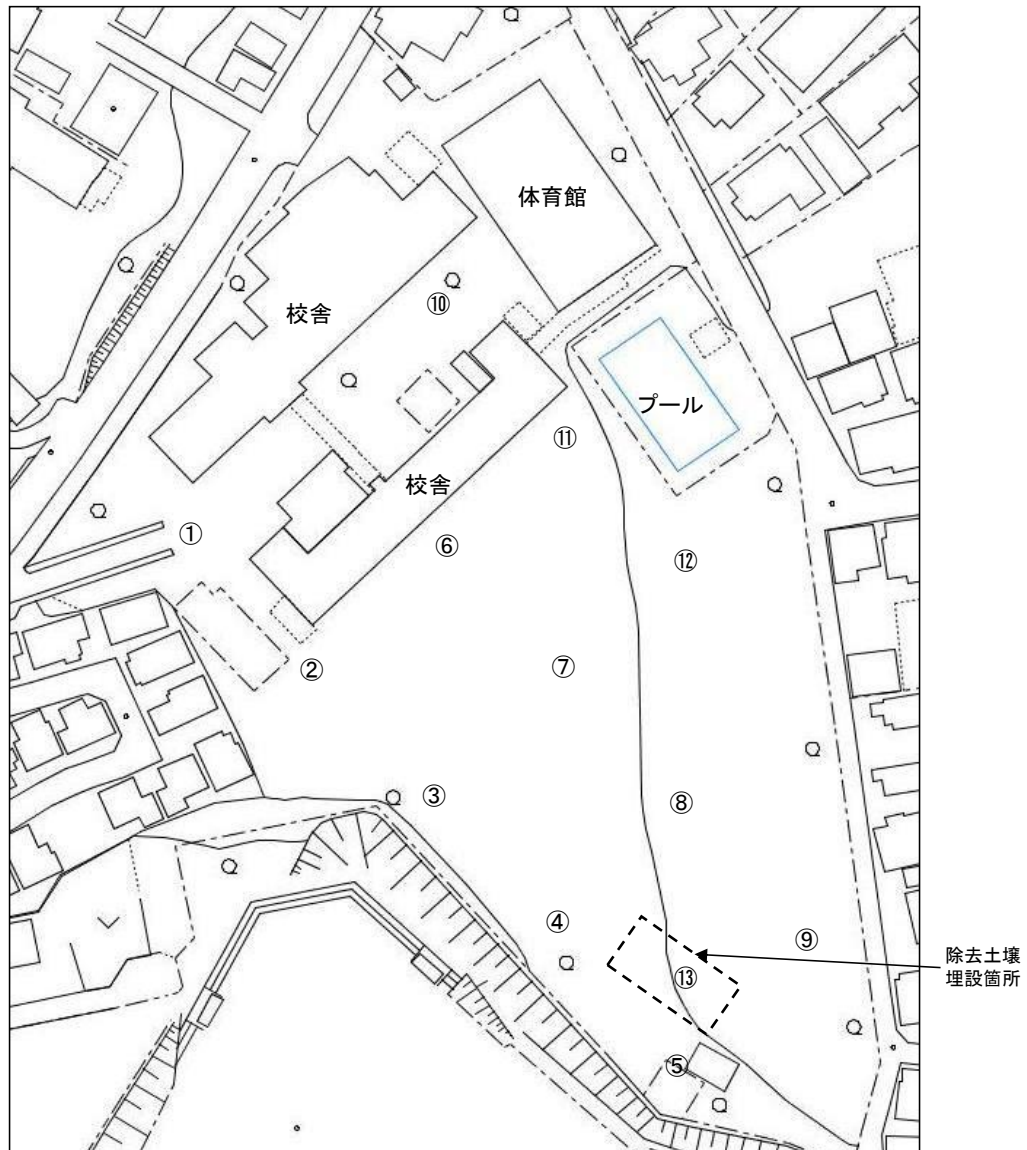

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成30年 5月 24日(前回:平成29年11月30日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.041	0.048	0.063	0.042	0.045	0.051
②	グラウンド	土	0.045	0.031	0.042	0.038	0.053	0.047
③	グラウンド	土	0.031	0.035	0.038	0.038	0.030	0.040
④	グラウンド	土	0.034	0.040	0.025	0.057	0.028	0.054
⑤	グラウンド	土	0.059	0.044	0.053	0.033	0.047	0.050
⑥	グラウンド	土	0.053	0.056	0.049	0.047	0.040	0.051
⑦	グラウンド	土	0.048	0.038	0.058	0.032	0.057	0.043
⑧	グラウンド	土	0.038	0.027	0.038	0.034	0.039	0.031
⑨	グラウンド	土	0.034	0.042	0.038	0.039	0.040	0.031
⑩	校舎裏	舗装	0.066	0.055	0.074	0.065	0.051	0.048
⑪	グラウンド	土	0.054	0.040	0.051	0.048	0.050	0.045
⑫	グラウンド	土	0.028	0.033	0.037	0.045	0.052	0.037
⑬	グラウンド	土	0.034	0.042	0.036	0.033	0.046	0.034
平均			0.043	0.041	0.046	0.042	0.044	0.043

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
