


放射線量マップ【中原中学校】

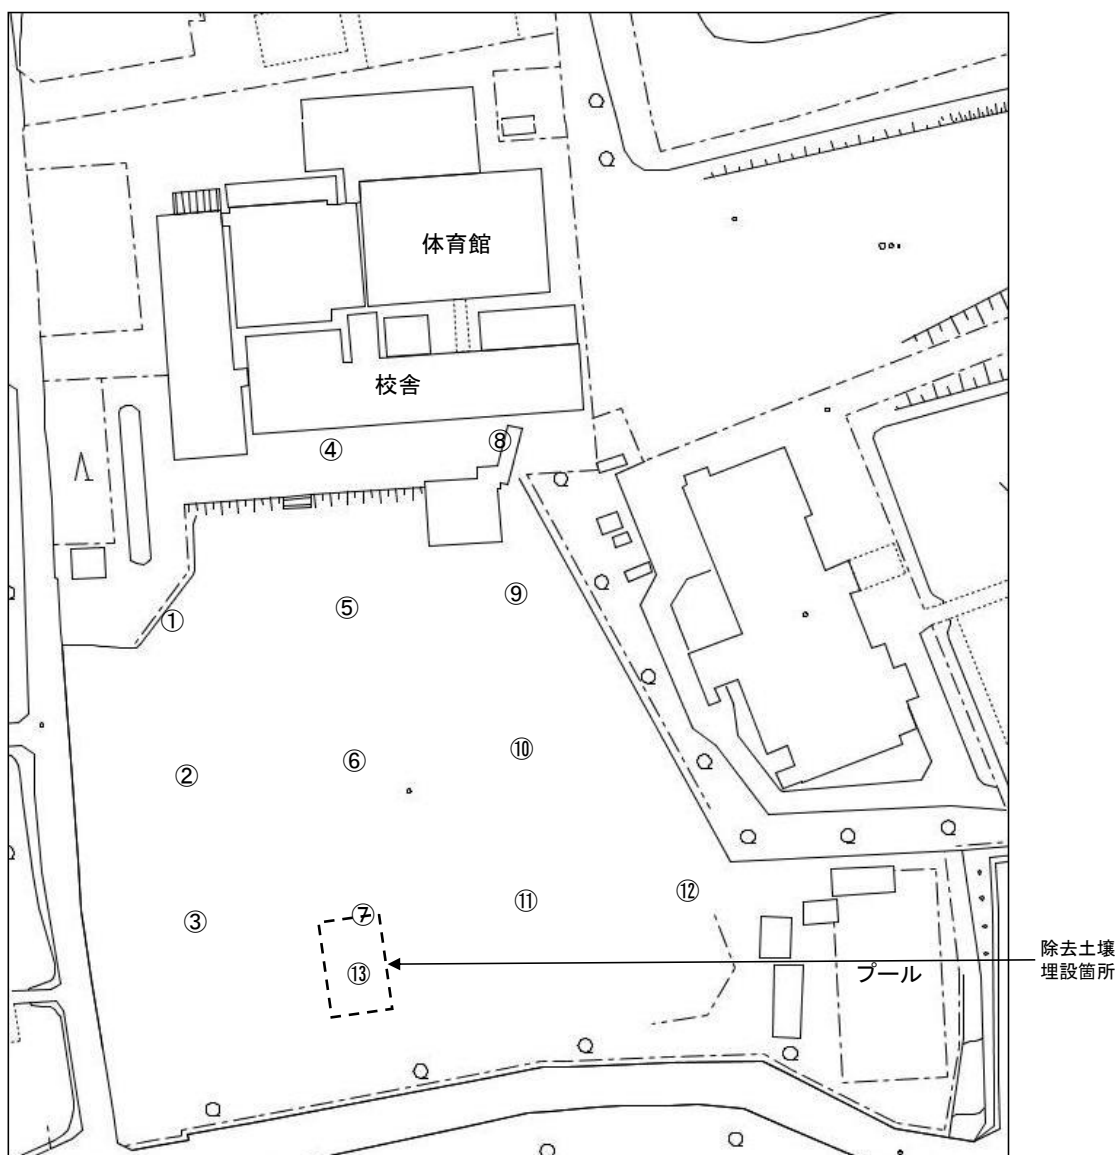

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成30年5月21日(前回:平成29年11月30日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.086	0.066	0.099	0.080	0.095	0.098
②	グラウンド	土	0.088	0.094	0.075	0.124	0.073	0.111
③	グラウンド	土	0.059	0.068	0.064	0.094	0.069	0.072
④	校舎前	土	0.062	0.066	0.076	0.040	0.061	0.037
⑤	グラウンド	土	0.108	0.104	0.101	0.119	0.118	0.109
⑥	グラウンド	土	0.090	0.095	0.098	0.106	0.101	0.105
⑦	グラウンド	土	0.098	0.094	0.089	0.074	0.104	0.082
⑧	校舎前	土	0.071	0.069	0.070	0.062	0.090	0.073
⑨	グラウンド	土	0.107	0.076	0.103	0.084	0.100	0.085
⑩	グラウンド	土	0.094	0.081	0.103	0.093	0.110	0.115
⑪	グラウンド	土	0.100	0.094	0.111	0.101	0.099	0.128
⑫	グラウンド	土	0.106	0.087	0.094	0.087	0.099	0.085
⑬	グラウンド	土	0.110	0.109	0.090	0.095	0.111	0.114
平均			0.091	0.085	0.090	0.089	0.095	0.093

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
