


放射線量マップ【富勢中学校】

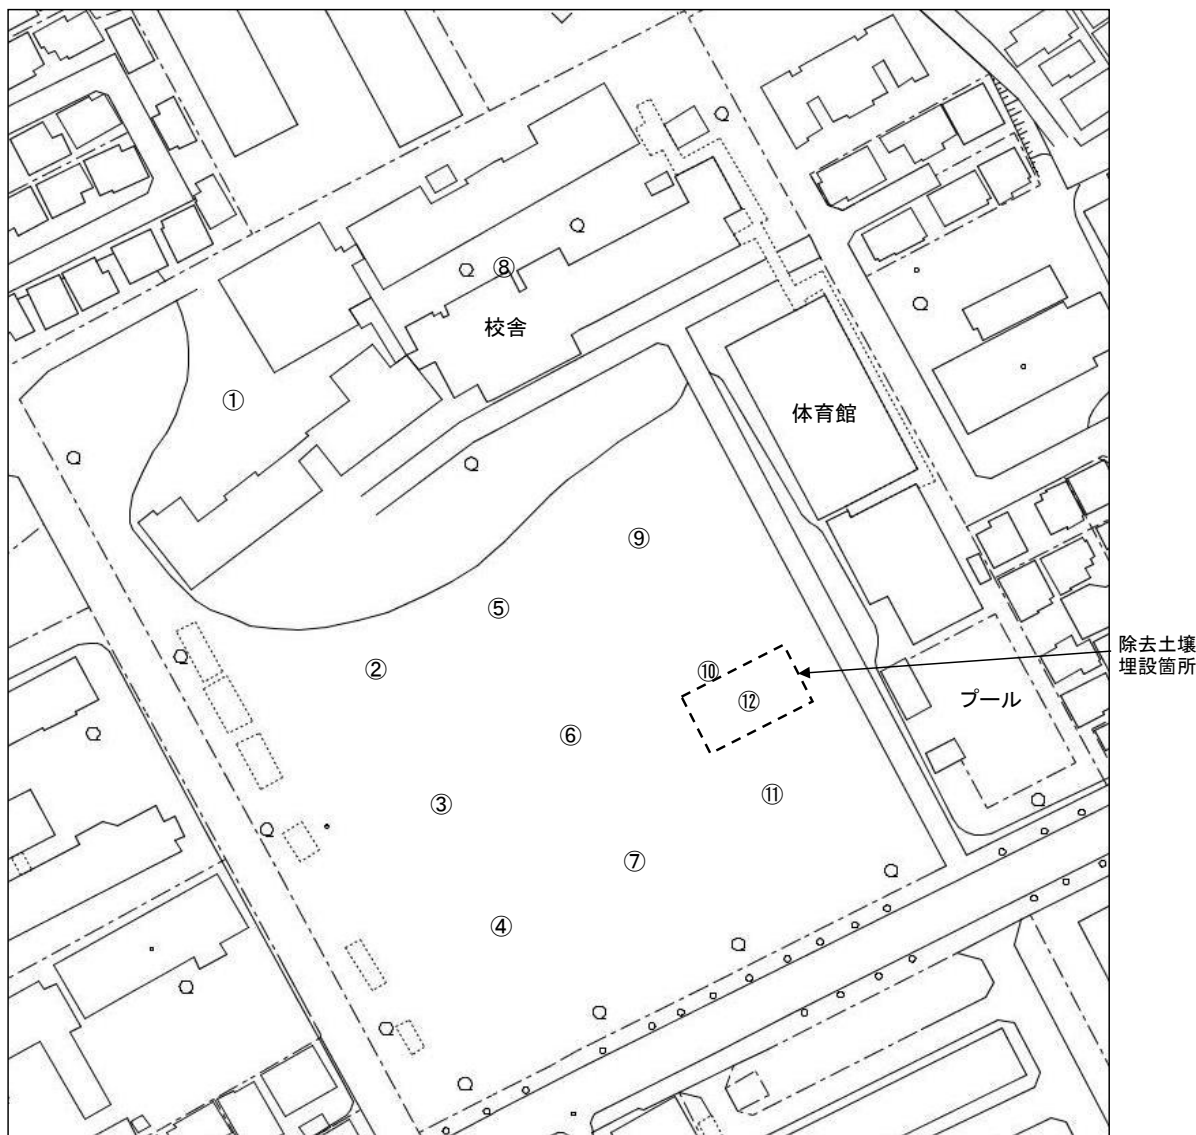

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:令和元年6月3日(前回:平成30年11月29日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	テニスコート	土	0.049	0.046	0.052	0.054	0.056	0.062
②	グラウンド	土	0.105	0.084	0.098	0.085	0.114	0.094
③	グラウンド	土	0.070	0.082	0.088	0.077	0.076	0.079
④	グラウンド	土	0.079	0.076	0.082	0.087	0.094	0.094
⑤	グラウンド	土	0.096	0.097	0.073	0.107	0.068	0.073
⑥	グラウンド	土	0.079	0.080	0.085	0.090	0.087	0.099
⑦	グラウンド	土	0.059	0.079	0.083	0.068	0.083	0.072
⑧	校舎裏	舗装	0.086	0.073	0.069	0.080	0.062	0.077
⑨	グラウンド	土	0.114	0.087	0.122	0.065	0.111	0.095
⑩	グラウンド	土	0.080	0.071	0.075	0.096	0.090	0.070
⑪	グラウンド	土	0.067	0.076	0.078	0.084	0.098	0.081
⑫	グラウンド	土	0.066	0.050	0.070	0.056	0.080	0.070
平均			0.079	0.075	0.081	0.079	0.085	0.081

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
