


放射線量マップ【柏第四中学校】

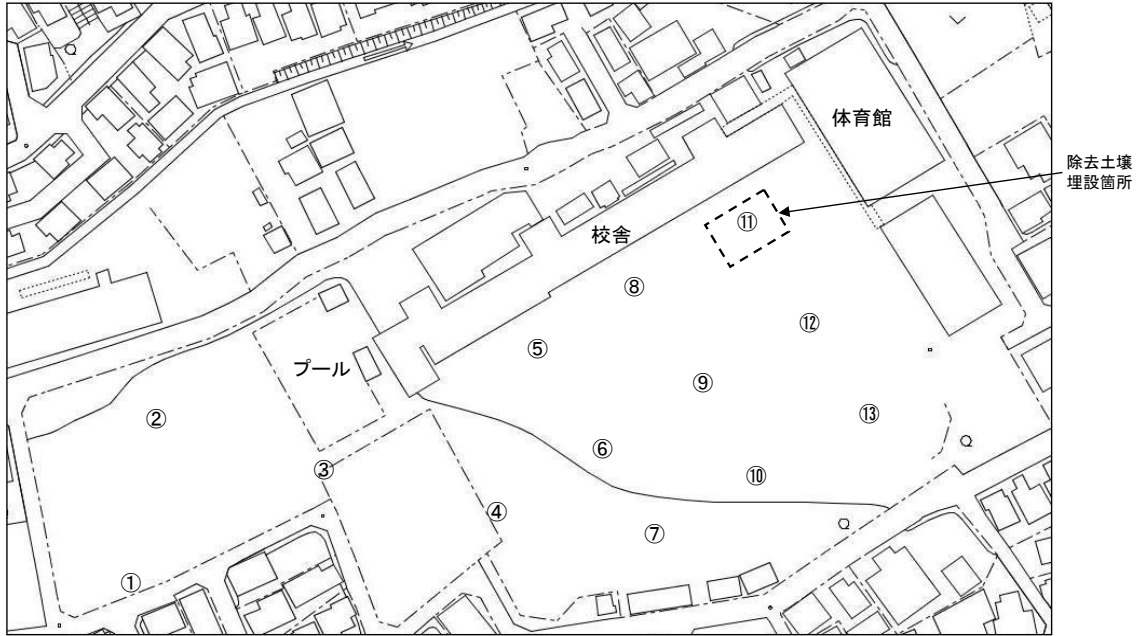

○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:令和元年5月15日(前回:平成30年11月19日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.088	0.074	0.079	0.076	0.065	0.086
②	グラウンド	土	0.070	0.086	0.079	0.088	0.083	0.072
③	グラウンド	舗装	0.046	0.055	0.048	0.053	0.035	0.040
④	グラウンド	土	0.078	0.071	0.063	0.047	0.077	0.068
⑤	グラウンド	土	0.088	0.090	0.089	0.095	0.093	0.091
⑥	グラウンド	土	0.078	0.062	0.092	0.079	0.103	0.080
⑦	グラウンド	土	0.078	0.082	0.095	0.095	0.091	0.096
⑧	グラウンド	土	0.091	0.069	0.087	0.063	0.087	0.073
⑨	グラウンド	土	0.085	0.084	0.082	0.092	0.105	0.099
⑩	グラウンド	土	0.080	0.102	0.097	0.082	0.102	0.094
⑪	グラウンド	土	0.097	0.075	0.104	0.104	0.093	0.101
⑫	グラウンド	土	0.103	0.084	0.088	0.085	0.092	0.102
⑬	グラウンド	土	0.094	0.095	0.093	0.100	0.094	0.102
平均			0.083	0.079	0.084	0.081	0.086	0.085

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
