
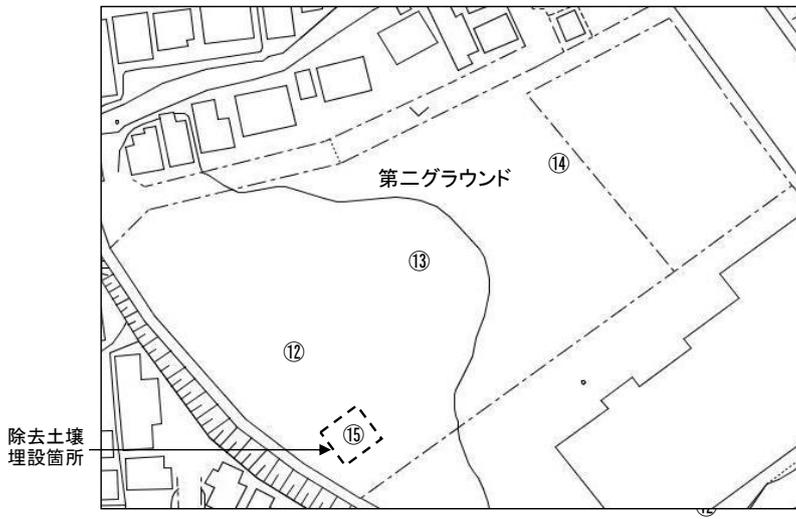


放射線量マップ【柏第二中学校】

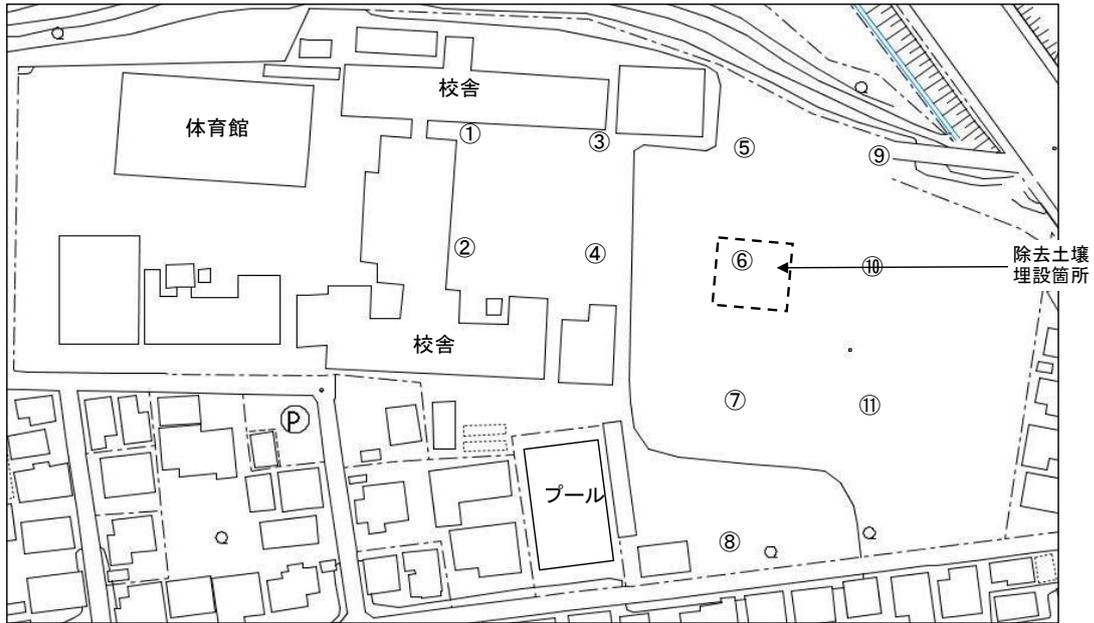

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:令和元年11月15日(前回:令和元年5月31日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎前	舗装	0.061	0.079	0.063	0.062	0.055	0.058
②	校舎前	土	0.066	0.069	0.074	0.070	0.071	0.069
③	校舎前	土	0.068	0.055	0.058	0.060	0.068	0.057
④	校舎前	土	0.055	0.033	0.044	0.041	0.052	0.051
⑤	グラウンド	土	0.071	0.082	0.056	0.096	0.068	0.127
⑥	グラウンド	土	0.078	0.076	0.091	0.106	0.081	0.077
⑦	グラウンド	土	0.083	0.093	0.092	0.101	0.098	0.096
⑧	グラウンド	土	0.081	0.089	0.076	0.087	0.078	0.076
⑨	グラウンド	土	0.082	0.075	0.088	0.075	0.104	0.060
⑩	グラウンド	土	0.084	0.086	0.093	0.096	0.100	0.066
⑪	グラウンド	土	0.110	0.077	0.084	0.099	0.107	0.116
⑫	グラウンド	土	0.081	0.089	0.089	0.096	0.092	0.100
⑬	グラウンド	土	0.077	0.090	0.101	0.095	0.081	0.090
⑭	グラウンド	土	0.087	0.093	0.095	0.092	0.096	0.086
⑮	グラウンド	土	0.081	0.093	0.072	0.084	0.086	0.095
平均			0.078	0.079	0.078	0.084	0.082	0.082

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
