


放射線量マップ【大津ヶ丘中学校】

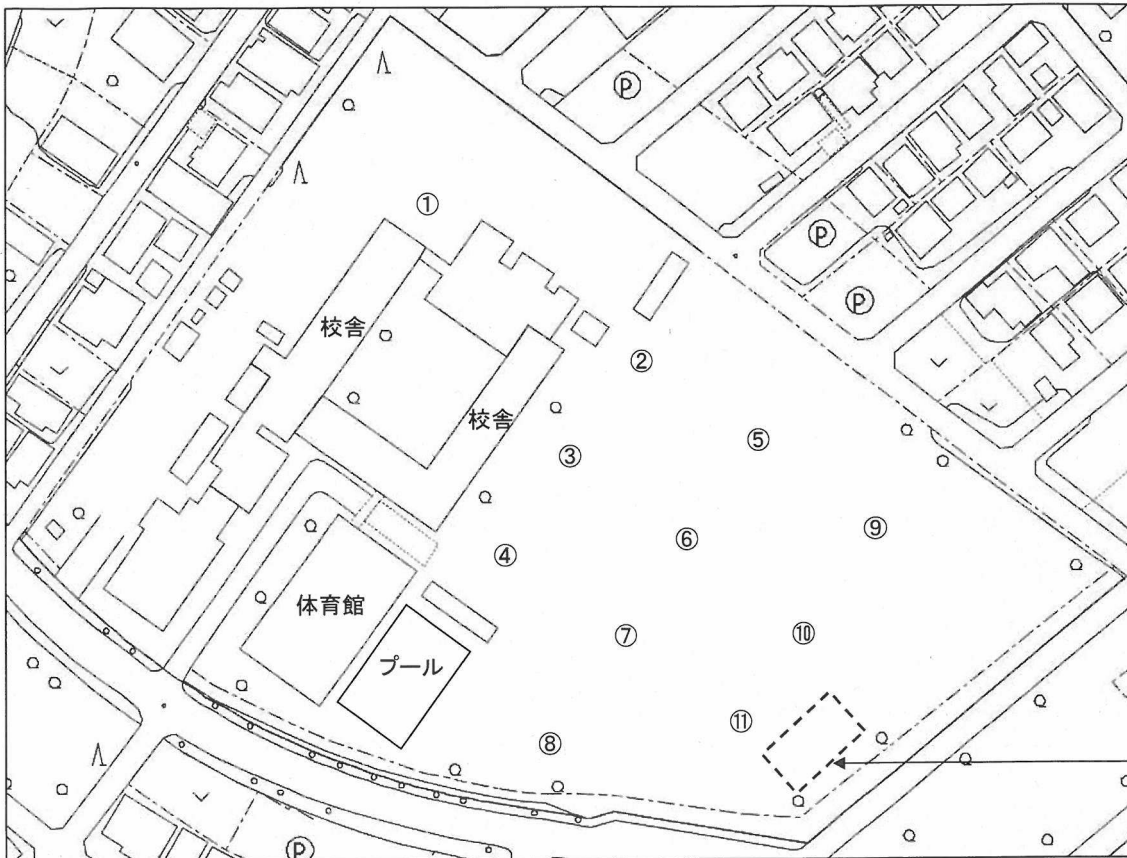

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成25年5月1日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回		今回		今回	
①	校舎裏	土	0.092		0.102		0.117	
②	グラウンド	土	0.083		0.122		0.121	
③	グラウンド	土	0.090		0.101		0.096	
④	グラウンド	土	0.107		0.117		0.141	
⑤	グラウンド	土	0.085		0.076		0.064	
⑥	グラウンド	土	0.058		0.066		0.060	
⑦	グラウンド	土	0.082		0.073		0.085	
⑧	グラウンド	土	0.089		0.089		0.118	
⑨	グラウンド	土	0.083		0.104		0.108	
⑩	グラウンド	土	0.097		0.087		0.088	
⑪	グラウンド	土	0.111		0.101		0.089	
平均			0.089		0.094		0.099	

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
