


放射線量マップ【土南部小学校】

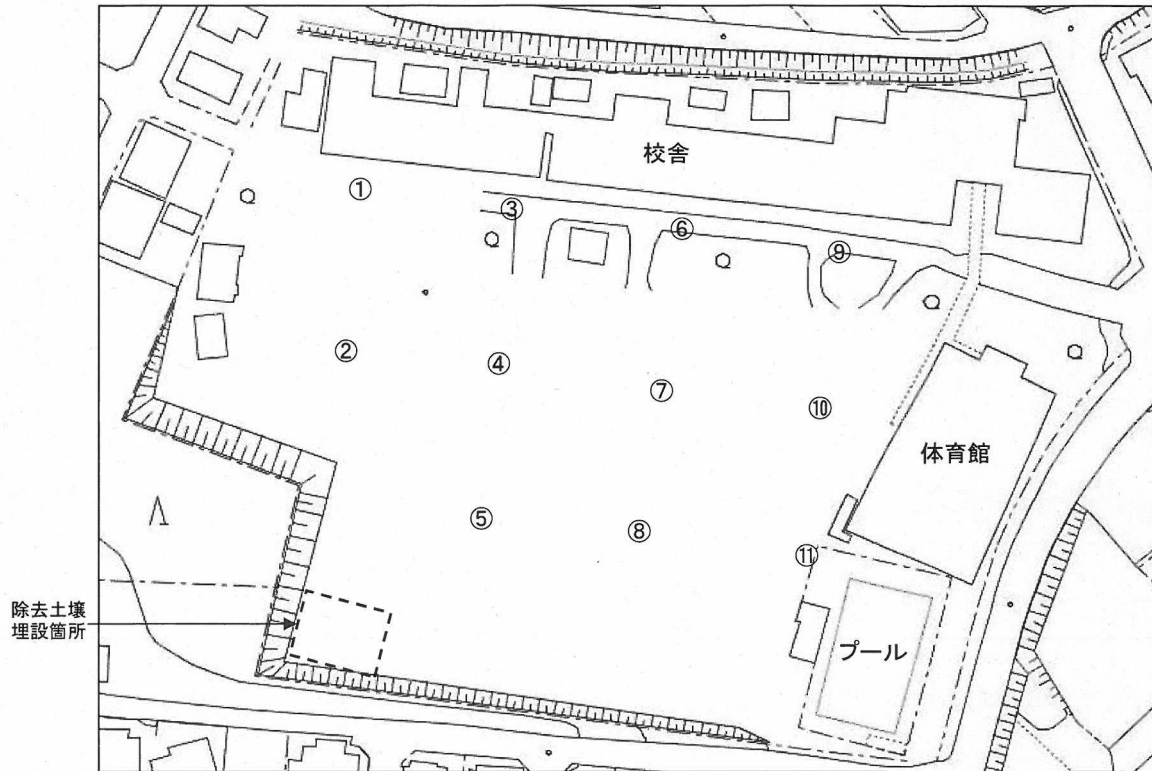

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成25年8月14日(前回:平成25年5月2日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	舗装	0.054	0.066	0.054	0.060	0.043	0.039
②	グラウンド	土	0.055	0.064	0.070	0.057	0.053	0.050
③	グラウンド	舗装	0.060	0.069	0.051	0.068	0.064	0.053
④	グラウンド	土	0.043	0.047	0.045	0.047	0.050	0.035
⑤	グラウンド	土	0.036	0.054	0.043	0.052	0.047	0.034
⑥	グラウンド	舗装	0.068	0.080	0.070	0.096	0.102	0.071
⑦	グラウンド	土	0.041	0.047	0.036	0.049	0.051	0.044
⑧	グラウンド	土	0.043	0.050	0.029	0.041	0.044	0.028
⑨	グラウンド	舗装	0.057	0.075	0.069	0.080	0.081	0.079
⑩	グラウンド	土	0.043	0.041	0.042	0.042	0.045	0.045
⑪	グラウンド	土	0.028	0.066	0.033	0.055	0.047	0.056
平均			0.048	0.060	0.049	0.059	0.057	0.049

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
