


放射線量マップ【中原小学校】

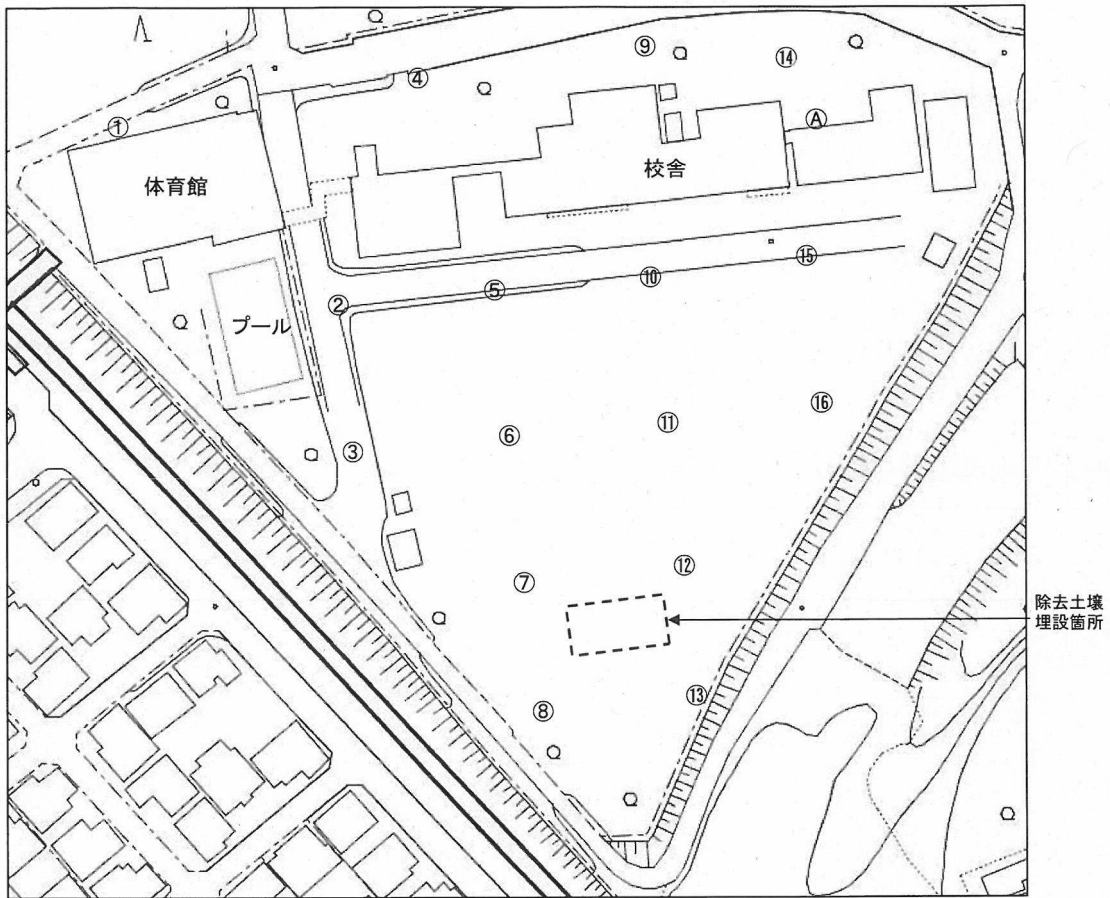

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成25年8月5日(前回:平成25年5月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館裏	土	0.089	0.117	0.103	0.102	0.153	0.085
②	グラウンド	土	0.135	0.103	0.116	0.083	0.124	0.050
③	グラウンド	土	0.059	0.073	0.054	0.056	0.064	0.093
④	校舎裏	土	0.121	0.083	0.115	0.094	0.132	0.094
⑤	校舎前	土	0.081	0.077	0.072	0.087	0.086	0.067
⑥	グラウンド	土	0.043	0.042	0.037	0.040	0.035	0.037
⑦	グラウンド	土	0.051	0.040	0.051	0.054	0.053	0.048
⑧	校舎裏	土	0.063	0.099	0.070	0.081	0.053	0.163
⑨	校舎前	土	0.090	0.108	0.084	0.119	0.094	0.121
⑩	グラウンド	土	0.071	0.053	0.070	0.061	0.087	0.043
⑪	グラウンド	土	0.042	0.028	0.034	0.036	0.023	0.035
⑫	校舎裏	土	0.043	0.043	0.038	0.040	0.037	0.027
⑬	校舎前	土	0.074	0.143	0.054	0.115	0.055	0.072
⑭	グラウンド	土	0.083	0.079	0.071	0.080	0.071	0.075
⑮	校舎裏	土	0.078	0.074	0.070	0.049	0.071	0.050
⑯	校舎裏	土	0.055	0.050	0.048	0.059	0.043	0.039
平均			0.074	0.076	0.068	0.072	0.074	0.069

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
(A)	校舎裏	雨樋下	0.147	0.132	0.215	0.203	0.483	0.437

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
