


## 放射線量マップ【田中中学校】

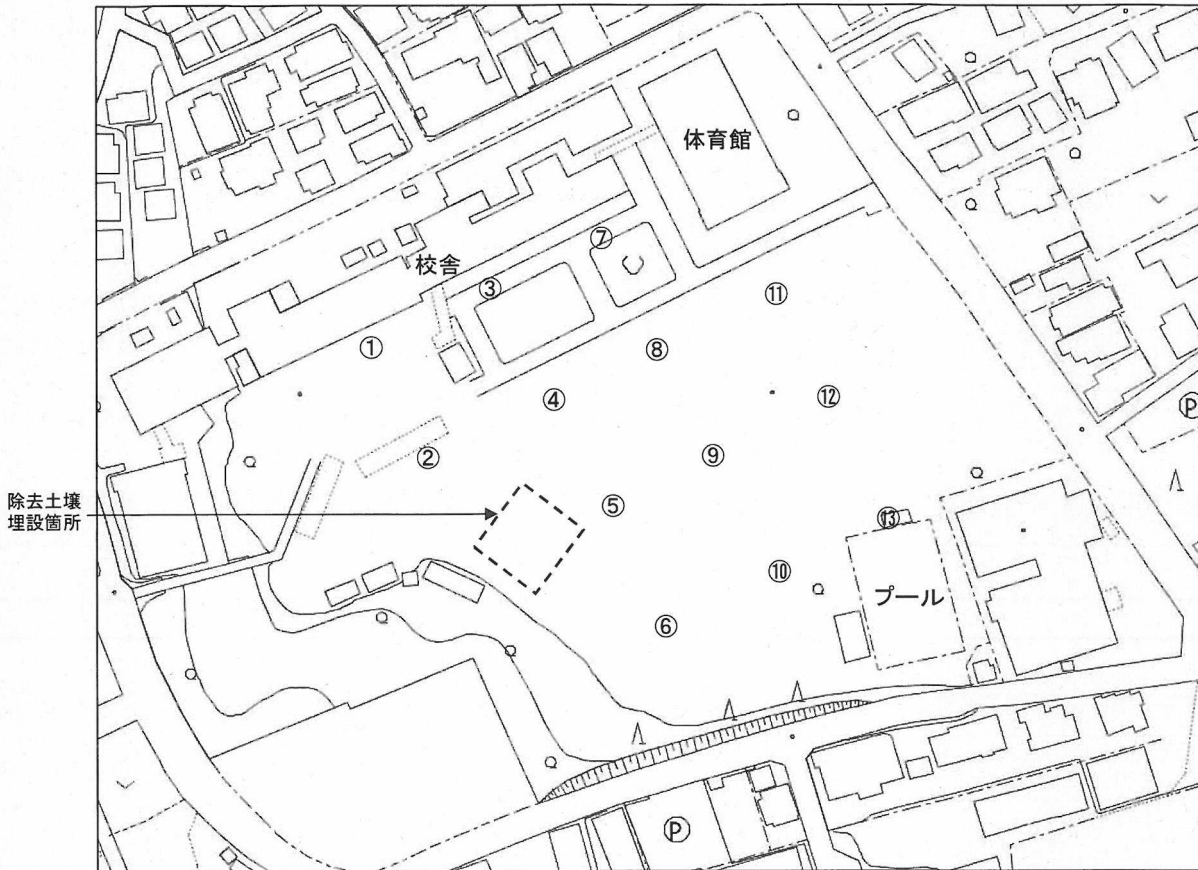

○除染完了日：平成25年1月15日

○測定日：平成25年8月1日(前回：平成25年5月1日) (単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎前	舗装	0.073	0.082	0.069	0.074	0.094	0.062
②	グラウンド	土	0.096	0.095	0.096	0.100	0.099	0.093
③	校舎前	舗装	0.080	0.070	0.075	0.086	0.077	0.089
④	グラウンド	土	0.097	0.071	0.064	0.066	0.069	0.066
⑤	グラウンド	土	0.074	0.070	0.075	0.081	0.077	0.081
⑥	グラウンド	土	0.074	0.074	0.063	0.093	0.069	0.063
⑦	校舎前	舗装	0.124	0.142	0.108	0.135	0.085	0.162
⑧	グラウンド	土	0.079	0.075	0.071	0.074	0.069	0.074
⑨	グラウンド	土	0.080	0.089	0.073	0.087	0.097	0.096
⑩	グラウンド	土	0.102	0.103	0.094	0.077	0.075	0.091
⑪	グラウンド	土	0.089	0.085	0.107	0.090	0.103	0.066
⑫	グラウンド	土	0.094	0.092	0.095	0.085	0.092	0.086
⑬	グラウンド	土	0.083	0.088	0.076	0.081	0.079	0.072
平均			0.088	0.087	0.082	0.087	0.083	0.085

※1 環境省基準：地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
