


放射線量マップ【土小学校】

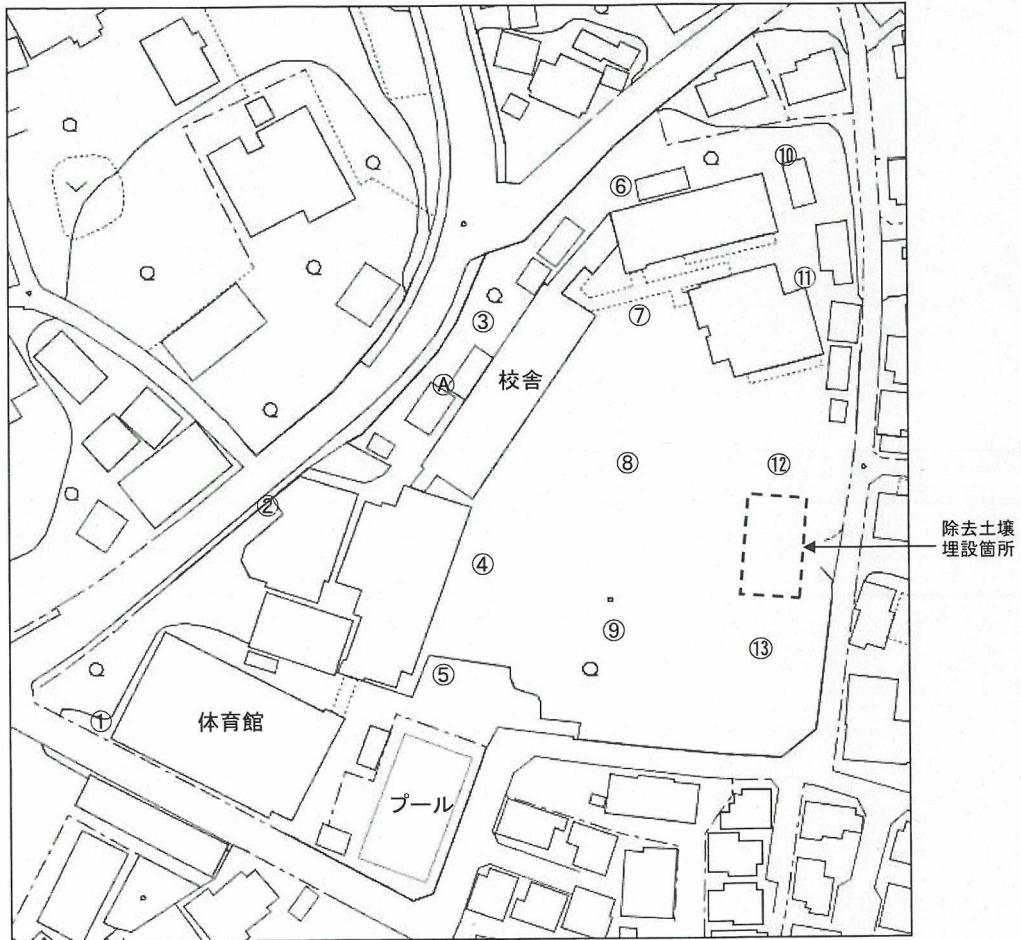

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成25年11月11日(前回:平成25年8月13日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館横	土	0.101	0.104	0.109	0.135	0.107	0.140
②	校舎前	アスファルト	0.080	0.076	0.081	0.068	0.085	0.095
③	校舎前	土	0.105	0.105	0.087	0.098	0.074	0.086
④	グラウンド	土	0.076	0.095	0.064	0.071	0.045	0.081
⑤	グラウンド	池横の芝	0.096	0.126	0.088	0.113	0.080	0.155
⑥	校舎裏	土	0.083	0.098	0.088	0.093	0.060	0.071
⑦	校舎前	土	0.059	0.085	0.057	0.072	0.063	0.083
⑧	グラウンド	土	0.065	0.086	0.054	0.075	0.056	0.062
⑨	グラウンド	土	0.080	0.100	0.093	0.098	0.098	0.082
⑩	グラウンド	土	0.111	0.133	0.103	0.122	0.094	0.131
⑪	校舎前	土	0.131	0.187	0.152	0.200	0.195	0.231
⑫	グラウンド	アスファルト	0.078	0.077	0.064	0.073	0.066	0.075
⑬	グラウンド	土	0.057	0.090	0.054	0.055	0.055	0.050
平均			0.086	0.105	0.084	0.098	0.083	0.103

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	雨樋下	0.116	0.138	0.125	0.181	0.423	0.544

※1 環境省基準: 地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標: 地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
