


放射線量マップ【田中中学校】

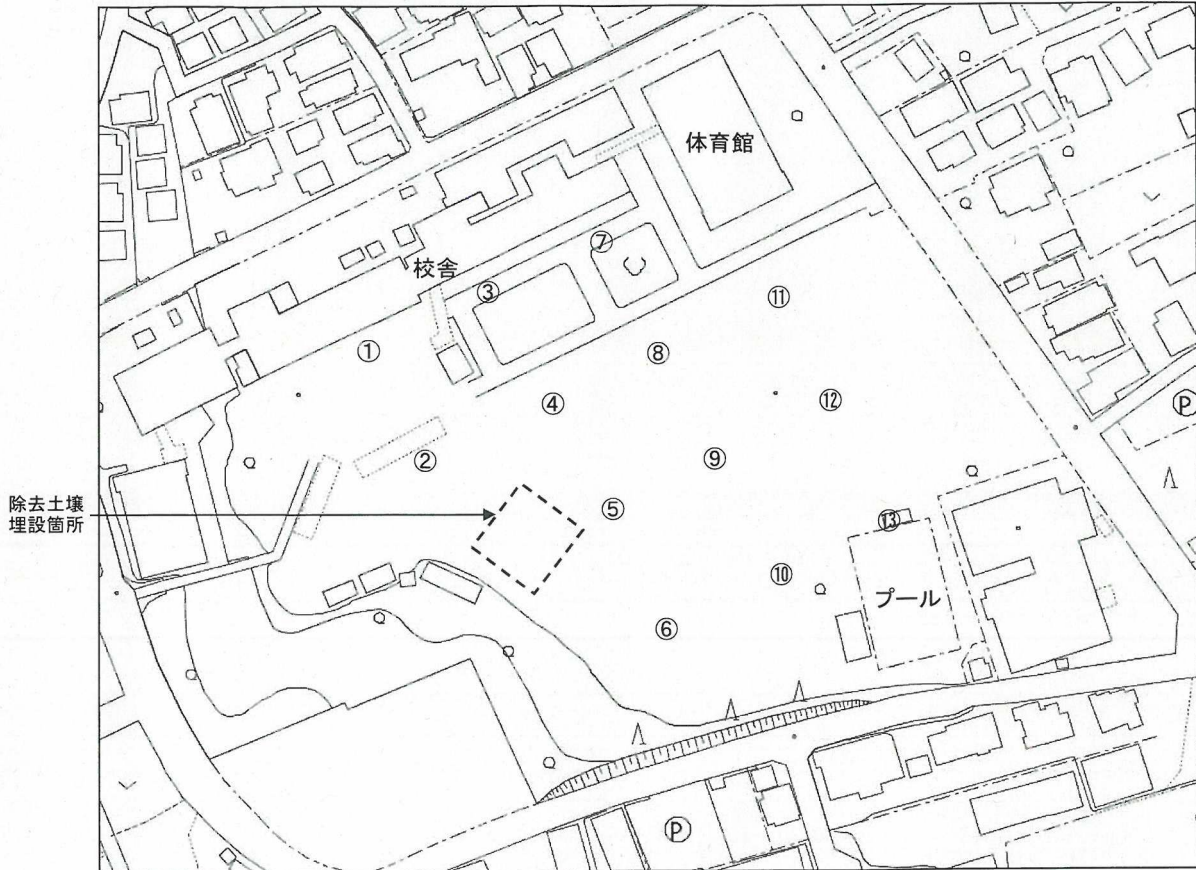

○除染完了日：平成25年1月15日

○測定日：平成25年11月12日(前回：平成25年8月1日) (単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎前	舗装	0.079	0.073	0.082	0.069	0.063	0.094
②	グラウンド	土	0.082	0.096	0.103	0.096	0.089	0.099
③	校舎前	舗装	0.082	0.080	0.090	0.075	0.067	0.077
④	グラウンド	土	0.080	0.097	0.094	0.064	0.070	0.069
⑤	グラウンド	土	0.076	0.074	0.089	0.075	0.083	0.077
⑥	グラウンド	土	0.077	0.074	0.084	0.063	0.074	0.069
⑦	校舎前	舗装	0.089	0.124	0.081	0.108	0.073	0.085
⑧	グラウンド	土	0.070	0.079	0.071	0.071	0.076	0.069
⑨	グラウンド	土	0.093	0.080	0.090	0.073	0.085	0.097
⑩	グラウンド	土	0.104	0.102	0.098	0.094	0.093	0.075
⑪	グラウンド	土	0.079	0.089	0.082	0.107	0.073	0.103
⑫	グラウンド	土	0.085	0.094	0.098	0.095	0.080	0.092
⑬	グラウンド	土	0.065	0.083	0.086	0.076	0.092	0.079
平均			0.082	0.088	0.088	0.082	0.078	0.083

※1 環境省基準：地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
