


# 放射線量マップ【柏第二中学校】

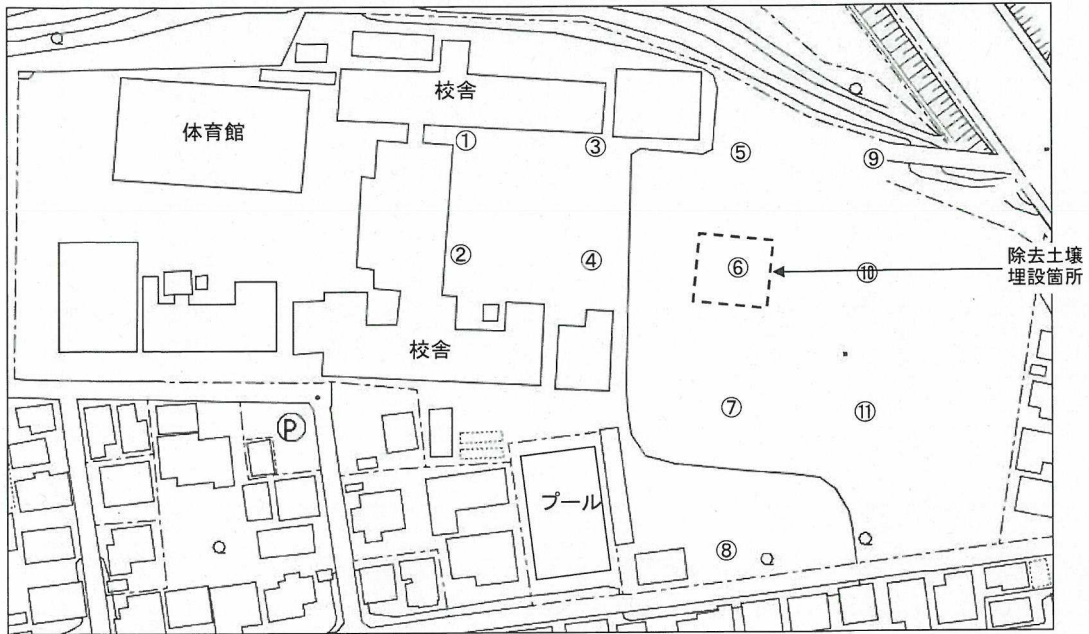

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成26年2月6日(前回:平成25年11月6日)

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |    | ※1環境省基準 |       | ※2柏市目標 |       |       |       |
|------|-------|----|---------|-------|--------|-------|-------|-------|
|      |       |    | 100cm   |       | 50cm   |       | 5cm   |       |
|      |       |    | 今回      | 前回    | 今回     | 前回    | 今回    | 前回    |
| ①    | 校舎前   | 舗装 | 0.052   | 0.050 | 0.049  | 0.048 | 0.041 | 0.062 |
| ②    | 校舎前   | 土  | 0.052   | 0.077 | 0.075  | 0.078 | 0.073 | 0.092 |
| ③    | 校舎前   | 土  | 0.046   | 0.055 | 0.041  | 0.064 | 0.042 | 0.047 |
| ④    | 校舎前   | 土  | 0.053   | 0.070 | 0.046  | 0.059 | 0.032 | 0.058 |
| ⑤    | グラウンド | 土  | 0.084   | 0.095 | 0.117  | 0.132 | 0.132 | 0.197 |
| ⑥    | グラウンド | 土  | 0.081   | 0.074 | 0.068  | 0.091 | 0.080 | 0.106 |
| ⑦    | グラウンド | 土  | 0.061   | 0.088 | 0.073  | 0.087 | 0.080 | 0.112 |
| ⑧    | グラウンド | 土  | 0.076   | 0.087 | 0.064  | 0.102 | 0.065 | 0.118 |
| ⑨    | グラウンド | 土  | 0.078   | 0.106 | 0.092  | 0.086 | 0.098 | 0.118 |
| ⑩    | グラウンド | 土  | 0.085   | 0.114 | 0.086  | 0.099 | 0.087 | 0.119 |
| ⑪    | グラウンド | 土  | 0.108   | 0.095 | 0.090  | 0.095 | 0.093 | 0.118 |
| ⑫    | グラウンド | 土  | 0.105   | 0.146 | 0.098  | 0.129 | 0.107 | 0.152 |
| ⑬    | グラウンド | 土  | 0.092   | 0.092 | 0.081  | 0.100 | 0.097 | 0.089 |
| ⑭    | グラウンド | 土  | 0.084   | 0.077 | 0.075  | 0.076 | 0.078 | 0.095 |
| 平均   |       |    | 0.076   | 0.088 | 0.075  | 0.089 | 0.079 | 0.106 |

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
