


除染後放射線量マップ【柏第二小学校】

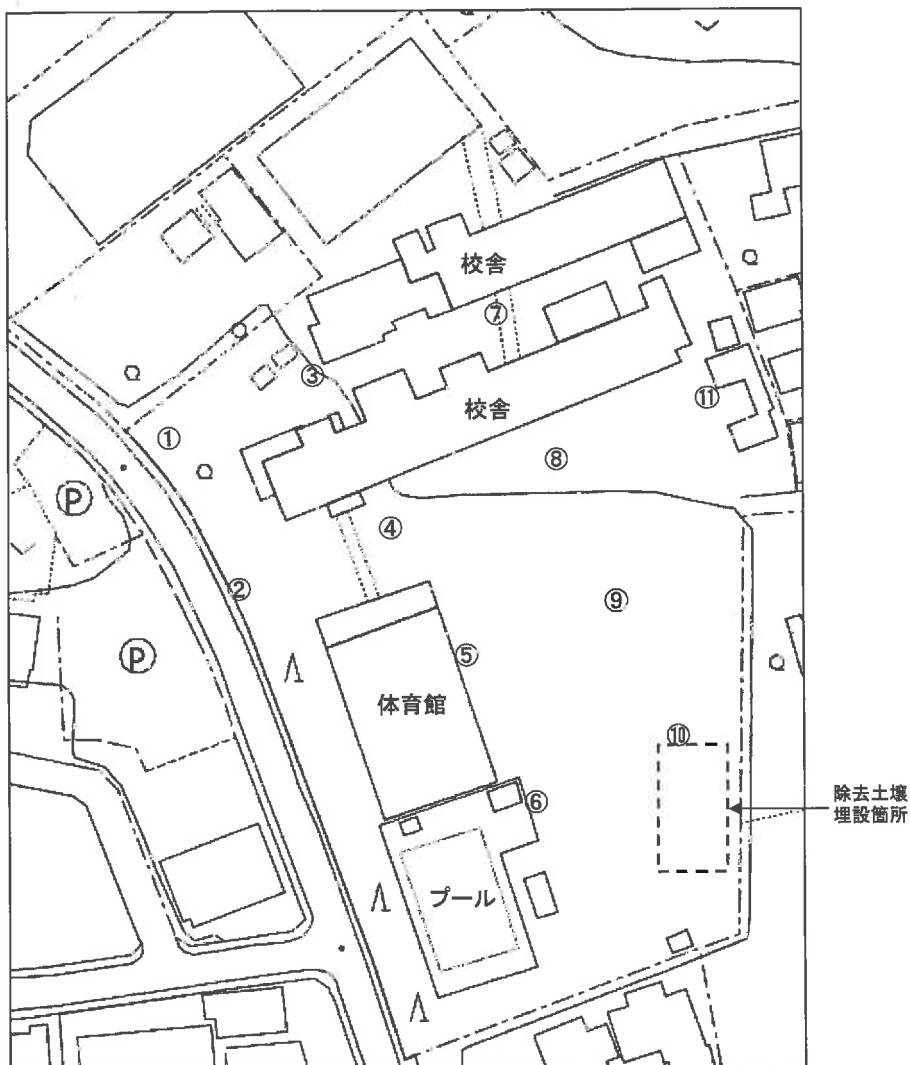

○除染前測定日:平成24年6月29日

○除染後測定日:平成24年8月28日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎前	舗装	0.253	0.104	0.259	0.108	0.230	0.107
②	校門	舗装	0.188	0.129	0.157	0.116	0.161	0.147
③	校舎前	舗装	0.135	0.107	0.145	0.108	0.172	0.150
④	グラウンド	土	0.227	0.102	0.210	0.111	0.226	0.115
⑤	グラウンド	土	0.124	0.047	0.143	0.067	0.141	0.059
⑥	グラウンド	土	0.140	0.075	0.189	0.090	0.280	0.119
⑦	校舎前	舗装	0.110	0.113	0.153	0.087	0.168	0.127
⑧	グラウンド	土	0.153	0.068	0.159	0.074	0.137	0.076
⑨	グラウンド	土	0.125	0.058	0.119	0.062	0.121	0.068
⑩	グラウンド	土	0.151	0.071	0.142	0.054	0.144	0.062
⑪	グラウンド	土	0.147	0.073	0.171	0.066	0.162	0.065
平均			0.159	0.086	0.168	0.086	0.177	0.100

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
