


除染後放射線量マップ【土小学校】

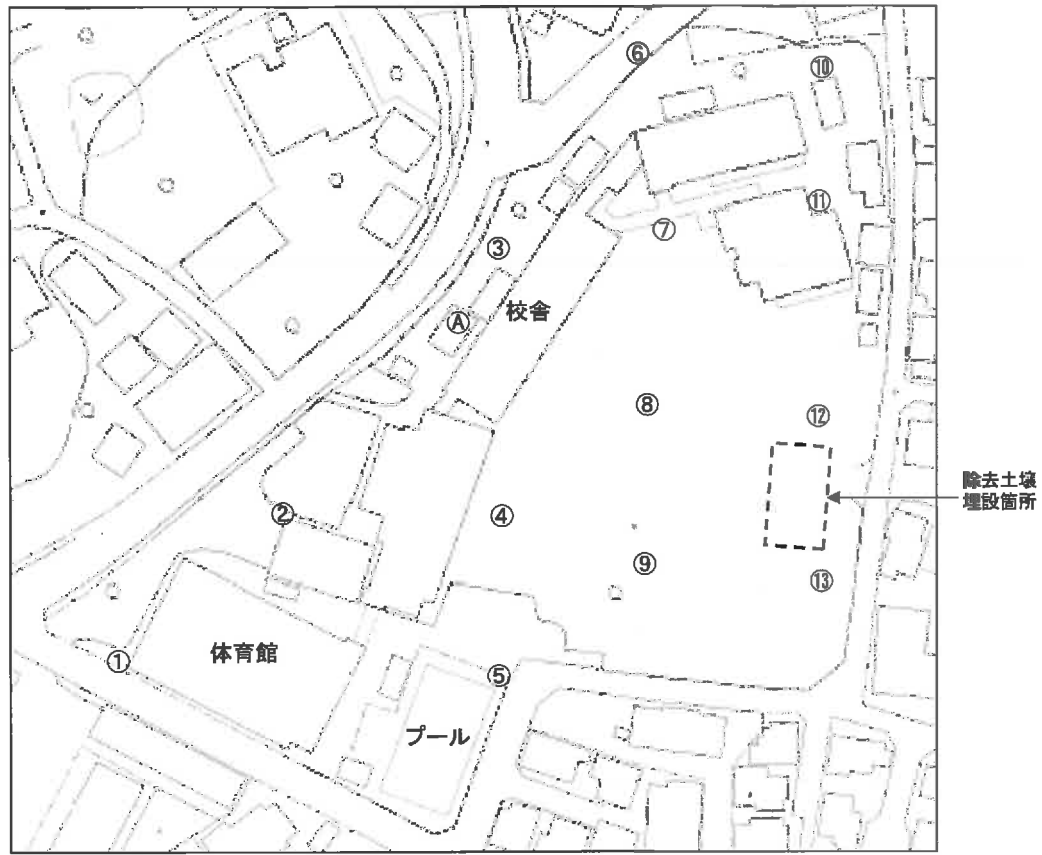

○除染前測定日:平成24年3月21日

○除染後測定日:平成24年5月11日, 30日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |        | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |        | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |        | 除染前     | 除染後   | 除染前   | 除染後   | 除染前    | 除染後   |
| ①    | 校舎前   | 土      | 0.219   | 0.111 | 0.235 | 0.121 | 0.269  | 0.118 |
| ②    | グラウンド | 土      | 0.208   | 0.139 | 0.235 | 0.178 | 0.300  | 0.200 |
| ③    | 校舎前   | 土      | 0.195   | 0.104 | 0.220 | 0.106 | 0.261  | 0.077 |
| ④    | グラウンド | 土      | 0.184   | 0.102 | 0.215 | 0.117 | 0.250  | 0.090 |
| ⑤    | グラウンド | 池横の芝   | 0.242   | 0.103 | 0.280 | 0.086 | 0.431  | 0.097 |
| ⑥    | グラウンド | 土      | 0.233   | 0.096 | 0.294 | 0.109 | 0.378  | 0.124 |
| ⑦    | 校舎前   | 土      | 0.204   | 0.098 | 0.212 | 0.098 | 0.219  | 0.108 |
| ⑧    | グラウンド | 土      | 0.190   | 0.107 | 0.188 | 0.121 | 0.220  | 0.154 |
| ⑨    | グラウンド | 土      | 0.144   | 0.081 | 0.113 | 0.069 | 0.087  | 0.070 |
| ⑩    | グラウンド | 土      | 0.302   | 0.129 | 0.314 | 0.148 | 0.353  | 0.157 |
| ⑪    | 校舎前   | 土      | 0.229   | 0.142 | 0.303 | 0.181 | 0.404  | 0.192 |
| ⑫    | グラウンド | アスファルト | 0.174   | 0.099 | 0.195 | 0.112 | 0.238  | 0.101 |
| ⑬    | グラウンド | アスファルト | 0.205   | 0.095 | 0.169 | 0.105 | 0.180  | 0.121 |
| 平均   |       |        | 0.210   | 0.108 | 0.229 | 0.118 | 0.276  | 0.124 |

局所的な柏市の目標値超過箇所

| 測定箇所 |     |     | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-----|-----|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |     |     | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |     |     | 除染前     | 除染後   | 除染前   | 除染後   | 除染前    | 除染後   |
| ①    | 校舎裏 | 雨樋下 | 0.307   | 0.181 | 0.312 | 0.216 | 0.420  | 0.249 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
