


除染後放射線量マップ【柏第二小学校】

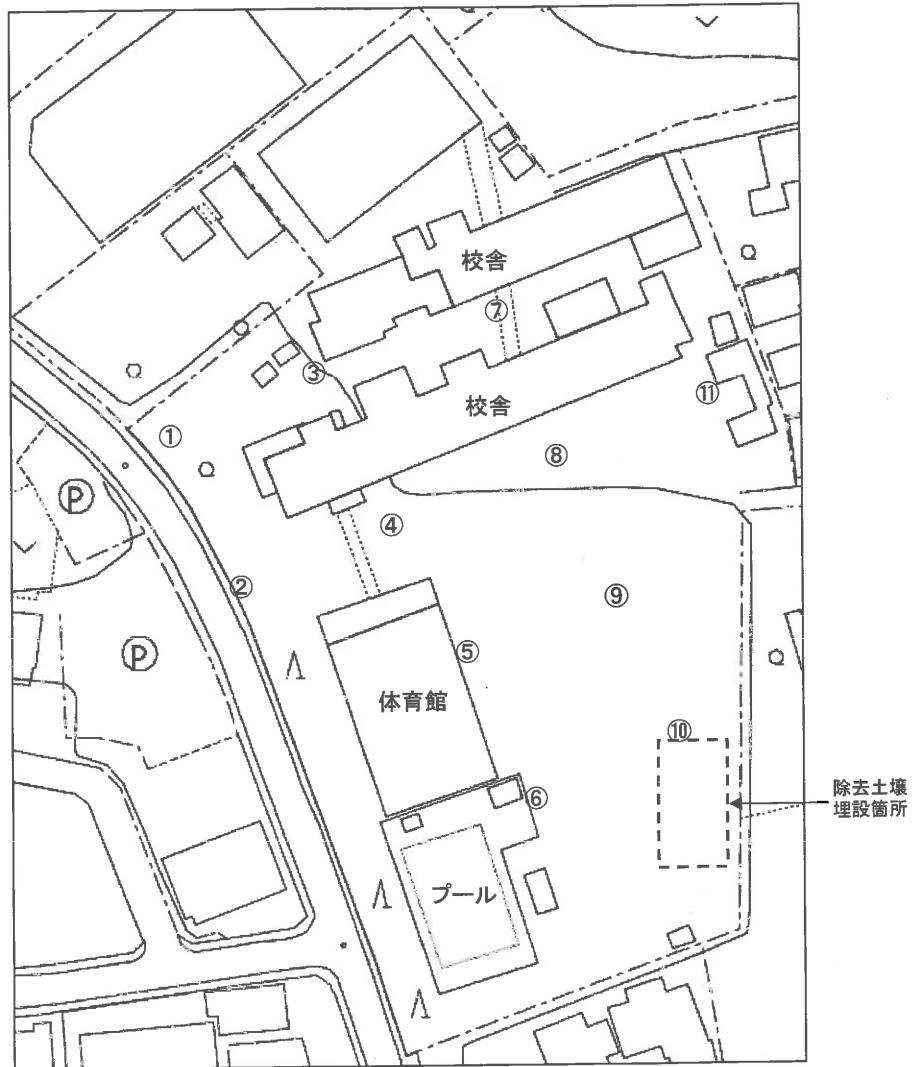

○除染前測定日:平成24年6月29日

○除染後測定日:平成24年11月28日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎前	舗装	0.253	0.088	0.259	0.109	0.230	0.111
②	校門	舗装	0.188	0.096	0.157	0.087	0.161	0.114
③	校舎前	舗装	0.135	0.123	0.145	0.127	0.172	0.104
④	グラウンド	土	0.227	0.081	0.210	0.091	0.226	0.076
⑤	グラウンド	土	0.124	0.075	0.143	0.081	0.141	0.084
⑥	グラウンド	土	0.140	0.069	0.189	0.066	0.280	0.059
⑦	校舎前	舗装	0.110	0.106	0.153	0.108	0.168	0.082
⑧	グラウンド	土	0.153	0.080	0.159	0.083	0.137	0.072
⑨	グラウンド	土	0.125	0.060	0.119	0.054	0.121	0.058
⑩	グラウンド	土	0.151	0.065	0.142	0.073	0.144	0.077
⑪	グラウンド	土	0.147	0.088	0.171	0.066	0.162	0.066
平均			0.159	0.085	0.168	0.086	0.177	0.082

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
