


放射線量マップ【柏中学校】

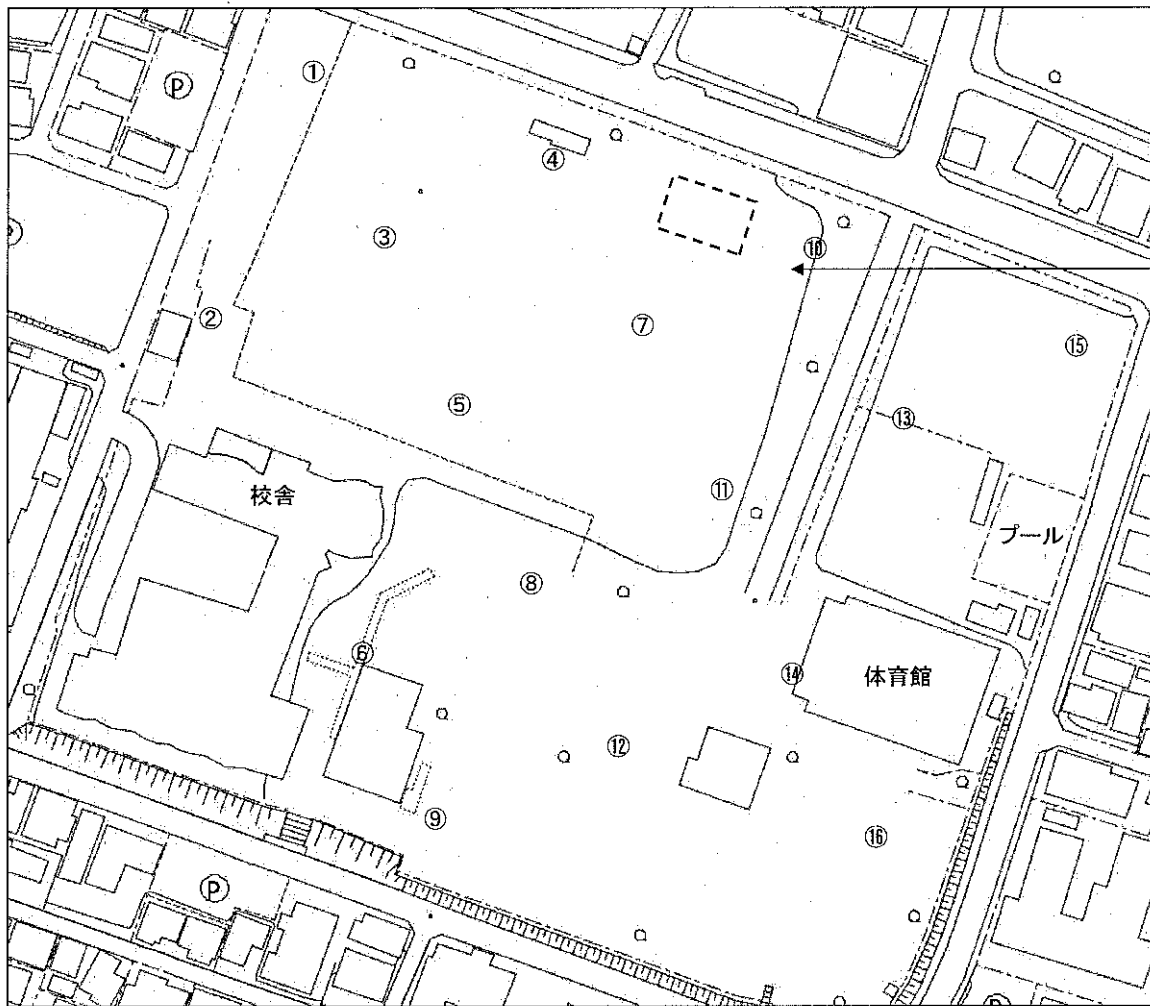

除去土壌
埋設箇所

○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:平成26年5月2日(前回:平成26年2月5日)

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.127	0.116	0.136	0.122	0.229	0.104
②	グラウンド	土	0.079	0.091	0.101	0.088	0.154	0.179
③	グラウンド	土	0.101	0.072	0.086	0.075	0.092	0.054
④	グラウンド	土	0.097	0.083	0.081	0.068	0.096	0.065
⑤	グラウンド	土	0.083	0.075	0.074	0.093	0.075	0.070
⑥	校舎前	土	工事中	0.086	工事中	0.098	工事中	0.076
⑦	グラウンド	土	0.079	0.053	0.078	0.066	0.093	0.065
⑧	通路	舗装	工事中	0.070	工事中	0.087	工事中	0.059
⑨	グラウンド	土	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中
⑩	グラウンド	土	0.093	0.092	0.090	0.085	0.117	0.090
⑪	グラウンド	土	0.145	0.089	0.139	0.104	0.144	0.090
⑫	グラウンド	土	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中
⑬	バレーコート	土	0.043	0.041	0.049	0.047	0.062	0.035
⑭	体育館前	土	0.138	0.098	0.141	0.103	0.117	0.101
⑮	テニスコート	土	0.055	0.036	0.040	0.038	0.029	0.049
⑯	グラウンド	土	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中
平均			0.095	0.077	0.092	0.083	0.110	0.080

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
