


放射線量マップ【逆井中学校】

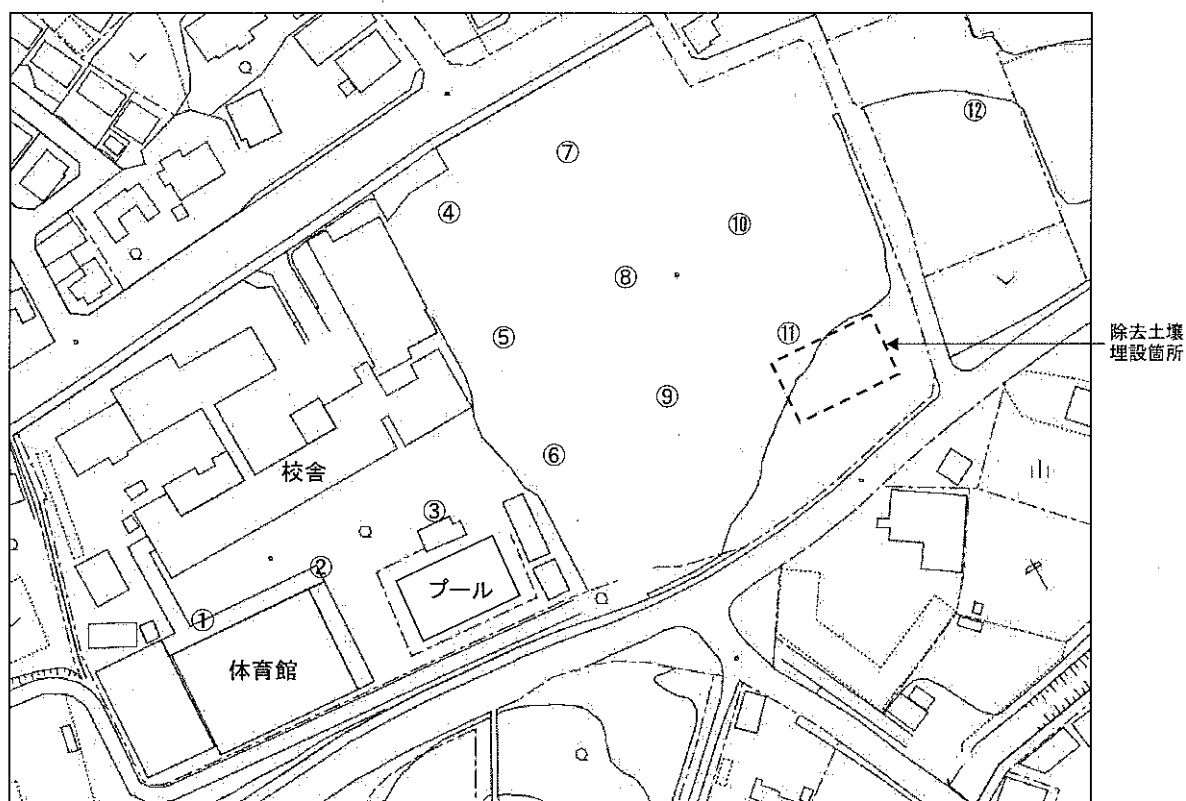

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成26年11月11日(前回:平成26年5月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館前	土	0.095	0.097	0.091	0.134	0.073	0.112
②	体育館前	舗装	0.054	0.094	0.056	0.054	0.080	0.090
③	プール前	土	0.107	0.155	0.111	0.141	0.113	0.161
④	グラウンド	土	0.074	0.084	0.152	0.094	0.071	0.091
⑤	グラウンド	土	0.071	0.086	0.091	0.071	0.083	0.083
⑥	グラウンド	土	0.096	0.088	0.090	0.086	0.097	0.070
⑦	グラウンド	土	0.081	0.086	0.104	0.069	0.085	0.066
⑧	グラウンド	土	0.105	0.090	0.102	0.084	0.108	0.080
⑨	グラウンド	土	0.077	0.083	0.071	0.072	0.090	0.075
⑩	グラウンド	土	0.061	0.073	0.064	0.064	0.064	0.064
⑪	グラウンド	土	0.077	0.102	0.082	0.072	0.105	0.070
⑫	テニスコート	土	0.060	0.071	0.065	0.062	0.063	0.063
平均			0.080	0.092	0.090	0.084	0.086	0.085

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
