


放射線量マップ【旭小学校】

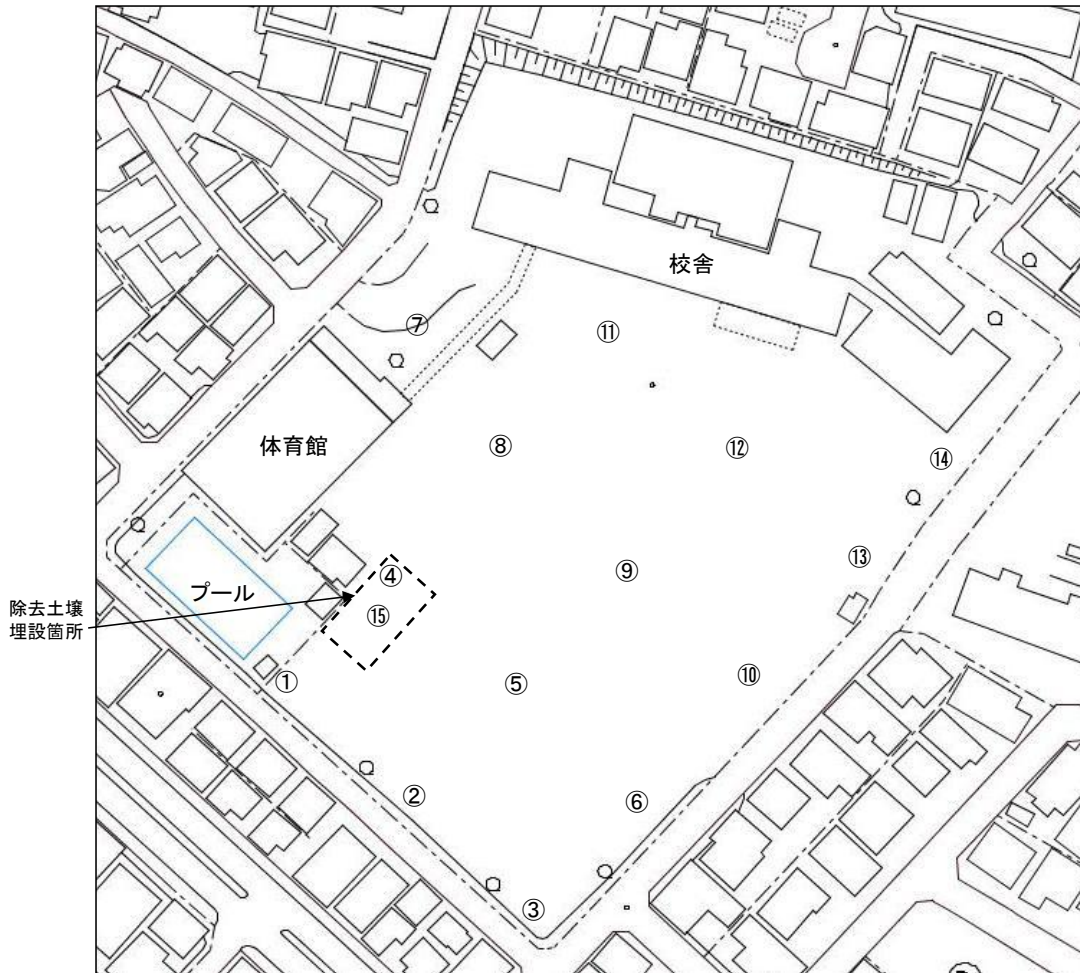

○除染完了日：平成24年5月9日

○測定日：平成30年12月14日（前回：平成30年5月17日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール横	樋	0.036	0.068	0.043	0.076	0.039	0.074
②	グラウンド	土	0.036	0.060	0.051	0.069	0.042	0.079
③	グラウンド	土	0.055	0.047	0.063	0.043	0.058	0.034
④	グラウンド	土	0.037	0.037	0.034	0.024	0.046	0.039
⑤	グラウンド	土	0.039	0.033	0.026	0.035	0.022	0.054
⑥	グラウンド	土	0.042	0.044	0.044	0.052	0.056	0.062
⑦	通路	アスファルト	0.049	0.048	0.057	0.045	0.049	0.048
⑧	グラウンド	土	0.026	0.044	0.021	0.031	0.029	0.032
⑨	グラウンド	土	0.047	0.044	0.033	0.036	0.044	0.030
⑩	グラウンド	土	0.043	0.059	0.040	0.046	0.034	0.049
⑪	グラウンド	土	0.070	0.056	0.058	0.052	0.063	0.042
⑫	グラウンド	土	0.038	0.025	0.036	0.052	0.037	0.033
⑬	グラウンド	土	0.041	0.045	0.030	0.056	0.023	0.052
⑭	校舎横	側溝	0.057	0.069	0.051	0.086	0.070	0.089
⑮	グラウンド	土	0.039	0.040	0.037	0.028	0.041	0.034
平均			0.044	0.048	0.042	0.049	0.044	0.050

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
