


放射線量マップ【風早北部小学校】

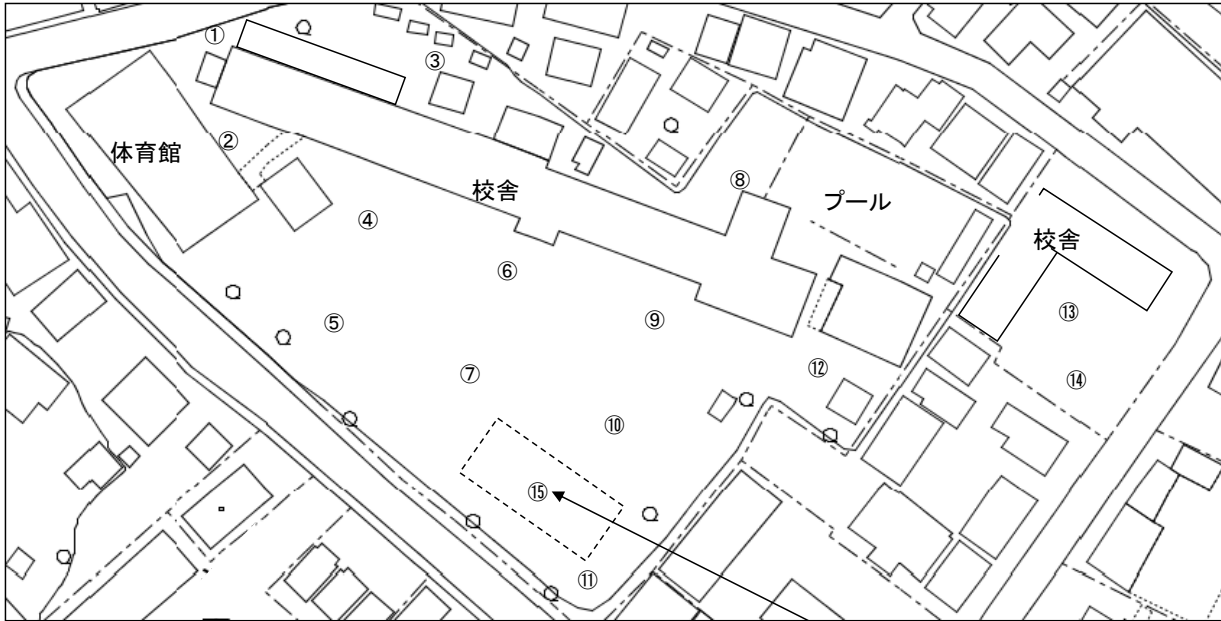

除去土壤
埋設箇所

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成30年11月 8日(前回:平成30年5月17日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.052	0.051	0.047	0.067	0.050	0.056
②	校舎前	土	0.078	0.085	0.073	0.096	0.067	0.089
③	校舎裏	舗装	0.068	0.065	0.062	0.081	0.059	0.058
④	校舎前	土	0.043	0.042	0.034	0.043	0.039	0.063
⑤	グラウンド	土	0.044	0.034	0.032	0.033	0.028	0.025
⑥	校舎前	土	0.045	0.051	0.036	0.057	0.033	0.062
⑦	グラウンド	土	0.046	0.046	0.034	0.050	0.040	0.025
⑧	校舎裏	舗装	0.063	0.064	0.086	0.082	0.100	0.062
⑨	校舎前	土	0.090	0.054	0.058	0.066	0.056	0.062
⑩	グラウンド	土	0.057	0.051	0.054	0.032	0.035	0.043
⑪	グラウンド	側溝	0.051	0.047	0.046	0.053	0.034	0.039
⑫	校舎前	土	0.041	0.039	0.042	0.052	0.043	0.046
⑬	グラウンド	人工芝	0.055	0.071	0.072	0.064	0.065	0.076
⑭	グラウンド	人工芝	0.046	0.080	0.066	0.066	0.080	0.075
⑮	グラウンド	土	0.044	0.040	0.044	0.039	0.051	0.051
平均			0.055	0.055	0.052	0.059	0.053	0.055

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
