


放射線量マップ【高柳西小学校】

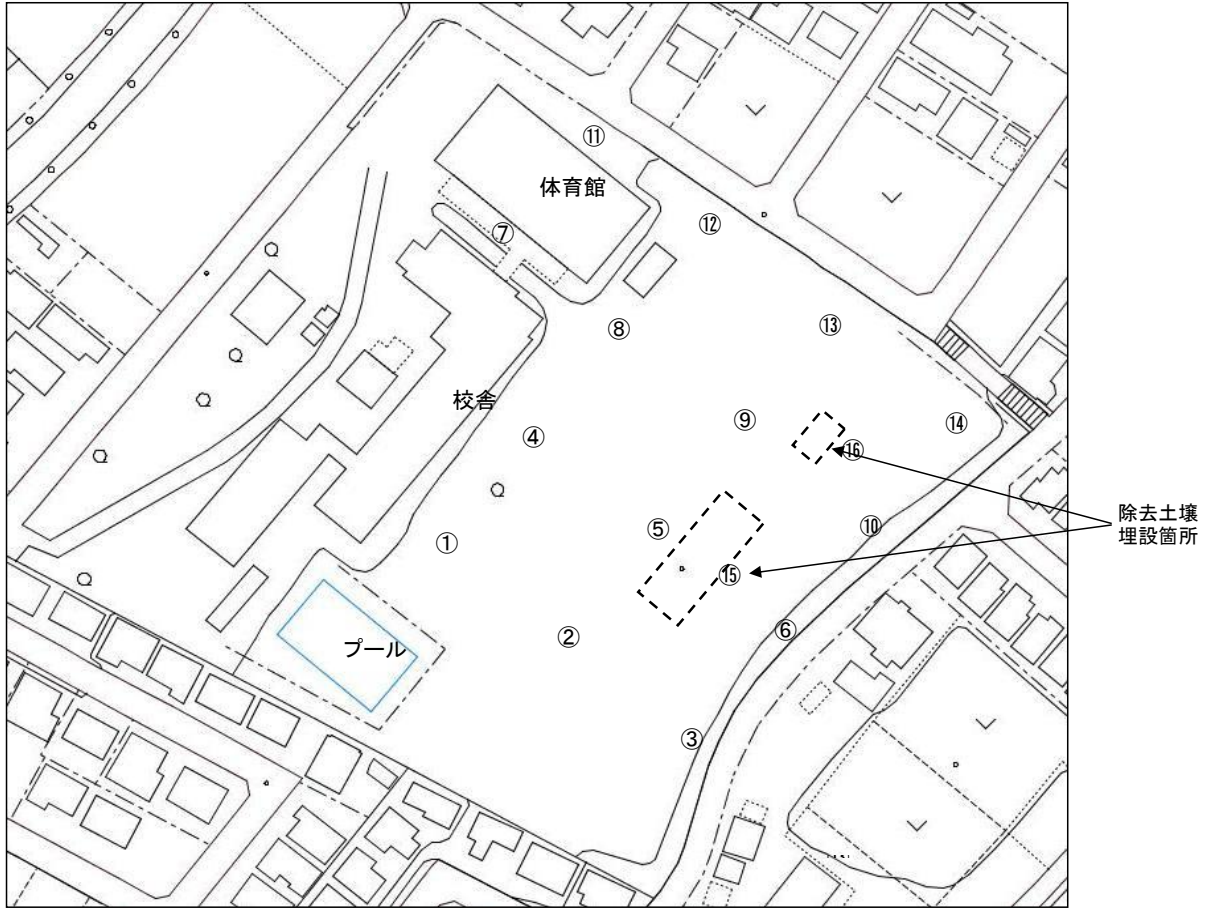

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成30年11月12日(前回:平成30年5月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.041	0.041	0.041	0.050	0.039	0.052
②	グラウンド	土	0.075	0.077	0.097	0.081	0.101	0.078
③	グラウンド	土	0.063	0.046	0.080	0.046	0.115	0.062
④	グラウンド	土	0.055	0.042	0.032	0.051	0.061	0.034
⑤	グラウンド	土	0.048	0.042	0.046	0.047	0.033	0.041
⑥	グラウンド	土	0.049	0.049	0.049	0.050	0.049	0.034
⑦	グラウンド	舗装	0.071	0.072	0.062	0.067	0.060	0.071
⑧	グラウンド	土	0.040	0.048	0.050	0.048	0.052	0.042
⑨	グラウンド	土	0.061	0.062	0.060	0.058	0.070	0.058
⑩	グラウンド	土	0.084	0.057	0.062	0.073	0.069	0.056
⑪	グラウンド	舗装	0.054	0.047	0.050	0.051	0.056	0.053
⑫	グラウンド	土	0.063	0.058	0.058	0.047	0.062	0.071
⑬	グラウンド	土	0.066	0.065	0.061	0.057	0.066	0.065
⑭	グラウンド	土	0.039	0.040	0.061	0.049	0.049	0.043
⑮	グラウンド	土	0.029	0.057	0.041	0.052	0.040	0.069
⑯	グラウンド	土	0.064	0.049	0.066	0.074	0.074	0.053
平均			0.056	0.053	0.057	0.056	0.062	0.055

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
