


放射線量マップ【市立柏高等学校】

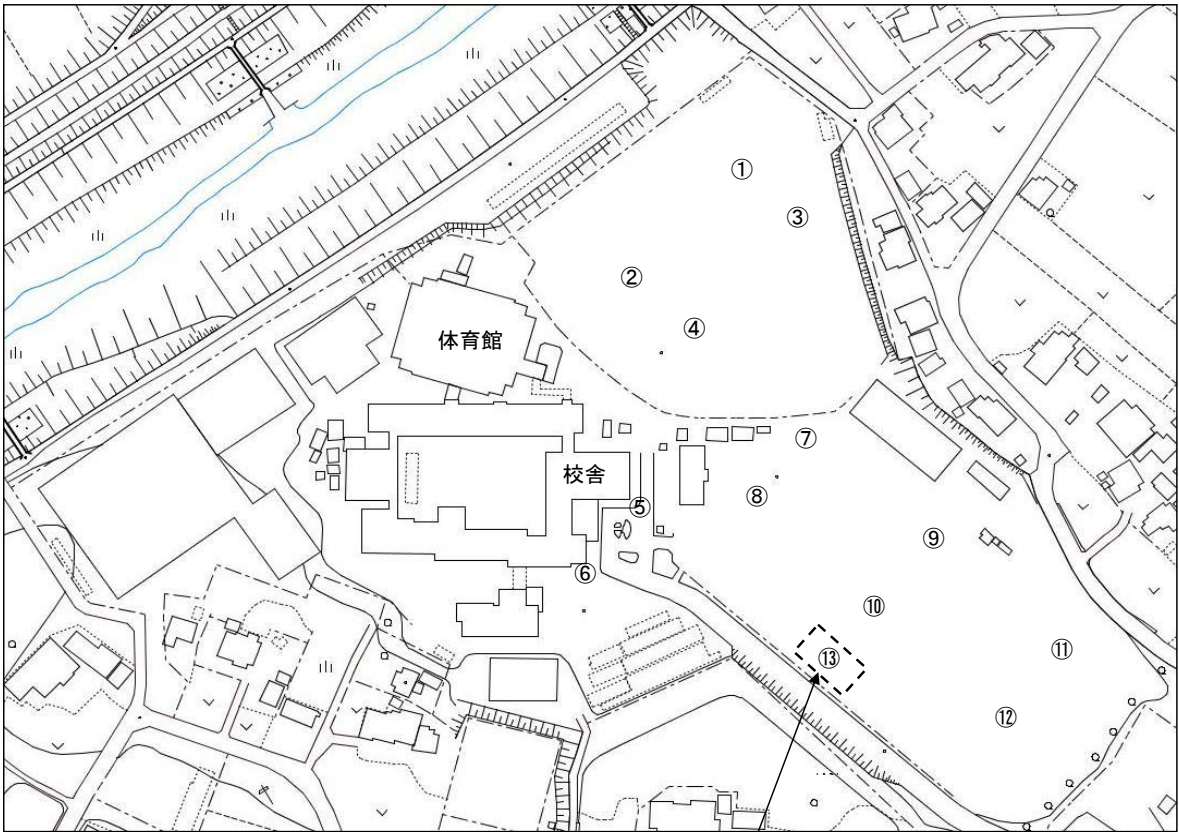

除去土壌
埋設箇所

○除染完了日:平成25年2月23日
○測定日:令和2年11月9日(前回:令和元年11月5日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	野球場	土	0.060	0.056	0.048	0.057	0.056	0.061
②	野球場	土	0.077	0.068	0.055	0.089	0.068	0.094
③	野球場	土	0.063	0.063	0.054	0.076	0.082	0.066
④	野球場	土	0.074	0.083	0.075	0.076	0.064	0.099
⑤	通路	舗装	0.072	0.048	0.094	0.054	0.101	0.059
⑥	通路	舗装	0.063	0.092	0.080	0.098	0.074	0.082
⑦	グラウンド	土	0.087	0.108	0.093	0.105	0.086	0.097
⑧	グラウンド	土	0.084	0.087	0.072	0.091	0.078	0.102
⑨	グラウンド	土	0.079	0.082	0.081	0.092	0.091	0.093
⑩	グラウンド	土	0.086	0.082	0.101	0.088	0.116	0.082
⑪	グラウンド	土	0.103	0.111	0.109	0.116	0.109	0.111
⑫	グラウンド	土	0.106	0.111	0.095	0.096	0.095	0.089
⑬	グラウンド	土	0.089	0.092	0.060	0.082	0.075	0.087
平均			0.080	0.083	0.078	0.086	0.084	0.086

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
