


放射線量マップ【風早北部小学校】

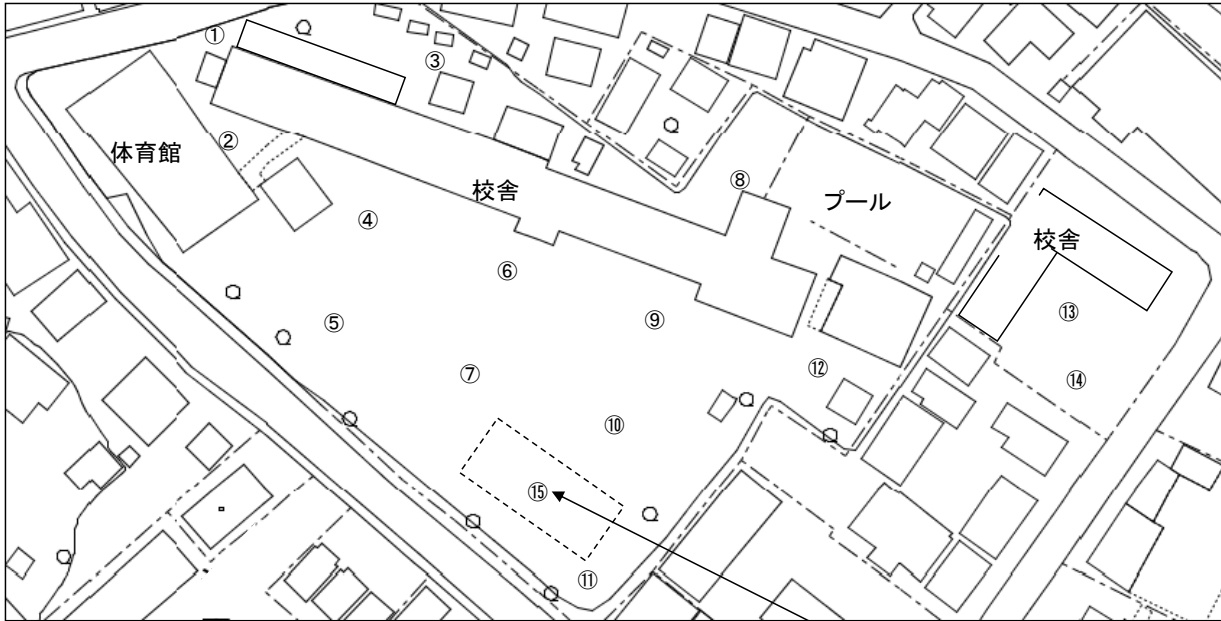

除去土壤  
埋設箇所

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:令和2年11月4日(前回:令和元年11月13日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.043	0.055	0.073	0.045	0.040	0.065
②	校舎前	土	0.069	0.056	0.080	0.040	0.080	0.048
③	校舎裏	舗装	0.074	0.055	0.088	0.053	0.085	0.061
④	校舎前	土	0.044	0.071	0.047	0.052	0.036	0.051
⑤	グラウンド	土	0.041	0.042	0.033	0.041	0.036	0.050
⑥	校舎前	土	0.035	0.064	0.032	0.057	0.053	0.057
⑦	グラウンド	土	0.027	0.045	0.039	0.041	0.025	0.031
⑧	校舎裏	舗装	0.041	0.062	0.045	0.076	0.052	0.086
⑨	校舎前	土	0.062	0.062	0.080	0.070	0.095	0.082
⑩	グラウンド	土	0.044	0.038	0.045	0.025	0.035	0.043
⑪	グラウンド	側溝	0.044	0.045	0.047	0.042	0.047	0.032
⑫	校舎前	土	0.048	0.062	0.049	0.070	0.047	0.064
⑬	グラウンド	人工芝	0.066	0.069	0.060	0.050	0.065	0.062
⑭	グラウンド	人工芝	0.057	0.071	0.063	0.073	0.076	0.079
⑮	グラウンド	土	0.043	0.058	0.033	0.033	0.052	0.053
平均			0.049	0.057	0.054	0.051	0.055	0.058

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
