


放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

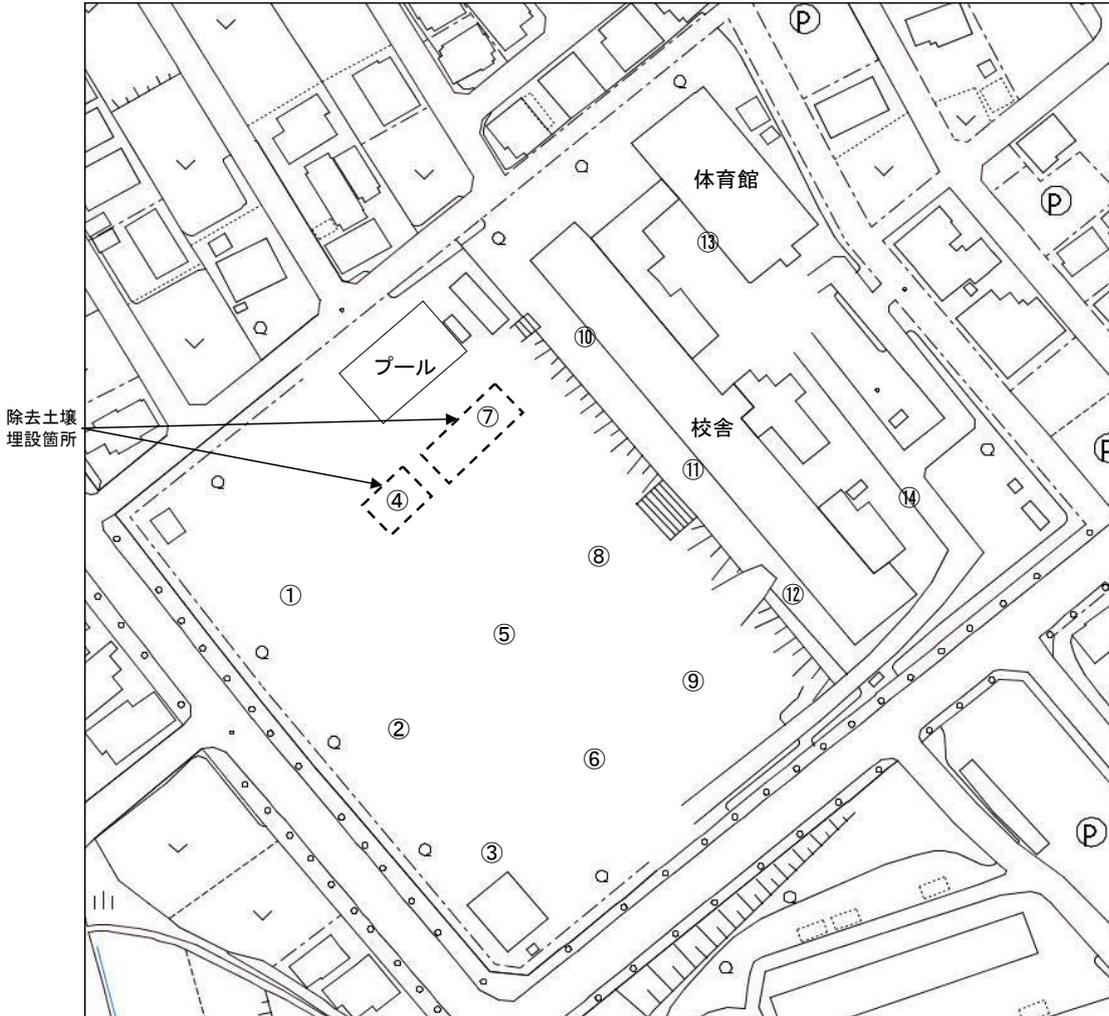

○除染完了日：平成24年4月9日

○測定日：令和2年11月6日(前回：令和元年11月25日) (単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.053	0.050	0.056	0.058	0.046	0.045
②	グラウンド	土	0.030	0.041	0.043	0.042	0.033	0.041
③	グラウンド	土	0.046	0.050	0.045	0.038	0.036	0.034
④	グラウンド	土	0.051	0.054	0.080	0.049	0.068	0.054
⑤	グラウンド	土	0.041	0.048	0.054	0.052	0.041	0.043
⑥	グラウンド	土	0.037	0.043	0.035	0.054	0.046	0.044
⑦	グラウンド	土	0.062	0.055	0.055	0.029	0.067	0.050
⑧	グラウンド	土	0.044	0.039	0.089	0.039	0.044	0.047
⑨	グラウンド	土	0.033	0.059	0.043	0.041	0.040	0.057
⑩	校舎前	土	0.064	0.049	0.065	0.061	0.062	0.052
⑪	校舎前	土	0.071	0.077	0.064	0.077	0.066	0.078
⑫	校舎前	土	0.058	0.048	0.051	0.042	0.035	0.057
⑬	通路	舗装	0.065	0.059	0.053	0.067	0.065	0.062
⑭	通路	舗装	0.062	0.073	0.078	0.071	0.078	0.077
平均			0.051	0.053	0.058	0.051	0.052	0.053

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
