


### 放射線量マップ【大津ヶ丘第二小学校】

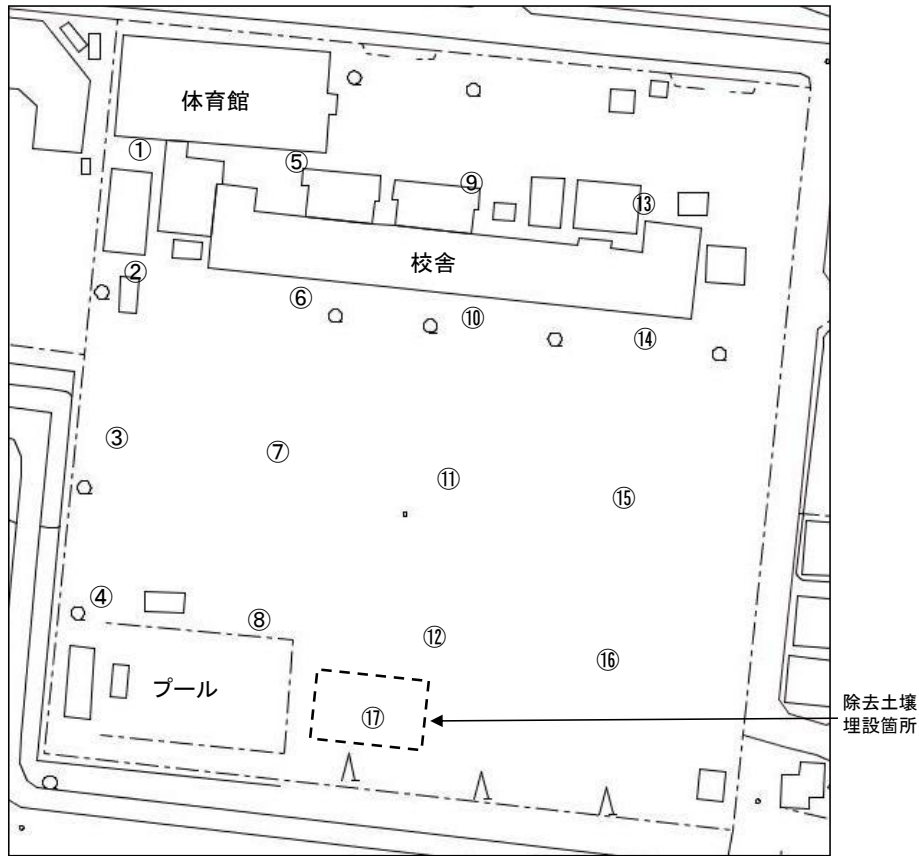

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:令和2年11月6日(前回:令和元年11月12日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.061	0.068	0.073	0.075	0.078	0.080
②	グラウンド	土	0.050	0.038	0.034	0.039	0.036	0.051
③	グラウンド	土	0.046	0.044	0.044	0.057	0.050	0.039
④	グラウンド	土	0.051	0.056	0.055	0.046	0.052	0.058
⑤	校舎裏	舗装	0.068	0.070	0.065	0.087	0.069	0.102
⑥	グラウンド	土	0.056	0.049	0.048	0.055	0.061	0.063
⑦	グラウンド	土	0.029	0.027	0.033	0.037	0.040	0.036
⑧	グラウンド	土	0.046	0.058	0.047	0.063	0.040	0.079
⑨	校舎裏	舗装	0.049	0.074	0.077	0.072	0.074	0.077
⑩	グラウンド	土	0.060	0.052	0.049	0.040	0.045	0.053
⑪	グラウンド	土	0.058	0.053	0.065	0.045	0.047	0.042
⑫	グラウンド	土	0.042	0.041	0.049	0.048	0.049	0.045
⑬	校舎裏	土	0.073	0.070	0.065	0.072	0.088	0.101
⑭	グラウンド	土	0.064	0.040	0.075	0.061	0.076	0.064
⑮	グラウンド	土	0.056	0.057	0.066	0.048	0.092	0.054
⑯	グラウンド	土	0.037	0.035	0.049	0.043	0.032	0.042
⑰	グラウンド	土	0.042	0.043	0.030	0.042	0.038	0.051
平均			0.052	0.051	0.054	0.055	0.057	0.061

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
