


放射線量マップ【高柳西小学校】

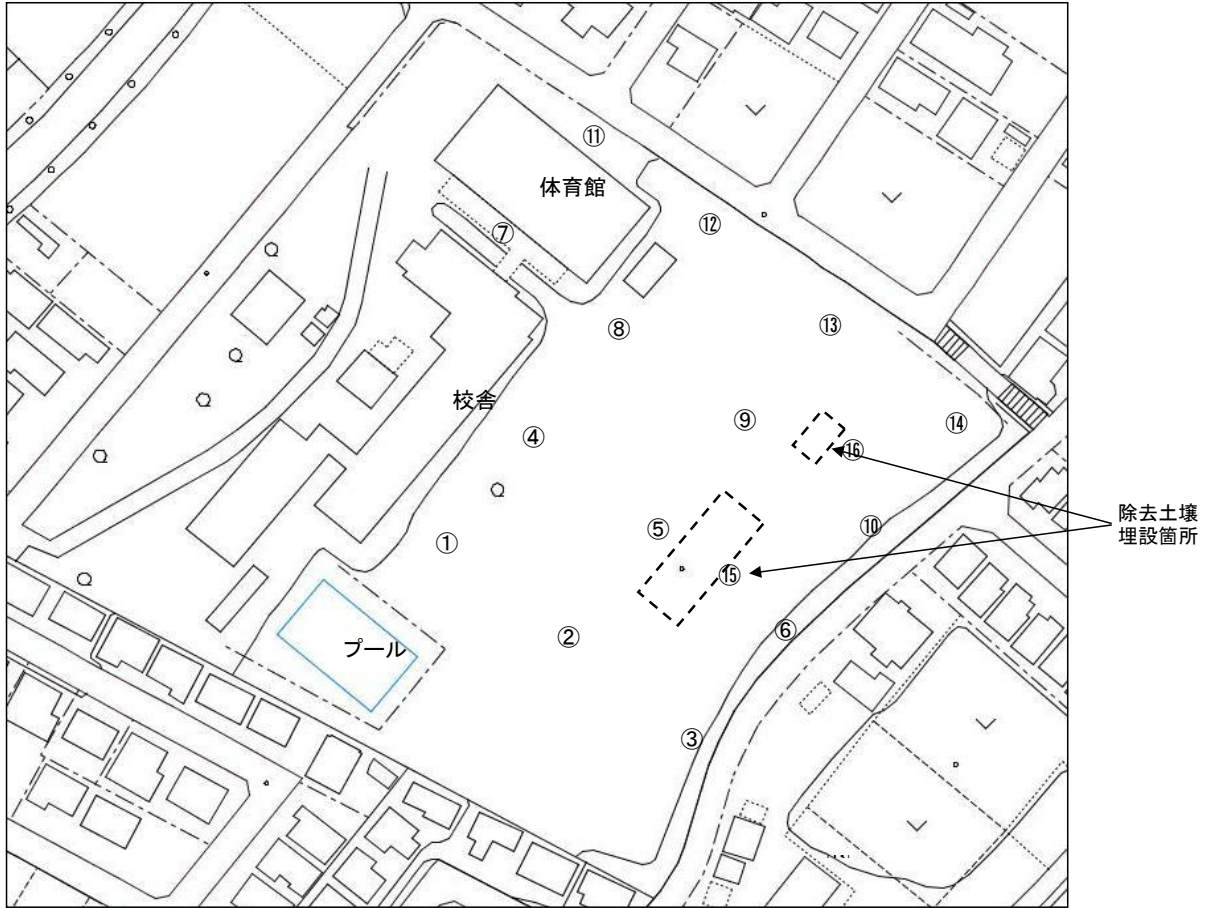

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:令和2年11月4日(前回:令和元年11月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.042	0.047	0.037	0.057	0.045	0.042
②	グラウンド	土	0.084	0.083	0.083	0.074	0.073	0.093
③	グラウンド	土	0.058	0.051	0.053	0.048	0.048	0.060
④	グラウンド	土	0.062	0.049	0.054	0.065	0.062	0.065
⑤	グラウンド	土	0.043	0.053	0.042	0.047	0.042	0.049
⑥	グラウンド	土	0.065	0.050	0.062	0.042	0.073	0.042
⑦	グラウンド	舗装	0.066	0.058	0.049	0.058	0.067	0.067
⑧	グラウンド	土	0.048	0.031	0.039	0.042	0.028	0.042
⑨	グラウンド	土	0.042	0.041	0.035	0.059	0.050	0.041
⑩	グラウンド	土	0.044	0.049	0.032	0.054	0.062	0.063
⑪	グラウンド	舗装	0.046	0.043	0.027	0.053	0.045	0.046
⑫	グラウンド	土	0.050	0.057	0.058	0.062	0.035	0.067
⑬	グラウンド	土	0.058	0.071	0.068	0.060	0.060	0.073
⑭	グラウンド	土	0.041	0.042	0.045	0.042	0.033	0.047
⑮	グラウンド	土	0.056	0.043	0.061	0.044	0.051	0.047
⑯	グラウンド	土	0.050	0.062	0.045	0.047	0.054	0.063
平均			0.053	0.052	0.049	0.053	0.052	0.057

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
