


放射線量マップ【土小学校】

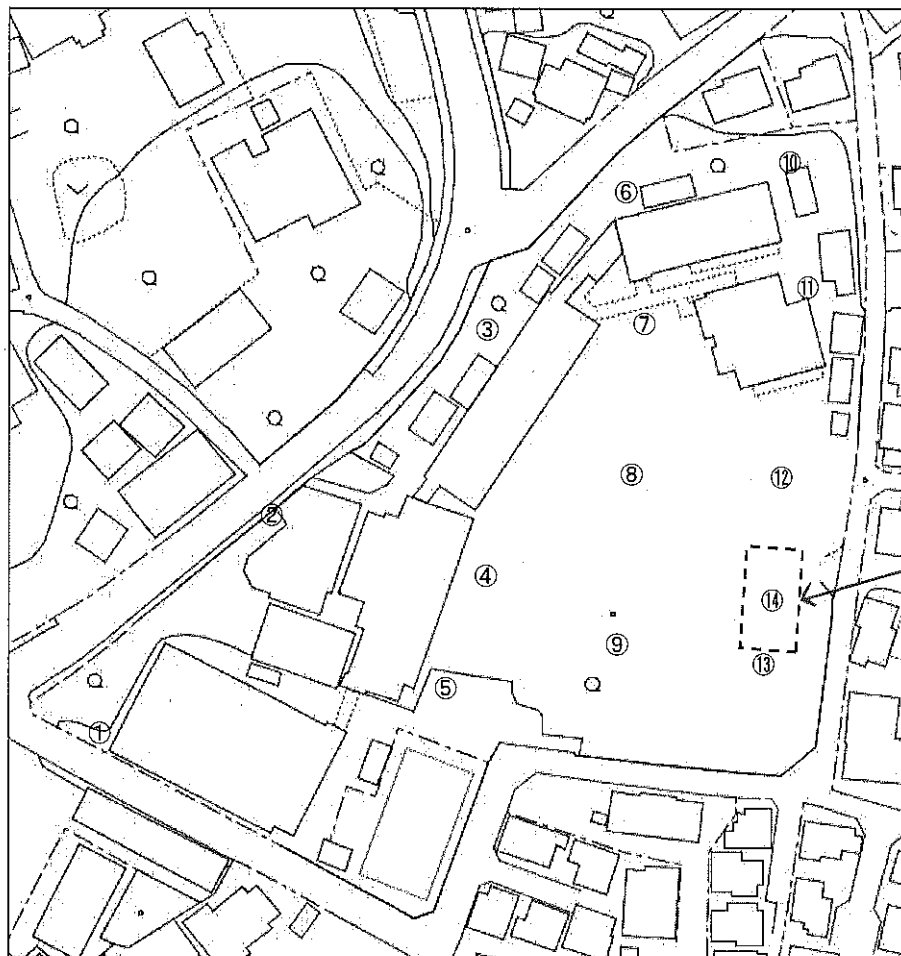

除去土壌
埋設箇所

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成27年11月5日(前回:平成27年5月15日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館横	土	0.059	0.075	0.068	0.097	0.106	0.083
②	校舎前	アスファルト	0.053	0.043	0.061	0.077	0.072	0.082
③	校舎前	土	0.059	0.085	0.083	0.128	0.061	0.143
④	グラウンド	土	0.055	0.063	0.098	0.090	0.137	0.145
⑤	グラウンド	池横の芝	0.055	0.076	0.083	0.080	0.093	0.088
⑥	校舎裏	土	0.062	0.059	0.065	0.072	0.083	0.066
⑦	校舎前	土	0.086	0.059	0.102	0.073	0.135	0.074
⑧	グラウンド	土	0.027	0.064	0.037	0.070	0.056	0.082
⑨	グラウンド	土	0.040	0.055	0.054	0.060	0.054	0.064
⑩	グラウンド	土	0.066	0.067	0.075	0.099	0.091	0.095
⑪	校舎前	土	0.069	0.115	0.102	0.127	0.088	0.136
⑫	グラウンド	アスファルト	0.056	0.047	0.066	0.070	0.056	0.061
⑬	グラウンド	土	0.041	0.045	0.063	0.054	0.059	0.062
⑭	グラウンド	土	0.040	-	0.042	-	0.040	-
平均			0.055	0.066	0.071	0.084	0.081	0.091

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
