


放射線量マップ【旭小学校】

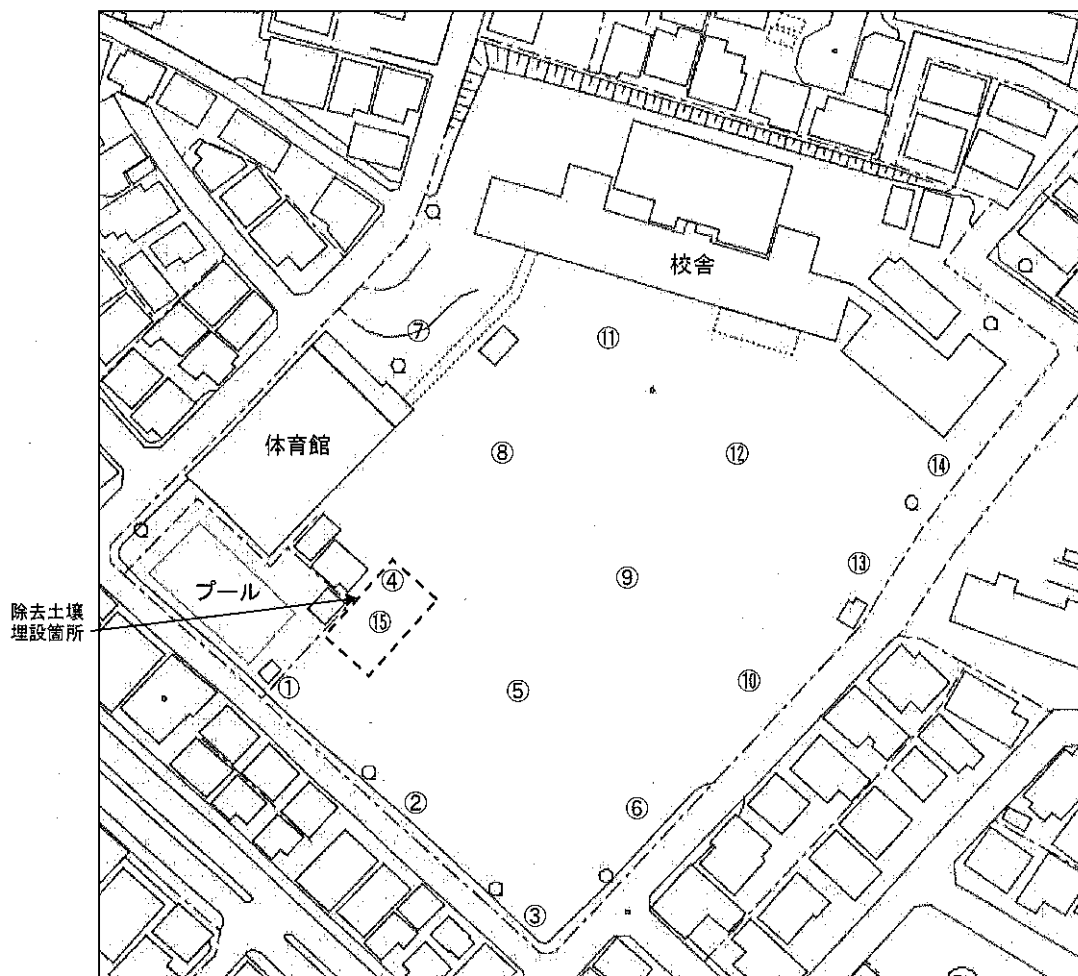

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成27年11月11日(前回:平成27年5月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール横	樋	0.095	0.098	0.079	0.136	0.087	0.155
②	グラウンド	土	0.070	0.068	0.070	0.077	0.049	0.091
③	グラウンド	土	0.072	0.060	0.060	0.067	0.070	0.077
④	グラウンド	土	0.030	0.037	0.036	0.046	0.035	0.042
⑤	グラウンド	土	0.038	0.024	0.041	0.023	0.023	0.040
⑥	グラウンド	土	0.052	0.040	0.049	0.052	0.033	0.048
⑦	グラウンド	アスファルト	0.063	0.043	0.043	0.045	0.062	0.055
⑧	グラウンド	土	0.031	0.041	0.032	0.046	0.019	0.036
⑨	グラウンド	土	0.024	0.036	0.026	0.032	0.025	0.027
⑩	グラウンド	土	0.029	0.065	0.031	0.040	0.030	0.054
⑪	グラウンド	土	0.036	0.036	0.033	0.047	0.027	0.045
⑫	グラウンド	土	0.035	0.026	0.039	0.029	0.021	0.045
⑬	グラウンド	土	0.046	0.042	0.031	0.048	0.037	0.046
⑭	校舎横	側溝	0.048	0.061	0.042	0.052	0.041	0.068
⑮	グラウンド	土	0.037	-	0.032	-	0.037	-
平均			0.047	0.048	0.043	0.053	0.040	0.059

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
