


放射線量マップ【中原小学校】

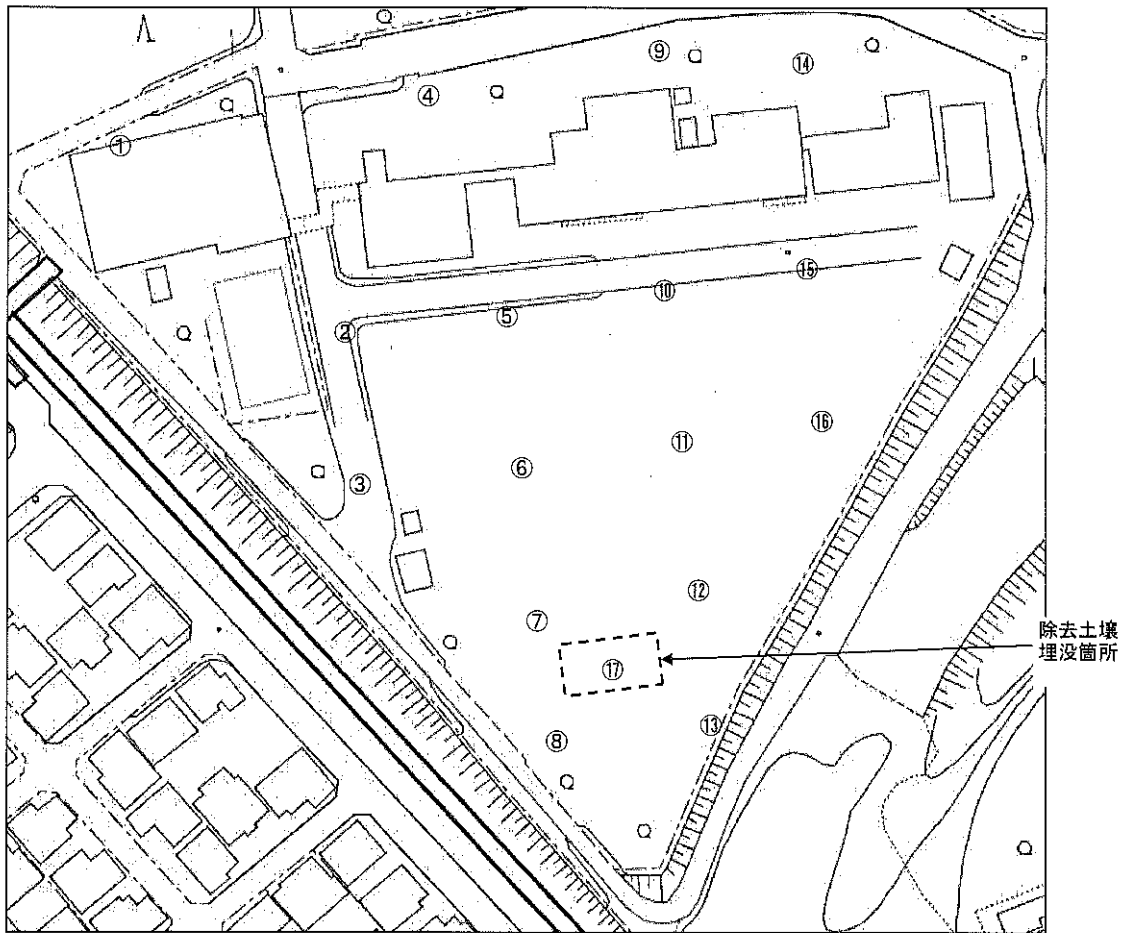

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成27年11月11日(前回:平成27年5月8日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館裏	土	0.058	0.074	0.075	0.084	0.104	0.121
②	グラウンド	土	0.042	0.098	0.067	0.117	0.056	0.088
③	グラウンド	土	0.058	0.041	0.068	0.059	0.050	0.038
④	校舎裏	土	0.055	0.081	0.070	0.079	0.053	0.068
⑤	校舎前	土	0.037	0.070	0.051	0.099	0.045	0.068
⑥	グラウンド	土	0.023	0.027	0.031	0.044	0.032	0.028
⑦	グラウンド	土	0.028	0.046	0.035	0.046	0.041	0.036
⑧	グラウンド	土	0.042	0.051	0.038	0.063	0.052	0.035
⑨	校舎裏	土	0.062	0.066	0.084	0.089	0.111	0.056
⑩	校舎前	土	0.051	0.060	0.072	0.045	0.083	0.046
⑪	グラウンド	土	0.029	0.038	0.027	0.033	0.023	0.037
⑫	グラウンド	土	0.020	0.039	0.043	0.047	0.035	0.034
⑬	グラウンド	土	0.041	0.051	0.055	0.034	0.046	0.041
⑭	校舎裏	土	0.053	0.050	0.063	0.083	0.076	0.054
⑮	校舎前	土	0.047	0.047	0.042	0.054	0.058	0.042
⑯	グラウンド	土	0.025	0.035	0.044	0.041	0.025	0.028
⑰	グラウンド	土	0.038	-	0.035	-	0.043	-
平均			0.042	0.055	0.053	0.064	0.055	0.051

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
