


放射線量マップ【高田小学校】

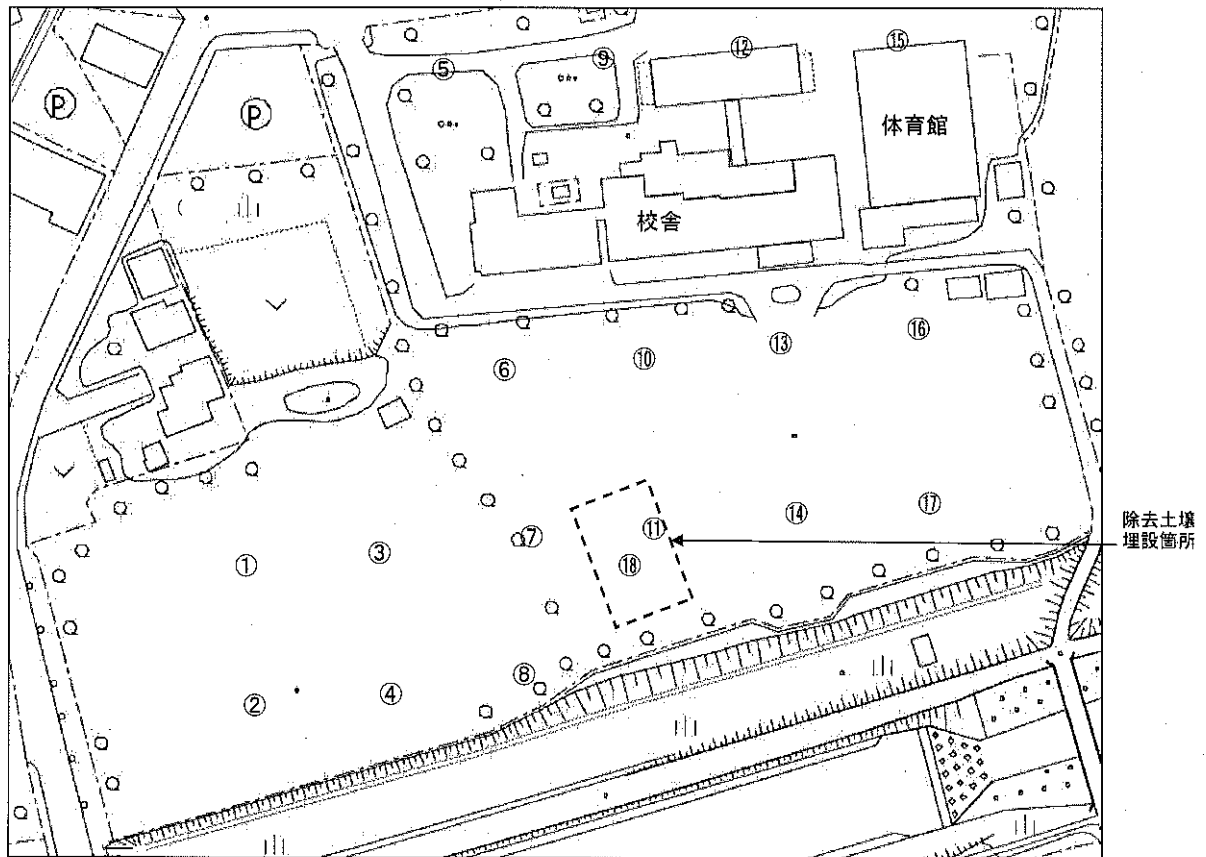

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成27年11月6日(前回:平成27年5月14日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.069	0.060	0.067	0.065	0.062	0.077
②	グラウンド	土	0.078	0.053	0.072	0.065	0.075	0.063
③	グラウンド	土	0.051	0.059	0.046	0.049	0.050	0.052
④	グラウンド	土	0.051	0.052	0.047	0.063	0.046	0.050
⑤	花壇付近	土	0.062	0.047	0.076	0.059	0.046	0.073
⑥	グラウンド	土	0.040	0.044	0.056	0.037	0.040	0.040
⑦	グラウンド	土	0.066	0.036	0.044	0.048	0.089	0.045
⑧	グラウンド	土	0.054	0.050	0.046	0.062	0.045	0.059
⑨	花壇脇	土	0.070	0.057	0.044	0.068	0.049	0.051
⑩	グラウンド	土	0.041	0.045	0.033	0.054	0.035	0.073
⑪	グラウンド	土	0.039	0.037	0.038	0.038	0.034	0.038
⑫	校舎裏	土	0.043	0.073	0.059	0.073	0.046	0.075
⑬	グラウンド	土	0.043	0.038	0.034	0.045	0.033	0.028
⑭	グラウンド	土	0.034	0.033	0.038	0.035	0.027	0.035
⑮	体育館裏	土	0.061	0.058	0.062	0.069	0.049	0.083
⑯	グラウンド	土	0.050	0.045	0.048	0.052	0.046	0.052
⑰	グラウンド	土	0.050	0.047	0.042	0.035	0.042	0.041
⑱	グラウンド	土	0.036	-	0.038	-	0.036	-
平均			0.052	0.049	0.049	0.054	0.047	0.055

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
