


放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

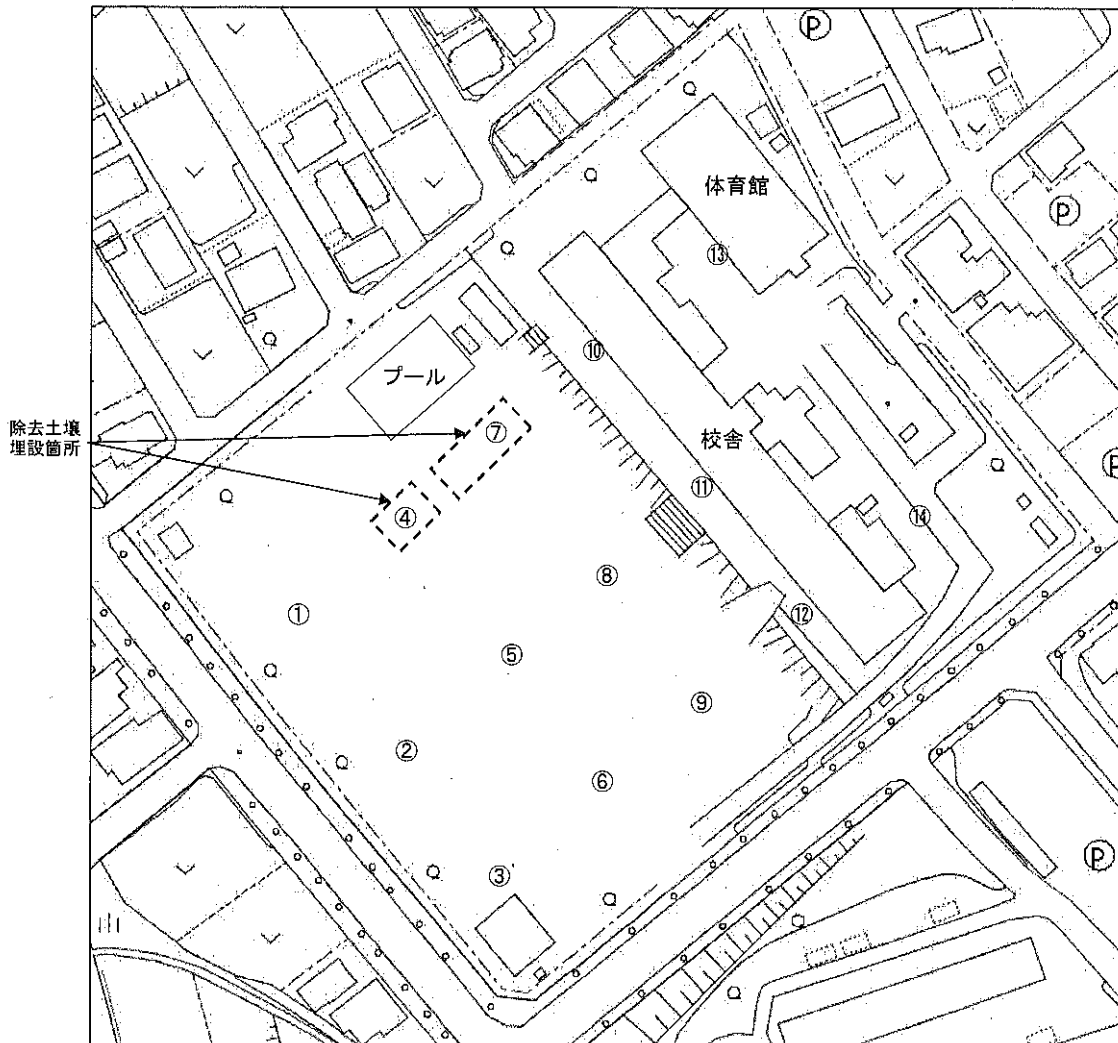

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成27年11月5日(前回:平成27年5月8日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.037	0.053	0.046	0.069	0.041	0.052
②	グラウンド	土	0.022	0.041	0.047	0.060	0.043	0.031
③	グラウンド	土	0.039	0.061	0.049	0.062	0.059	0.045
④	グラウンド	土	0.033	0.046	0.053	0.049	0.042	0.029
⑤	グラウンド	土	0.028	0.048	0.030	0.050	0.064	0.043
⑥	グラウンド	土	0.028	0.040	0.026	0.057	0.030	0.045
⑦	グラウンド	土	0.038	0.052	0.054	0.057	0.054	0.032
⑧	グラウンド	土	0.037	0.039	0.040	0.052	0.048	0.045
⑨	グラウンド	土	0.036	0.049	0.047	0.057	0.050	0.041
⑩	校舎前	土	0.052	0.066	0.064	0.085	0.053	0.059
⑪	校舎前	土	0.066	0.086	0.093	0.089	0.083	0.087
⑫	校舎前	土	0.054	0.074	0.061	0.062	0.063	0.051
⑬	通路	舗装	0.049	0.082	0.072	0.075	0.070	0.067
⑭	通路	舗装	0.076	0.104	0.102	0.114	0.112	0.109
平均			0.043	0.060	0.056	0.067	0.058	0.053

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
