


放射線量マップ【柏第五中学校】

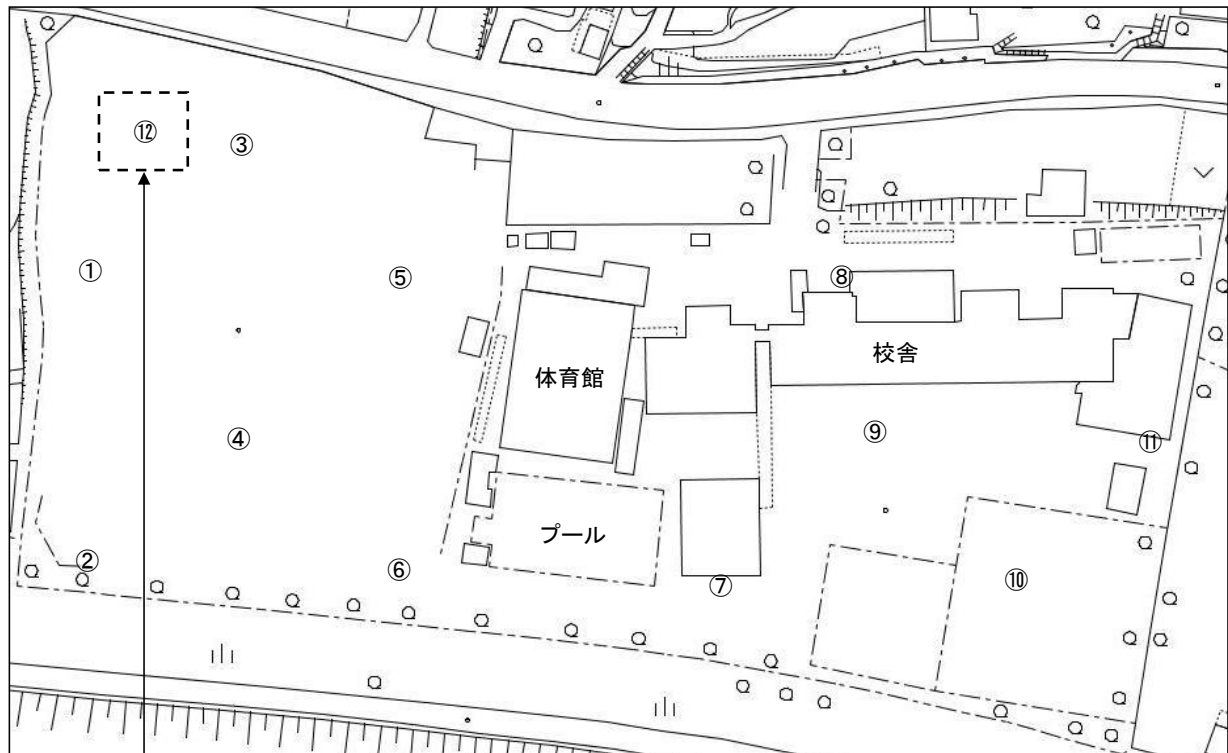

除去土壌
埋設箇所

○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:平成28年5月26日(前回:平成27年11月6日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.101	0.097	0.096	0.088	0.081	0.089
②	グラウンド	土	0.089	0.097	0.103	0.093	0.093	0.082
③	グラウンド	土	0.096	0.072	0.092	0.080	0.094	0.063
④	グラウンド	土	0.089	0.085	0.086	0.084	0.089	0.080
⑤	グラウンド	土	0.103	0.088	0.069	0.092	0.077	0.105
⑥	グラウンド	土	0.106	0.087	0.100	0.069	0.082	0.054
⑦	武道場前	土	0.126	0.125	0.114	0.130	0.129	0.121
⑧	校舎前	土	0.079	0.076	0.071	0.073	0.078	0.088
⑨	グラウンド	土	0.073	0.078	0.088	0.080	0.074	0.070
⑩	テニスコート	土	0.051	0.062	0.068	0.048	0.051	0.042
⑪	給食室裏	土	0.077	0.088	0.076	0.086	0.070	0.065
⑫	グラウンド	土	0.090	0.093	0.083	0.077	0.084	0.160
平均			0.090	0.087	0.087	0.083	0.084	0.085

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
