


放射線量マップ【柏第七小学校】

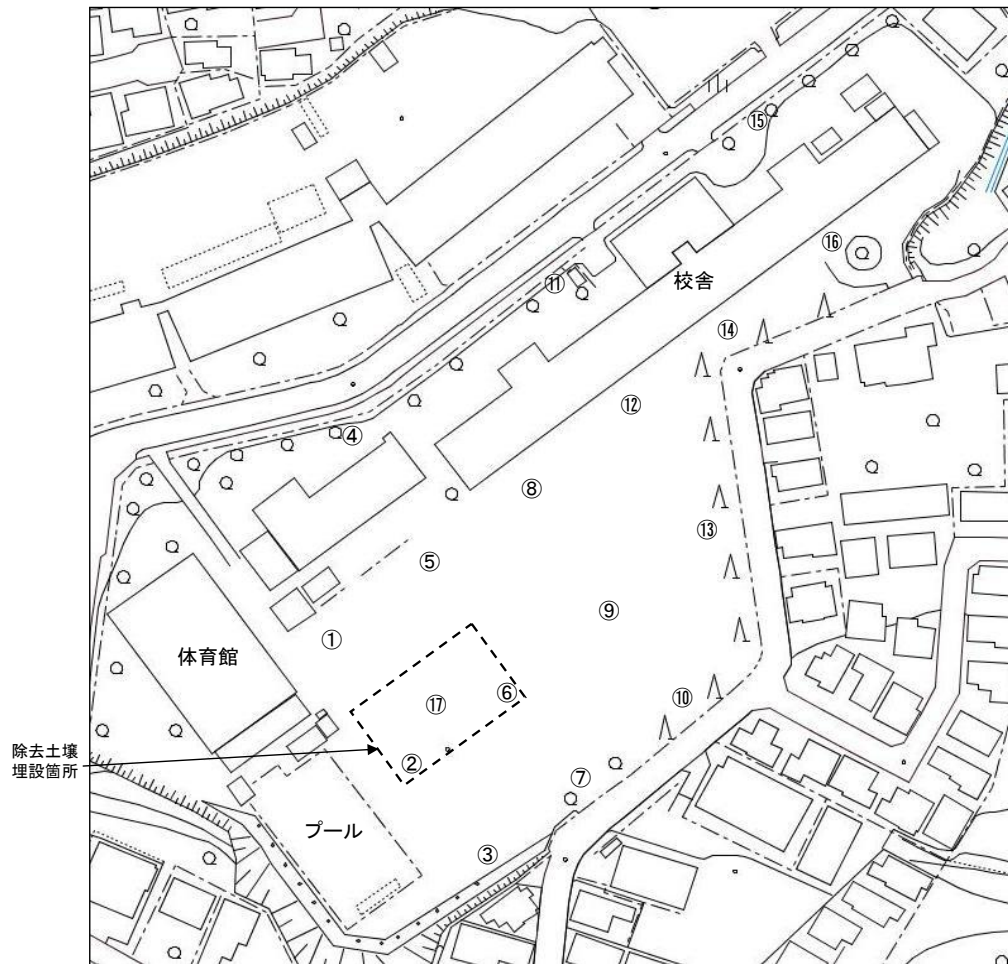

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成28年5月26日(前回:平成27年11月6日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.060	0.045	0.065	0.050	0.057	0.049
②	グラウンド	土	0.044	0.045	0.050	0.048	0.057	0.058
③	グラウンド	土	0.035	0.057	0.054	0.051	0.066	0.046
④	校舎裏	土	0.080	0.082	0.084	0.073	0.082	0.063
⑤	グラウンド	土	0.060	0.065	0.068	0.058	0.082	0.044
⑥	グラウンド	土	0.067	0.061	0.088	0.063	0.089	0.059
⑦	グラウンド	側溝	0.067	0.042	0.071	0.046	0.069	0.041
⑧	校舎前	土	0.061	0.051	0.046	0.057	0.049	0.041
⑨	グラウンド	土	0.065	0.057	0.055	0.054	0.055	0.059
⑩	グラウンド	土	0.058	0.048	0.055	0.063	0.045	0.046
⑪	校舎裏	土	0.063	0.076	0.074	0.086	0.080	0.084
⑫	校舎前	土	0.067	0.053	0.080	0.040	0.073	0.060
⑬	グラウンド	土	0.067	0.036	0.054	0.060	0.060	0.050
⑭	校舎前	アスファルト	0.087	0.078	0.106	0.088	0.102	0.072
⑮	校舎裏	土	0.087	0.076	0.110	0.069	0.089	0.070
⑯	校舎前	アスファルト	0.087	0.068	0.081	0.069	0.075	0.064
⑰	グラウンド	土	0.044	0.042	0.047	0.046	0.049	0.042
平均			0.065	0.058	0.070	0.060	0.069	0.056

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
