


放射線量マップ【逆井小学校】

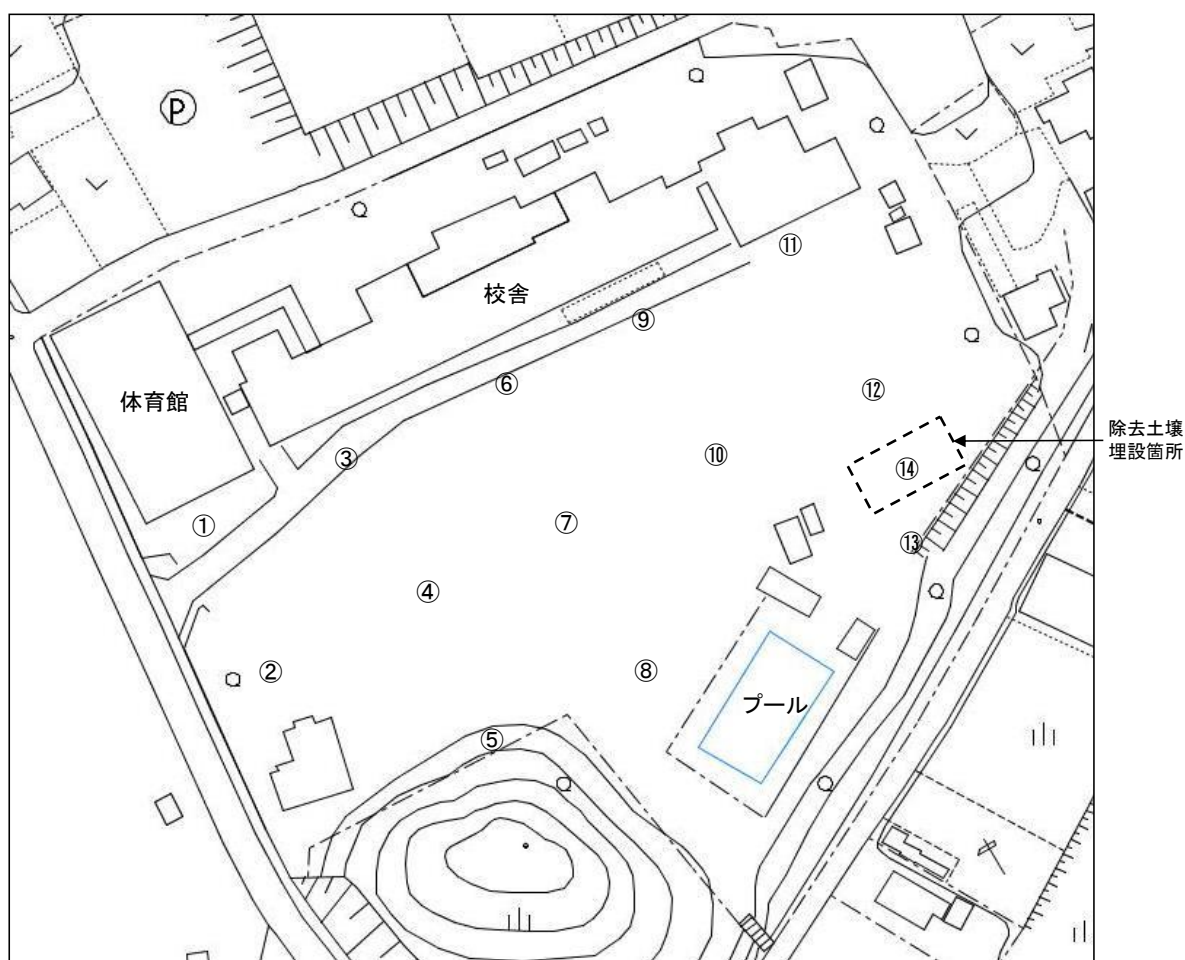

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成28年5月12日(前回:平成27年11月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.053	0.059	0.072	0.084	0.084	0.124
②	グラウンド	土	0.050	0.058	0.054	0.066	0.038	0.073
③	グラウンド	舗装	0.049	0.035	0.058	0.053	0.048	0.061
④	グラウンド	土	0.046	0.017	0.041	0.025	0.039	0.033
⑤	グラウンド	土	0.061	0.056	0.081	0.085	0.088	0.105
⑥	グラウンド	舗装	0.054	0.037	0.050	0.050	0.046	0.061
⑦	グラウンド	土	0.039	0.035	0.046	0.040	0.044	0.045
⑧	グラウンド	土	0.072	0.057	0.081	0.055	0.102	0.070
⑨	グラウンド	舗装	0.039	0.049	0.051	0.034	0.064	0.047
⑩	グラウンド	土	0.061	0.029	0.055	0.049	0.060	0.047
⑪	グラウンド	舗装	0.061	0.034	0.056	0.056	0.064	0.060
⑫	グラウンド	土	0.041	0.039	0.059	0.056	0.068	0.063
⑬	グラウンド	土	0.090	0.056	0.086	0.082	0.084	0.090
⑭	グラウンド	土	0.050	0.041	0.062	0.038	0.042	0.033
平均			0.055	0.043	0.061	0.055	0.062	0.065

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
