


放射線量マップ【花野井小学校】

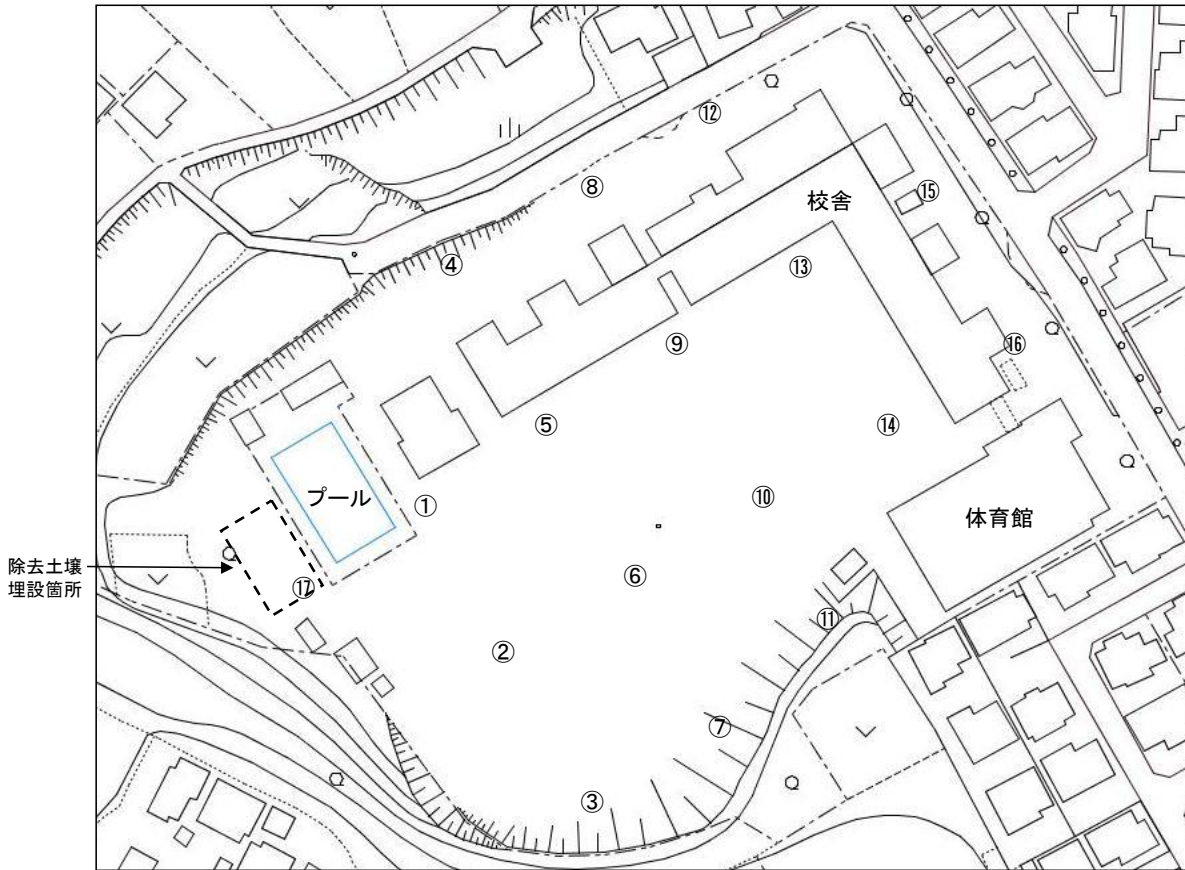

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成28年5月23日(前回:平成27年11月6日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール前	土	0.087	0.077	0.079	0.078	0.092	0.089
②	グラウンド	土	0.051	0.073	0.059	0.080	0.073	0.062
③	グラウンド	土	0.073	0.061	0.072	0.051	0.062	0.063
④	校舎裏	土	0.068	0.070	0.059	0.067	0.071	0.063
⑤	校舎前	土	0.073	0.065	0.059	0.066	0.055	0.056
⑥	グラウンド	土	0.062	0.049	0.089	0.052	0.063	0.056
⑦	グラウンド	土	0.097	0.064	0.082	0.063	0.078	0.057
⑧	校舎裏	アスファルト	0.061	0.042	0.066	0.065	0.066	0.055
⑨	校舎前	土	0.062	0.063	0.057	0.064	0.055	0.049
⑩	グラウンド	土	0.058	0.040	0.055	0.046	0.055	0.054
⑪	グラウンド	土	0.057	0.060	0.066	0.062	0.056	0.067
⑫	校舎裏	アスファルト	0.089	0.092	0.059	0.098	0.051	0.074
⑬	校舎前	土	0.094	0.102	0.087	0.122	0.061	0.137
⑭	グラウンド	土	0.062	0.044	0.057	0.054	0.064	0.047
⑮	校舎裏	アスファルト	0.080	0.066	0.033	0.071	0.065	0.048
⑯	校舎裏	アスファルト	0.077	0.069	0.095	0.088	0.092	0.080
⑰	プール裏	土	0.088	0.084	0.110	0.082	0.087	0.084
平均			0.073	0.066	0.070	0.071	0.067	0.067

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
