


放射線量マップ【富勢西小学校】

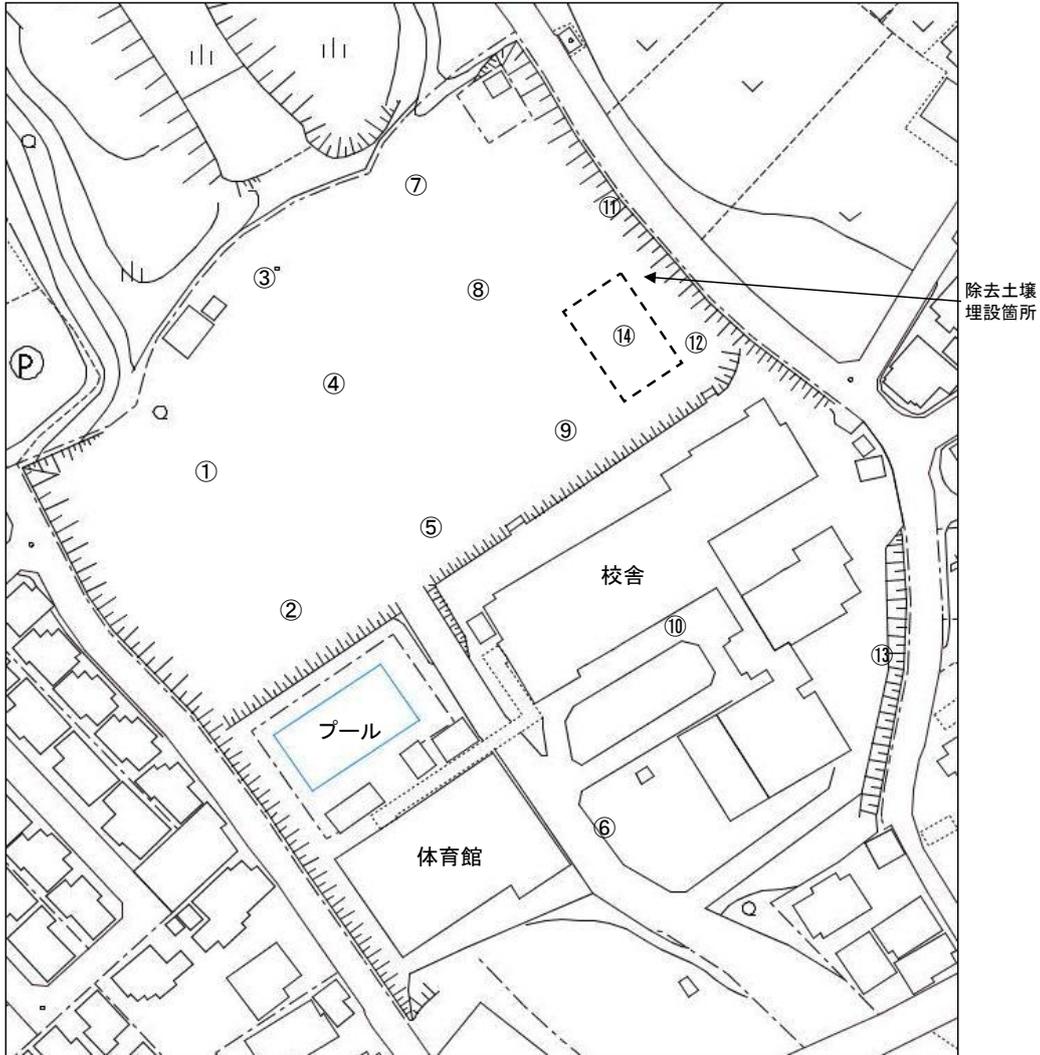

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成28年5月18日(前回:平成27年11月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.083	0.078	0.076	0.069	0.068	0.062
②	グラウンド	土	0.084	0.067	0.083	0.050	0.079	0.049
③	グラウンド	土	0.105	0.072	0.105	0.076	0.106	0.076
④	グラウンド	土	0.082	0.058	0.071	0.081	0.076	0.049
⑤	グラウンド	土	0.086	0.084	0.073	0.072	0.061	0.067
⑥	通路端	土	0.097	0.091	0.103	0.109	0.123	0.105
⑦	グラウンド	土	0.098	0.063	0.080	0.060	0.089	0.050
⑧	グラウンド	土	0.077	0.066	0.073	0.052	0.083	0.059
⑨	グラウンド	土	0.069	0.056	0.069	0.063	0.087	0.066
⑩	校舎前	土	0.078	0.065	0.084	0.080	0.090	0.062
⑪	グラウンド	土	0.117	0.096	0.129	0.103	0.129	0.090
⑫	校舎前	土	0.115	0.080	0.091	0.077	0.098	0.073
⑬	校舎横	土	0.110	0.084	0.103	0.074	0.046	0.051
⑭	グラウンド	土	0.060	0.057	0.064	0.063	0.086	0.064
平均			0.090	0.073	0.086	0.074	0.087	0.066

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
