


放射線量マップ【風早北部小学校】

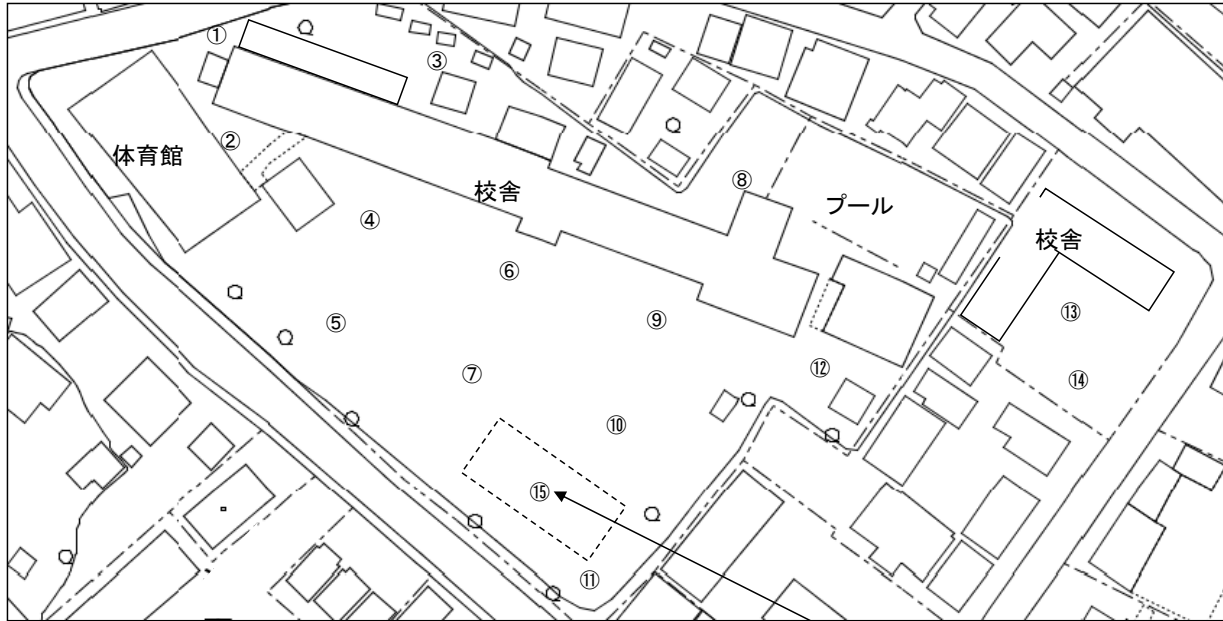

除去土壤
埋設箇所

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成28年5月23日(前回:平成27年11月5日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.056	0.040	0.051	0.062	0.069	0.046
②	校舎前	土	0.068	0.063	0.088	0.080	0.065	0.078
③	校舎裏	舗装	0.072	0.043	0.064	0.051	0.072	0.053
④	校舎前	土	0.046	0.043	0.056	0.062	0.040	0.079
⑤	グラウンド	土	0.038	0.032	0.041	0.051	0.041	0.041
⑥	校舎前	土	0.058	0.034	0.056	0.065	0.047	0.051
⑦	グラウンド	土	0.041	0.042	0.048	0.042	0.037	0.058
⑧	校舎裏	舗装	0.104	0.071	0.094	0.112	0.082	0.148
⑨	校舎前	土	0.053	0.047	0.076	0.050	0.061	0.063
⑩	グラウンド	土	0.055	0.042	0.048	0.068	0.052	0.059
⑪	グラウンド	側溝	0.060	0.041	0.060	0.059	0.041	0.040
⑫	校舎前	土	0.045	0.037	0.064	0.064	0.052	0.059
⑬	グラウンド	人工芝	0.069	0.049	0.075	0.060	0.082	0.057
⑭	グラウンド	人工芝	0.082	0.049	0.075	0.077	0.061	0.058
⑮	グラウンド	土	0.050	0.027	0.036	0.032	0.049	0.027
平均			0.060	0.044	0.062	0.062	0.057	0.061

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
