


放射線量マップ【柏第六小学校】

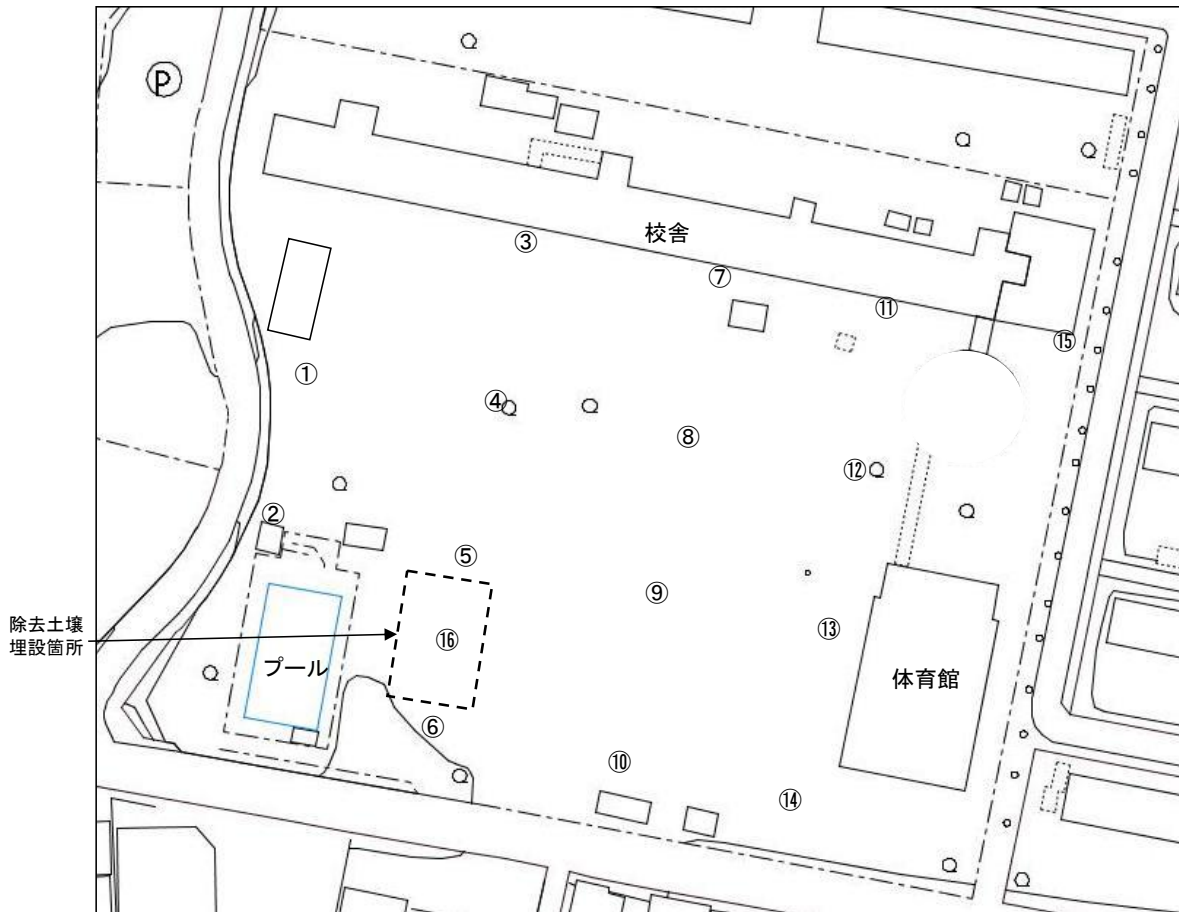

○除染完了日：平成24年5月9日

○測定日：平成28年11月16日（前回：平成28年5月26日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	こどもルーム前	土	0.072	0.065	0.056	0.069	0.065	0.069
②	プール横	土	0.083	0.083	0.078	0.065	0.088	0.066
③	校舎前	土	0.071	0.059	0.061	0.066	0.055	0.070
④	グラウンド	土	0.079	0.091	0.063	0.074	0.053	0.105
⑤	グラウンド	土	0.042	0.032	0.037	0.047	0.034	0.045
⑥	グラウンド	土	0.048	0.043	0.074	0.048	0.042	0.036
⑦	校舎前	土	0.067	0.061	0.061	0.058	0.049	0.072
⑧	グラウンド	土	0.062	0.068	0.060	0.062	0.050	0.060
⑨	グラウンド	土	0.048	0.044	0.024	0.058	0.036	0.034
⑩	グラウンド	土	0.036	0.052	0.050	0.069	0.056	0.041
⑪	校舎前	アスファルト	0.079	0.080	0.073	0.069	0.066	0.056
⑫	グラウンド	土	0.073	0.056	0.069	0.048	0.076	0.052
⑬	グラウンド	土	0.052	0.062	0.049	0.047	0.033	0.050
⑭	グラウンド	土	0.062	0.064	0.085	0.059	0.075	0.061
⑮	校舎前	アスファルト	0.084	0.093	0.085	0.097	0.083	0.093
⑯	グラウンド	土	0.031	0.054	0.025	0.039	0.028	0.056
平均			0.062	0.063	0.059	0.061	0.056	0.060

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
